

Acuse

SEP 11:21  
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
SUPERIOR 0512  
06 JUL. 2022  
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN  
SUPERIOR UNIVERSITARIA  
E INTERCULTURAL

Cuernavaca, Morelos, 1° de julio de 2022.

CGPyA/359/2022

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL

RECIBIDO  
Sin uso  
06 JUL. 2022  
Acción informe

DR. EDUARDO GERARDO ROSAS GONZÁLEZ  
DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL  
PRESENTE

Recibi USB.  
Arg Carlos Sánchez

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO  
INSTITUCIONAL

En el marco del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) y en respuesta a su atento oficio No. 511/2022-2182, por este medio hago llegar a Usted de manera impresa y electrónica (USB) en formato Excel y PDF debidamente firmados los informes de avance de obra e informes descriptivos correspondientes al **segundo trimestre** (abril, mayo y junio) **2022**, de las obras apoyadas con los recursos del fondo en comento, informando lo siguiente:

1.- En relación a las obras apoyadas con recursos FAM año 2015, la Institución realizó una mesa de trabajo con el objetivo de definir los mecanismos adecuados, para dar cumplimiento a los requerimientos solicitados respecto al cierre de las obras: *“Construcción de la sala de cómputo, auditorio, oficinas administrativas y cubículos de investigadores para el edificio complementario de la Facultad de Humanidades; “Ampliación de laboratorios, cubículos de investigación y oficinas académicas para el Centro de Investigación en Biotecnología. Primera etapa”*. Se anexa minuta de trabajo debidamente firmada, en alcance a dicha minuta, se precisa que, el cierre de las obras en donde se establezcan los porcentajes físicos determinados por la institución y los montos ejercidos, será enviado en el tercer trimestre.

2.- FAM año 2016, numerales 2 y 3, la Institución realizó una mesa de trabajo con el objetivo de definir los mecanismos adecuados, para dar cumplimiento a los requerimientos solicitados respecto al cierre de la obra: *“Construcción de la Tercera Etapa de la Facultad de Estudios Superiores de Cuautla”*. Se anexa minuta de trabajo debidamente firmada, en alcance a dicha minuta, se precisa que, el cierre de la obra en donde se establezcan los porcentajes físicos determinados por la institución y los montos ejercidos, será enviado en el tercer trimestre.

4.- En relación a las obras apoyadas con recursos FAM año 2020, el monto ejercido fue de \$25,780.508.72 (veinticinco millones setecientos ochenta mil quinientos ocho pesos 72/100 M.N.) con un remanente de \$3,660.28 (tres mil seiscientos sesenta pesos 28/100 M.N), cantidad que fue reintegrada a la TESOFE mediante línea de captura 0022AAXN671060963221 con fecha 11 de mayo del 2022. Así como los rendimientos financieros generados en la cuenta, del periodo del 1° de noviembre 2021 al 30 de abril de 2022 por un monto de \$27,398.00 (veintisiete mil trescientos noventa y ocho pesos), mediante línea de captura N° 0022AAYD221061021212.

En este sentido, y una vez que se cumplieron al 100% el objetivo y las acciones planteadas en el proyecto, el 19 de mayo del presente año se realizó la cancelación de la cuenta bancaria específica y productiva 1105602869 destinada para los recursos del fondo.

5.- Mediante oficio CGPyA/144/2022 de fecha 7 de abril de 2022, signado por el Dr. Álvaro Zamudio Lara Coordinador General de Planeación y Administración, se enviaron las Actas Administrativas de Entrega-Recepción de las obras N° 2 *“Equipamiento del Campus norte”* y N° 3. *“Equipamiento del Campus Oriente”*. (se adjunta).



Para las obras N°. 1 "Construcción de la Segunda Etapa para los Talleres de la Facultad de Artes", N°. 4, "Adecuación y Mejoras del Campus Norte", N°. 5 "Adecuación y Mejoras del Campus Oriente" y N°. 6. Mantenimiento del Campus Sur y Campus Poniente", se adjuntan de manera impresa y electrónica en formato PDF, las Actas Administrativas de Entrega-Recepción y Actas Finiquito de las obras anteriormente descritas. Lo anterior para su revisión y en su caso conclusión.

6.- Conforme a lo descrito en el numeral 4 del presente documento, se adjunta comprobante de devolución a la TESOFE por un monto de \$3,660.28 (tres mil seiscientos sesenta pesos 28/100 M.N).

7.- En relación a la obra "Construcción de la Segunda Etapa para los Talleres de la Facultad de Artes". Existe un Convenio Modificatorio en el plazo de ejecución con fecha del 24 de noviembre de 2021 al 18 de enero de 2022 (se adjunta). Es importante mencionar que existieron demoras en la construcción de la citada obra, situación por la cual se generó el presente convenio modificatorio, siendo sus principales:

1.- La Institución participo y continúa participando de manera permanente como Macro Modulo de Vacunación contra Covid-19, para atender a toda la población del Estado de Morelos.

a) La Institución ha desempeñado un papel fundamental en la sociedad morelense, durante el año 2021 y para este año 2022 el reto de la UAEM fue y será en un sentido de resiliencia con los estudiantes y la sociedad ante el panorama del coronavirus y sus variantes, abriendo sus puertas para la vacunación. El papel que desempeño la universidad durante la pandemia fue fundamental con la instalación del Macro Módulo de vacunación en la que se aplicaron 96 mil 47 dosis del biológico al 08 de diciembre del 2021, en este sentido la Institución continúa con el apoyo logístico y de asistencia vial para la sociedad morelense, en el mes de marzo y abril se aplicaron refuerzos biológicos a la población morelense, a continuación, se presentan los comunicados que detallan el proceso. Para lo anterior, se adjunta relatoría de hechos y evidencias respectivas.

b) Alza en el costo de materiales para la construcción derivados del acero a consecuencia de la pandemia provocada por el SARS-CoV2 (COVID-19).

8.- Para las obras del FAM 2021, el monto ejercido fue de \$20,544,837.17 (veinte millones quinientos cuarenta y cuatro mil ochocientos treinta y siete pesos 17/100 M.N con un saldo de \$58.88 (cincuenta y ocho pesos 88/100 M.N). En relación a los rendimientos financieros generados al 31 de abril del año 2022, se realizó reintegro a la TESOFE por un monto de \$7,326.00 (siete mil trescientos veintiséis pesos 00/100 M.N.).

En este sentido, se informa que, la cuenta bancaria específica y productiva con N°: 1150116825, fue cancelada con fecha 11 de mayo del presente año. Cumpliendo en su totalidad con las acciones programadas en los cinco proyectos autorizados.

Por lo anterior, se adjuntan *debidamente firmadas de manera impresa y electrónica en formato PDF*, las Actas Administrativas de Entrega-Recepción y Actas Finiquito de los proyectos apoyados



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL  
ESTADO DE MORELOS

## COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

En relación a la fecha de conclusión de la obra “*Construcción de la Segunda para la ampliación de laboratorios, cubículos y oficinas académicas para el Centro de Investigaciones Biológicas entes (CEIB)*”, se ratifica que, la fecha de conclusión de la obra fue el 28 de febrero de 2022, en apego al Convenio Modificatorio al plazo de ejecución y monto del contrato primario de obra basado en precio unitario y tiempo determinado número 06-15520-OS-2021. (Se adjunta).


9.- Para las obras apoyadas con recursos del FAM 2022, con fecha 23 de marzo de 2022, mediante oficio R/043/2022, signado por el Dr. Gustavo Urquiza Beltrán Rector de la Institución, se comunica a la Lic. Mónica Boggio Tomasaz Merino Secretaria de Hacienda, que la Institución cuenta con la infraestructura necesaria para ejecutar los proyectos autorizados del FAM 2022, solicitando a su vez, el apoyo con la gestión para la ministración de los recursos a la Institución.

Con apoyo del área jurídica de la Institución, se llevó a cabo la formalización del Instrumento Jurídico “*Convenio para la Transferencia y Ejecución de Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraestructura Educativa de Nivel Superior*, con fecha de firma 6 de mayo de 2022, celebrado con el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos representado en este caso por la Secretaria de Hacienda y la Secretaria de Educación.


De acuerdo a lo establecido en el Manual de Políticas y Procedimientos de la Dirección General de Presupuesto y Gasto Público, adscrita a la Secretaria de Hacienda. Se inicia con el procedimiento que conlleva a la liberación de los recursos a través del Gasto de Capital (Inversión Pública), para lo cual se registraron los proyectos FAM 2022 en el Sistema de la Unidad de Inversión Estatal (SUIE) obteniendo clave de cartera en los proyectos por parte de la Dirección General de Evaluación de Proyectos de Inversión, adscrita a la Secretaría de Educación, una vez que se otorga clave de cartera, se procede al registro en el Sistema Integral de Gestión Financiera (SIGEF) para obtener la cédula básica y expediente técnico.

Finalmente, y como parte de lo establecido en el manual, se está en espera de la clave de la obra y oficio de aprobación, lo anterior, para proceder a la elaboración de las Solicitudes de Liberación de Recurso (SLR) que conlleva a la ministración de los recursos a la institución.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.



Atentamente  
**Por una humanidad culta**  
*Una universidad de excelencia*

  
**DR. ALVARO ZAMUDIO LARA**  
Coordinador General de Planeación y Administración

C.c.p. Dra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta, Directora General de Educación Superior Universitaria e Intercultural. Para su conocimiento.  
Dr. Gustavo Urquiza Beltrán Rector de la UAEM. Para su conocimiento.  
Dr. Pedro Antonio Márquez Aguilar, Director General de Planeación Institucional de la UAEM. Mismo fin.  
Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández, Director General de Infraestructura. Mismo fin.

Archivo.  
PAMA/ANPM/





EDIFICIO No 54 BIBLIOTECA CENTRAL		
RETIRO DE CANCELERA DE ALUMINO	1 43.00	DESAMANTELAMIENTO Y RETIRO DE CANCELERA EXISTENTE CON RECUPERACION ADECUADO INTERNO
REPOSICION DE CANCELERA DE ALUMINO	1 43.00	FABRICACION Y COLOCACION DE CANCELERA INTERIOR Y EXTERIOR DE ALUMINO BLANCO EN TRES SECCIONES IGUALES DOS FUSAS Y UNA CORREDEJA CON CRISTAL CLARO NORMAL DE 4 MM FLUA CON TAJUETES Y TORNILLOS PERFILES VINILO SELLADOR
CANCEL PLEGABLE	1 48.00	FABRICACION Y COLOCACION DE CANCEL DE SISTEMA PLEGABLE TIPO Y LATERAL DE ALUMINO Y CRISTAL PERFILES SUPERIOR DE ALUMINO GOMETELA CON 4 RECAMBIOS HERMETICOS PIVOTE SUPERIOR PUERTA ABATIBLE CRISTAL CLARO SELLADORES PARA CRISTAL TAPAS DE ALUMINO CON CONECTOR DE ACERO INOXIDABLE, HERRAJES DE ALUMINO CON CONECTORES DE ACERO
REJILLA PLUMAL	1 48.00	COLOCACION DE REJILLA PLUMAL DEMOLICION DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE, HASTA 15 CM DE ESPESOR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORDERA LINEAL DE ACERO INOXIDABLE COLOCACION DE CONCRETO HECHO EN OBRA CON ARMAZONAJE INTEGRAL ACABADO ESCORBILADO DEMOLICION DE MUROS DE PIEDRA SANITARIO COLOCACION DE DRENAJE PLUMAL CON DE TUBO DE PVC DIAMETRO ANCLADO A MURO DE PIEDRA CON BRIDAZERA TIPO OMEGA PERFORACION EN MURO DE TABIQUE PARA PASO DE TUBERIA, RESANAR CON MORTERO ESTABILIZADOR
RAMPA DE CONCRETO	1 43.00	APLICACION DE 720 M DE PINTURA VINILICA SUPLENDO LOS CONCEPTOS DE CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO, MANTENIMIENTO DEL ELEVADOR Y MANTENIMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DE UPS LO ANTERIOR DEBIDO DE LAS NECESIDADES PARA LA ADECUACION Y MEJORA DE LOS ESPACIOS ACADÉMICOS AFILIADOS
ELEVADOR	1 15.00	
MANTENIMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DE UPS	1 18.00	PASO EN MURO DE REGISTRO ELECTROICO PARA ALUMBRADO DE TABICERA DETALLADO CON MORTERO CEMENTO ARENA ALIMENTACION ELECTRICA DE TABLERO NORMAL CON INTERRUPTOR PRINCIPAL BASE DE 30 M DE TUBO CONDUIT 150.00 M DE CABLE CALIBRE 2 NEGRO Y 30.00 M DE CABLE DEMOLICION 6 CONDUIT LE CONDUIT 1" CON TAPA Y EMPAQUE CIGUOS CON LE UNICORAL PUES INSTALACION Y CONEXION DE TABLERO ELECTROICO CON INTERRUPTOR PRINCIPAL RAMPA Y RESANE EN MURO PRUEBAS COLOCACION Y CONEXION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO CON CAJA MOLDEABLE INSTALACION Y CONEXION DE UPS EXISTENTE
<b>TOTAL</b>	<b>49</b>	<b>2371.45</b>

**GLOBAL DEL PROYECTO**

ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ADOCHAMPAN		Las adecuaciones y mejoras del Campus Oriente se realizarán conforme al contrato 05 1030 015 2020 con el contratista GRUPO CEPISA S.A DE CVJ en el periodo del 15 de Diciembre del 2020 al 22 de septiembre del 2021	
1-ADECUACION DE LABORATORIO P.A.	1	65	COLOCACION DE TUBO DE PVC ANCLADO BAJO LOSA Y ANCLADO A MURO COLOCACION DE PIEZAS DE PVC SANITARIO COLOCACION DE TUBO DE PVC PARA VENTILACION TENDIDO DE TUBO DE COBRE DE VARIOS DIAMETROS ANCLADO EN MURO O COLUMNA E BAJO LOSA AGE COMO PIEZAS DE COBRE DE DIFERENTES DIAMETROS COLOCACION DE TUBO DE COBRE PARA PASO DE VARIOS DIAMETROS ANCLADO EN MURO O COLUMNA Y BAJO LOSA SALIDAS ELECTRICAS PARA EXTRACTORES FABRICACION DE DRENAJE SALIDAS SANITARIAS EN TABICERAS Y REGADERA CONSTRUCCION DE REGISTRO SANITARIO COLOCACION DE TIRAZO Y BASE SALIDA HORQUILLA PARA TABICERAS Y REGADERA COLOCACION DE REGADERA DE EMERGENCIA CONSTRUCCION DE HOCO Y COLOCACION DE PRESURIZADOR COLOCACION DE TANQUE ESTACIONARIO PARA GAS CON BASE DE CONCRETO INSTALACION DE EXTRACTORES COLOCACION DE PLACONES TABICERAS
2-MEJORAS AUDITORIO P.B.	1	220	SE DIO PRIORIDAD A LA CONCLUSION DE LA ADECUACION DEL LABORATORIO P.A Y AMPLIAR DIMENSIONES REHABILITACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESTRADO CON PISO DE OUELA
3-MEJORAS EN ALLAJ	4	264	
MEJORAS EN AUDITORIO	1	45	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPERMEABILIZANTE EN LOSA PRETEL Y CHAPLANES
MEJORAS EN CUBICULOS	5	115	
ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TETELA DEL VOLCAN			

Se adjuntan las actas administrativas de entrega Recepcion y actas final del proyecto "Adecuacion y mejoras del Campus Oriente"

A las 12:00 hrs del día 22 de septiembre del año 2021, en las instalaciones de las unidades





ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MACATLAN	
1-FACHADA PRINCIPAL Y LATERALES	117 DESMONTAJE CON RECOUPERAÇÃO POR MEDIOS MANUALES DE PROTECCIONES DE HERRERA EN VENTANAS REMEDIADO CON CEMENTO EN ANILLOS, AZARREDO, RESANE DE BOQUILLAS CON MORTERO COMENTONEREA.
	404 FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS P1 DE 2.10 M. DE ALTURA Y 1.80 M. DE ANCHO. FABRICACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS DE 2.10 M. DE ALTURA Y 1.80 M. DE ANCHO A BASE DE MARCO PERIMETRAL DE SOLERA ENRELAJO VERTICAL CON REDONDO. 4 BARRAS HORIZONTALES DE SOLERA Y 20 ANILLOS DE SOLERA. CON PRIMER PINTURA ESMALTE.
	70 FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS P2 DE 2.10 M. DE ALTURA Y 1.80 M. DE ANCHO. FABRICACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS DE 2.10 M. DE ALTURA Y 1.80 M. DE ANCHO A BASE DE MARCO PERIMETRAL DE SOLERA ENRELAJO VERTICAL CON REDONDO. 4 BARRAS HORIZONTALES DE SOLERA Y 18 ANILLOS DE SOLERA. CON PRIMER PINTURA ESMALTE.
2-AUDITORIO	137 FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS P-3 DE 2.00 M. DE ALTURA Y 1.90 M. DE ANCHO.
	197 SE COLOCARON LAS PROTECCIONES P1 Y P2 POR LA MODIFICACIÓN DE UBICACIÓN EN LAS VENTANAS. FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS P-4 DE 1.77 M. DE ALTURA Y 1.30 M. DE ANCHO.
	197 DESMONTAJE Y RETIRO DE PUERTA DE ALUMINO
	197 FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE EMERGENCIA A BASE DE ALUMINO BLANCO Y TABLERO DE CUELA DE 1.80 X 2.54 M. DE ALTURA. FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE EMERGENCIA CON DOS ABATIENTOS, A BASE DE ALUMINO BLANCO DE 3" Y TABLERO DE CUELA UNICORA DE 1.80 X 2.54 M. CON 2 BARRAS ANTI-PÁNICO HORIZONTALES. VINILOS, EMPAQUES, MARCO Y REFUERZO HORIZONTAL DE ALUMINO, CHAMBRANA, BISAGRAS HIDRÁULICAS, SELLADO PERIMETRAL.
3-SALA DE COMPUTO	85 SE COLOCARON LAS PROTECCIONES P1 Y P2 POR LA MODIFICACIÓN DE UBICACIÓN EN LAS VENTANAS. FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS P-5 DE 2.08 M. DE ALTURA Y 0.75 M. DE ANCHO.
	85 FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS P-6 DE 2.10 M. DE ALTURA Y 1.80 M. DE ANCHO.
4-BIBLIOTECA	66 FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS P-6 DE 2.10 M. DE ALTURA Y 1.80 M. DE ANCHO.
	66 SE MODIFICARON LOS ALCANCES DEL CONCEPTO EN RELACIÓN A APLICACIÓN DE PINTURA EN BIBLIOTECA, DERIVADO DE LAS NECESIDADES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS ESPACIOS ACADÉMICOS, POR LO ANTERIOR SE CONTEMPLA LA APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN 300 ML PARA LAS AULAS.
ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TETECALA	
1-FACHADA PRINCIPAL Y LATERALES	117 SE MODIFICARON LOS ALCANCES DE LOS CONCEPTOS EN RELACIÓN A APLICACIÓN DE PINTURA EN BIBLIOTECA Y DESMONTAJE DE PROTECCIONES DE HERRERA DERIVADO DE LAS NECESIDADES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS ESPACIOS ACADÉMICOS, POR LO ANTERIOR SE CONTEMPLA LA COLOCACIÓN DE 2 PROTECCIONES DE HERRERA DESMONTAJE DE PROTECCIONES DE HERRERA.
	404 FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS P1 DE 2.10 M. DE ALTURA Y 1.80 M. DE ANCHO. FABRICACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS DE 2.10 M. DE ALTURA Y 1.80 M. DE ANCHO A BASE DE MARCO PERIMETRAL DE SOLERA ENRELAJO VERTICAL CON REDONDO. 4 BARRAS HORIZONTALES DE SOLERA Y 20 ANILLOS DE SOLERA. CON PRIMER PINTURA ESMALTE.
	70 FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS P2 DE 2.10 M. DE ALTURA Y 1.80 M. DE ANCHO. FABRICACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS DE 2.10 M. DE ALTURA Y 1.80 M. DE ANCHO A BASE DE MARCO PERIMETRAL DE SOLERA ENRELAJO VERTICAL CON REDONDO. 4 BARRAS HORIZONTALES DE SOLERA Y 18 ANILLOS DE SOLERA. CON PRIMER PINTURA ESMALTE.
2-AUDITORIO	137 SE COLOCARON LAS PROTECCIONES P1 Y P2 POR LA MODIFICACIÓN DE UBICACIÓN EN LAS VENTANAS. FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS P-3 DE 2.00 M. DE ALTURA Y 1.90 M. DE ANCHO.
	137 FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS P-4 DE 1.77 M. DE ALTURA Y 1.30 M. DE ANCHO.
	197 DESMONTAJE Y RETIRO DE PUERTA DE ALUMINO
	197 FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE EMERGENCIA A BASE DE ALUMINO BLANCO Y TABLERO DE CUELA DE 1.80 X 2.54 M. DE ALTURA. FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE EMERGENCIA CON DOS ABATIENTOS, A BASE DE ALUMINO BLANCO DE 3" Y TABLERO DE CUELA UNICORA DE 1.80 X 2.54 M. CON 2 BARRAS ANTI-PÁNICO HORIZONTALES. VINILOS, EMPAQUES, MARCO Y REFUERZO HORIZONTAL DE ALUMINO, CHAMBRANA, BISAGRAS HIDRÁULICAS, SELLADO PERIMETRAL.
3-SALA DE COMPUTO	85 SE COLOCARON LAS PROTECCIONES P1 Y P2 POR LA MODIFICACIÓN DE UBICACIÓN EN LAS VENTANAS. FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS P-5 DE 2.08 M. DE ALTURA Y 0.75 M. DE ANCHO.
	85 FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS P-6 DE 2.10 M. DE ALTURA Y 1.80 M. DE ANCHO.

octubre del año 2021 en la sede de jefes de la Dirección de Desarrollo de Infraestructura se firmó el acta administrativa de finiquito y extinción de derechos y obligaciones del contrato 07/1526-05-2020.

"Marcelino de la Cruz del Campes Sur y Panteón".

4-BIBLIOTECA	FABRICACION Y COLOCACION DE 8 PROTECCIONES METALICAS P.6 DE 2.10 M. DE ALTURA Y 1.80 M. DE ANCHO  SE MODIFICARON LOS ALCANCES DE LOS CONCEPTOS EN RELACION A APLICACION DE PINTURA EN BIBLIOTECA Y DESMONTAJE DE PROTECCIONES DE HERRERIA, ORDENADO DE LAS NECESIDADES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS ESPACIOS ACADÉMICOS. POR LO ANTERIOR SE CONTIENE LA COLOCACION DE 2 PROTECCIONES DE HERRERIA.				
ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MAZATEPEC	LOS TRABAJOS REALIZADOS EN CONTRATO DE DESMONTAJE CON REUPERACION DE CANCELERIA EXISTENTE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINO, DESMONTAJE CON REUPERACION DE PUERTAS EXISTENTES Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS SOLO SERAN APLICADOS PARA EL EDIFICIO 2, DEL LA CIUDAD ESCUELA DESMONTAJE DE VENTANAS DE ALUMINO CON REUPERACION ACABADO AL SITO DE FACTOR, PISANA DE BOQUELA CON MORTERO CEMENTO ARENA				
1-EDIFICIO 2 ARIAS 1, 2, 3, 4 (CANCELERIA)	COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINO BLANCO TIPO TUBA TORREDA COLOCADA CON TAJUETES Y TORNELLOS CON TABLERO DE CRISTA CUPO, PROFLES, FOLION.  DESMONTAJE DE PUERTAS METALICAS PANEL O MADERA DESMONTAJE DE PUERTAS METALICAS PANEL VOI MADERA UNIBRICO CON CANCEL EN ANGALES, ACABADO AL LOGAR DE FACTOR, PISANA DE BOQUELAS, CON MORTERO CEMENTO ARENA.  ARMADO Y COLOCACION DE MULTI-PUERTA LISA, ARMADO Y COLOCACION DE MULTI-PUERTA TIPO CAPOTE DE 880 X 2.418 M. COLOCACION DE PUNTE LAMINADO CHAPA N°1, CUPO, CHAPA FERMETAL, LE ALUMINO NATURAL Y MARCO DE ALUMINO NATURAL CON TRES BOLSAS DE LIBRO, ROMANICAL, COLOCACION DE CHAPA DOBLE MANUA, COLOCACION DE CONTRAMARCO Y ACCESORIOS.  LOS TRABAJOS REALIZADOS EN CONTRATO DE DESMONTAJE CON REUPERACION DE CANCELERIA EXISTENTE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINO, 40 DESMONTAJE CON REUPERACION DE PUERTAS EXISTENTES Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS SOLO SERAN APLICADOS PARA EL EDIFICIO 2, DEL LA CIUDAD ESCUELA DESMONTAJE DE VENTANAS DE ALUMINO	256			
2-EDIFICIO 3 ARIAS 5 (CANCELERIA)	COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINO BLANCO 40 DESMONTAJE DE PUERTAS METALICAS PANEL O MADERA 40 ARMADO Y COLOCACION DE MULTI-PUERTA LISA 42 DESMONTAJE DE VENTANAS DE ALUMINO				
3-SALA DE SESIONES ORALES	COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINO BLANCO 40 DESMONTAJE DE PUERTAS METALICAS PANEL O MADERA 40 ARMADO Y COLOCACION DE MULTI-PUERTA LISA 42 DESMONTAJE DE VENTANAS DE ALUMINO				
4-ALDOVISUAL	DESMONTAJE DE VENTANAS DE ALUMINO 77 COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINO BLANCO 40 DESMONTAJE DE PUERTAS METALICAS PANEL O MADERA 40 ARMADO Y COLOCACION DE MULTI-PUERTA LISA 77 ARMADO Y COLOCACION DE MULTI-PUERTA LISA, HABILITADA CON SALIDA DE EMERGENCIA 77 APLICACION DE PINTURA				
TOTAL		77.00	854.00		

\$26,764,168.00    \$26,780,608.72    \$3,660.28

  
Dr. Gustavo Urquiza Beltrán  
Rector

  
Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández  
Director General de Infraestructura

1 Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta filas como sea necesario.  
2 En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.  
3 Es importante que las fechas de inicio y término se estén actualizando. Todos en dos dígitos, dd, mm y aa.



2020

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
Segundo Trimestre 2022  
(Abril-Junio)  
FECHA REPORTE: 30/06/2022


REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

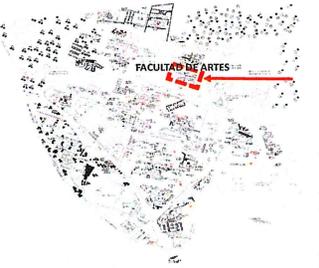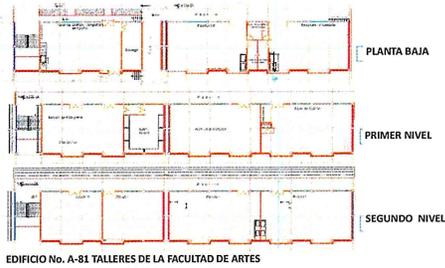 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS Porcentaje de avance <h1>100%</h1>	PRIORIDAD <b>1</b> Nombre de la obra: <b>Construcción de la segunda etapa para los Talleres de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (etapa final).</b>	<b>CROQUIS DE LOCALIZACIÓN</b>  	<b>UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO</b> Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca, Mor. C.P.62209. Cuernavaca Morelos.
	<b>EDIFICIO No. A-81 TALLERES DE LA FACULTAD DE ARTES</b> 		

FOTOS (ANTES)



F1: Fachada Principal de la Facultad de Artes.

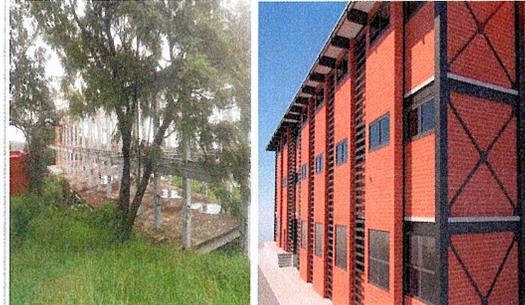

F2: Fachada Lateral de la Facultad de Artes.

Comentarios de los trabajos realizados:  
Las acciones se cumplieron al 100% conforme al proyecto original.

Informe que refleja el cierre del proyecto, cumpliéndose así las acciones establecidas en el proyecto original. 1.- se adjunta las actas administrativa de entrega - recepción y acta finiquito del contrato 06-15520-OS-2020. 2.- Se adjunta convenio modificatorio de diferimiento al plazo de ejecución, respecto del contrato primario de obra basado en precio unitario y tiempo determinado número 06-15520-OS-2020. 3.- Se adjunta comprobante de devolución a la TESOFE del remanente del capital por un monto de \$3,660.28 (tres mil seiscientos sesenta pesos 28/100 M.N.) para el caso de los rendimientos financieros generados en la cuenta, del periodo del 1° de noviembre 2021 al 30 de abril de 2022 por un monto de \$27,398.00 (veintisiete mil trescientos noventa y ocho pesos), se devolvieron mediante línea de captura N° 0022AAYD221061021212. En este sentido, el 19 de mayo del presente año se realizó la cancelación de la cuenta bancaria específica y productiva 1105602869 destinada para los recursos del fondo.


FOTOS (DESPUÉS)



F3: Taller 1, Planta Baja de la Facultad de Artes.



F4: Taller 2, Planta Baja de la Facultad de Artes.

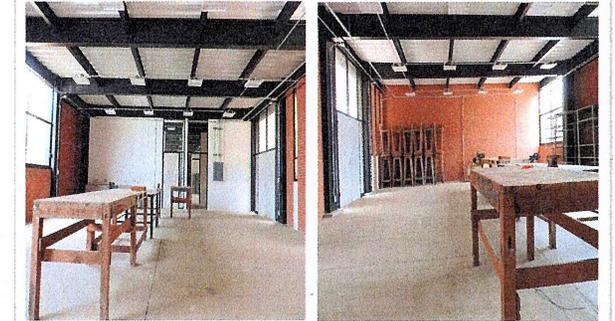

F5: Taller 3, Planta Baja de la Facultad de Artes.

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL



F6: Taller 4, Primer nivel de la Facultad de Artes.



F7: Aula Usos Múltiples, Primer nivel de la Facultad de Artes.



F8: Taller 5, Primer nivel de la Facultad de Artes.



F9: Taller 6, Segundo nivel de la Facultad de Artes.




F10: Taller 7, Segundo nivel de la Facultad de Artes.



F11: Taller 8, Segundo nivel de la Facultad de Artes.




F12: Taller 9, Segundo nivel de la Facultad de Artes.

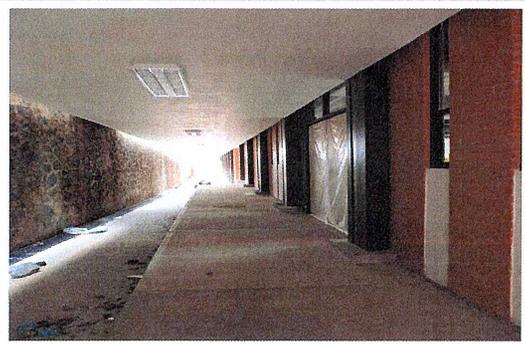

F13: Pasillo, Planta Baja de la Facultad de Artes.



F14: Escaleras, Planta Baja de la Facultad de Artes.

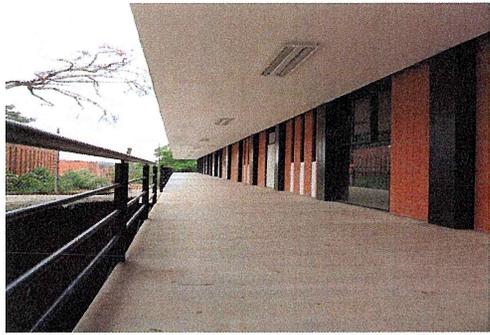


F15: Pasillo, Primer nivel de la Facultad de Artes.



F16: Escaleras, Primer nivel de la Facultad de Artes.



F17: Escaleras Segundo nivel de la Facultad de Artes.

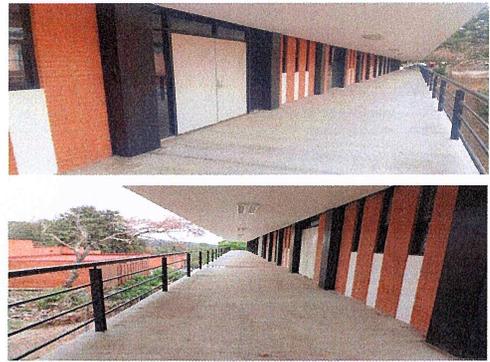

F18: Pasillo Segundo nivel de la Facultad de Artes.



F19: Plataforma de concreto, acceso al edificio de la Facultad de Artes.



F20: Plataforma de concreto, acceso al edificio de la Facultad de Artes.



F21: Fachada Lateral de la Facultad de Artes.




F22: Fachada Principal de la Facultad de Artes.



F23: Fachada Principal de la Facultad de Artes.



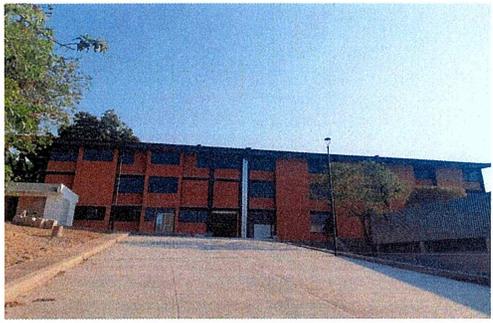

F24: Fachada Principal de la Facultad de Artes.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a horizontal line.

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán  
Rector

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a horizontal line.

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández  
Director General de Infraestructura

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.
