

Cuernavaca, Morelos, 10 de abril de 2021.  
CGPyA/187/2021.

**DR. ISAÍAS ELIZARRARAZ ALCARAZ**  
**DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL**  
P R E S E N T E

En el marco del **Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)** hago llegar a Usted de manera electrónica los informes de avance de obra e informes descriptivos correspondientes al **primer trimestre (enero, febrero y marzo) 2021**, en formato PDF debidamente firmados, conforme a lo siguiente:

- **Informe FAM 2015**, correspondiente al primer trimestre de 2021.
- **Informe FAM 2016**, correspondiente al primer trimestre de 2021.
- **Informe final FAM 2019:**
  1. **Reporte descriptivo de avance y reporte fotográfico** correspondiente al primer trimestre de 2021.
  2. **Actas administrativas de finiquito y extinción de derechos y obligaciones.**
  3. **Actas de entrega-recepción.**
- **Reporte descriptivo de avance y reporte fotográfico FAM 2020**, correspondiente al primer trimestre de 2021, así como documentación respectiva.

- **Reporte descriptivo de avance y reporte fotográfico FAM 2021**, correspondiente al primer trimestre de 2021, así como documentación respectiva.

Dichos informes se han enviado a las cuentas de correo electrónico: [isaias.elizarraz@nube.sep.gob.mx](mailto:isaias.elizarraz@nube.sep.gob.mx), [rocio@nube.sep.gob.mx](mailto:rocio@nube.sep.gob.mx) y [cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx](mailto:cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx).

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo cordial.

Atentamente  
*Por una humanidad culta*



**DR. ALVARO ZAMUDIO LARA**  
**COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN.**

C.c.p. Dra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta. -Directora General de Educación Superior Universitaria e Intercultural. Para su conocimiento.  
Dr. Gustavo Urquiza Beltrán. Rector de la UAEM. Mismo fin.  
Dr. Pedro Antonio Márquez Aguilar. Director General de Planeación Institucional de la UAEM. Mismo fin.  
Archivo.

AZL/PAMA/ANPM/ngpb

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Table with university details: Nombre: Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Entidad federativa: Morelos, Clave Inst: 011-17MSUG017, Responsables: Director General de Infraestructura: Oscar Gabriel Lázaro Fernández

Main project progress table with columns: Prioridad, Nombre del proyecto, Tipo de proyecto, Monto autorizado, Monto ejercido, Remanente, Acciones que sustentan el avance, Acciones por realizar, % de avance, Fechas, Observaciones, and OBRA CONCLUIDA (¿Es susceptible de ser inaugurada?, Si ya fue inaugurada, Cuenta con Actas).

\$21,117,815.90 \$21,078,826.21 \$41,200.69

Nota: Es importante mencionar, que los remanentes que se presentan en el informe de cuenta (columna 7 y 8) se encuentran cancelados con estados de cuenta bancarios al mes de Febrero del 2021.

Handwritten signature: P.P. Zúñiga

Dr. Gustavo Márquez Betancourt Director

Handwritten signature: Oscar Gabriel Lázaro Fernández Director General de Infraestructura

- 1 de capturar los espacios que caracterizan a la obra o proyecto.
2 En esta sección se reduce y se forma breve y conciso los trabajos a realizar, menciona que se venían realizando en el reporte de proyecto
3 Es importante que los fechas de inicio y término estén actualizadas y todos en los dígitos: dd, mm y aa.

2019

AÑO

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**1er Trimestre 2021**  
(Ene-Mar)  
FECHA DE CORTE: 31/03/2021

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD **1** Nombre de la obra



**Equipamiento de Espacios Académicos del campus Sur/poniente (Jicarero)**



Estado de la universidad  
Porcentaje de avance

**100.00%**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

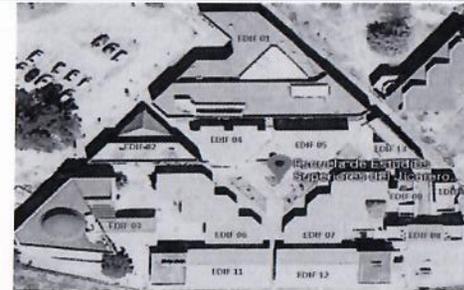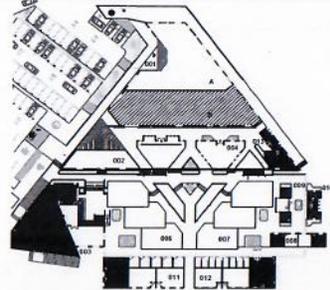

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Galeana-Tequesquitengo S/N Col. El Jicarero  
C.P. 62909 en el Municipio de Jojutla, Morelos.

FOTOS (ANTES)



F1: Fachada principal




F2: lateral


Comentarios de los trabajos realizados:

Al 31 de marzo de 2020 y de acuerdo a lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, vigente y artículo 4 fracción XIV de la Ley General de Contabilidad Gubernamental vigente. La institución, cumplió al 100 % con la adquisición del equipamiento de espacios académicos del Campus Sur /Poniente. En relación al remanente de capital por un monto de \$35,309.53 (treinta y cinco mil trescientos nueve pesos 53/100 M.N.) será devuelto a la Tesorería de la Federación (TESOFE) conforme a la cláusula décima primera del Convenio para la Transferencia y ejecución de recursos, suscrito por el Poder ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos y la institución, que a la letra dice:.- RECURSOS REMANENTES.- "Las partes acuerdan que los remanentes o saldos disponibles de los subsidios radicados en "LA CUENTA", así como los recursos entregados por "EL EJECUTIVO ESTATAL" a "LA UAEM", incluyendo los rendimientos financieros generados, que no se encuentre totalmente erogados, aplicados o comprometidos a la conclusión del ejercicio fiscal se reintegrarán en los terminos de las disposiciones jurídicas aplicables".


FOTOS (DESPUES)

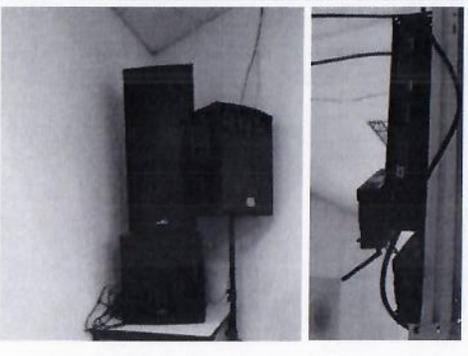

F3: Amplificador ubicado en el auditorio.

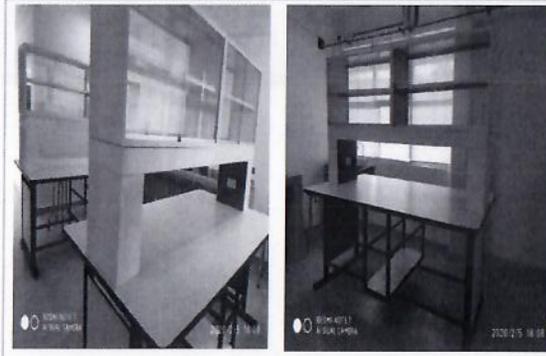


F4: Se ubican mesas de laboratorio en Laboratorio de estudios del lago (2) y Laboratorio principios activos (1)

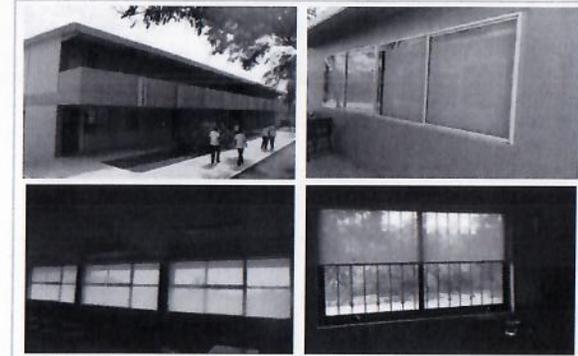


F5: Se ubican Persianas en aulas móviles, Edificio de enfermería, Edificio de psicología, Edificio de Investigación, Edificio 1, 11, 12, Centro de Cómputo y Aula de medios.

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

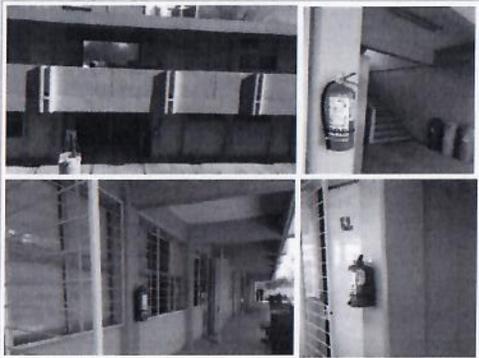


F6: Extintores Laboratorios (10), Centro de Cómputo (4) Y Aula de Medios, Camara Geselle (2), Edificio 15 (4), Edificio 17 (6) y Edificio 18(2).

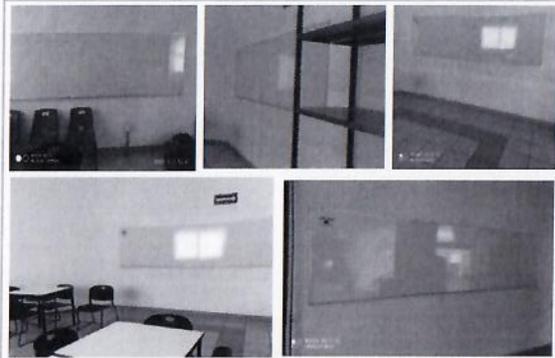

F7: Pizarrón (1) en Biblioteca, (1) en Laboratorio del lago, (1) en Laboratorio docencia, (1) en Salón 11, (1) en Aula de Medios, (1) en Edificio 1 y (1) en Sala Hipermedios.




F8: Anaquel (2) en Biblioteca, (5) en Eedificio 11, (4) Laboratorio de Lago, (1) en Laboratorio principios activos, (1) en Ee enfermeria, (4) en Edificio 16 y (1) Eedificio 12.



F9: Silla de Polipropileno en Sala de Juntas.




F10: Silla binaria (13) en Laboratorio del Lago y (30) en Aula Móvil 13

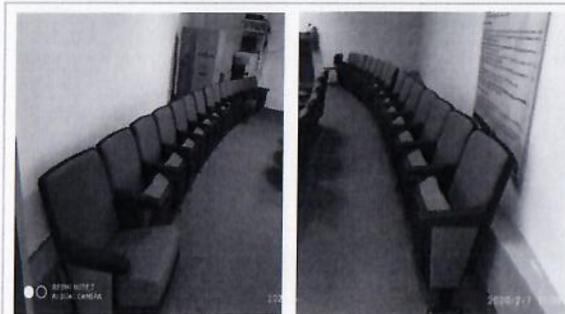

F11: Butaca en Auditorio.



F12: Locker en Edificio 15.



F13: Bafle en Auditorio.

P.P. *[Handwritten Signature]*

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán  
Rector

*[Handwritten Signature]*

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández  
Director General de Infraestructura

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra

2019

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
1er Trimestre 2021  
(Ene-Mar)  
FECHA DE CORTE: 31/03/2021

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD

1

Nombre de la obra: **Equipamiento de Espacios Académicos del campus Sur/poniente (Jojutla)**





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Escudo de la universidad

Porcentaje de avance

100.00%

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

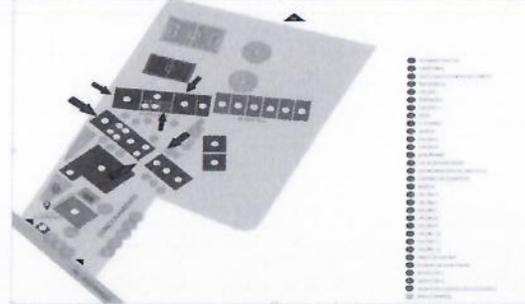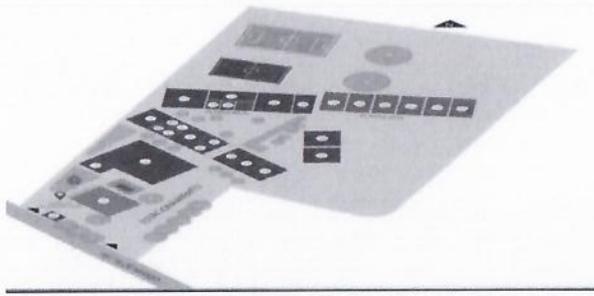

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Av. 18 de marzo # 617, Col. Emiliano Zapata C.P. 62900 Municipio de Jojutla de Juárez, Morelos.

FOTOS (ANTES)




F1: Fachada principal

Comentarios de los trabajos realizados:

Al 31 de marzo de 2020 y de acuerdo a lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, vigente y artículo 4 fracción XIV de la Ley General de Contabilidad Gubernamental vigente. La institución, cumplió al 100 % con la adquisición del equipamiento de espacios académicos del Campus Sur /Poniente. En relación al remanente de capital por un monto de \$35,309.53 (treinta y cinco mil trescientos nueve pesos 53/100 M.N.) será devuelto a la Tesorería de la Federación (TESOFE) conforme a la cláusula décima primera del Convenio para la Transferencia y ejecución de recursos, suscrito por el Poder ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos y la Institución, que a la letra dice:- RECURSOS REMANENTES.- "Las partes acuerdan que los remanentes o saldos disponibles de los subsidios radicados en "LA CUENTA", así como los recursos entregados por "EL EJECUTIVO ESTATAL" a "LA UAEM", incluyendo los rendimientos financieros generados, que no se encuentre totalmente erogados, aplicados o comprometidos a la conclusión del ejercicio fiscal se reintegrarán en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables".


FOTOS (DESPUES)



F2: Sillones ejecutivos en Sala de Juicios Orales.




F3: Módulo de Recepción en Biblioteca

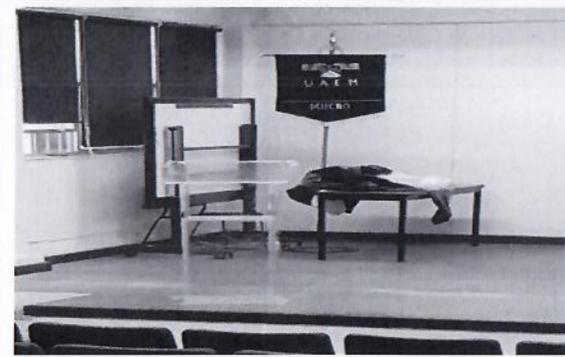


F4: Podium de acrílico en Auditorio.


REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

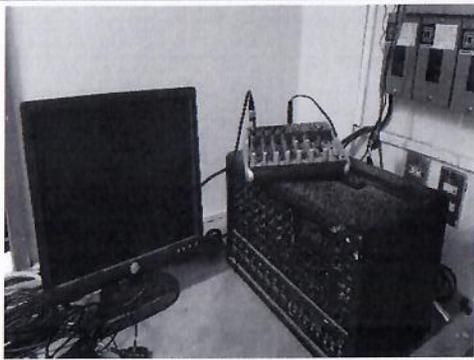

F5: Mezcladora en cabina de Auditorio.

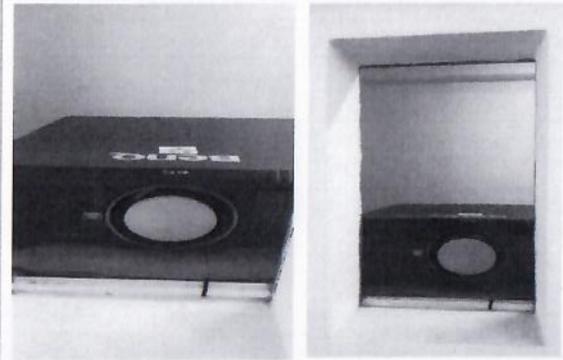

F6: Lente para video proyector en Auditorio.

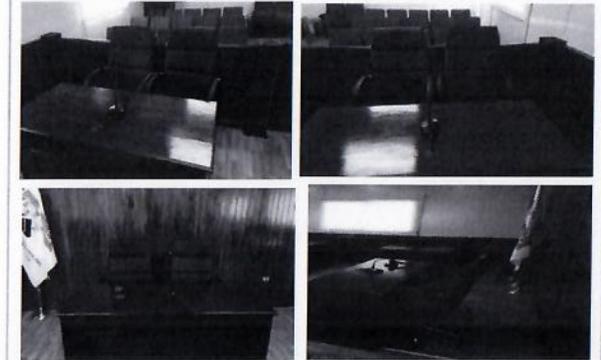

F7: Micrófonos en Sala de Juicios Orales.



F8: Videoproector en Auditorio.




F9: Silla binaria en Salón 4.



F10: Butaca para Sala de Juicios Orales.



F11: Balle en Auditorio.

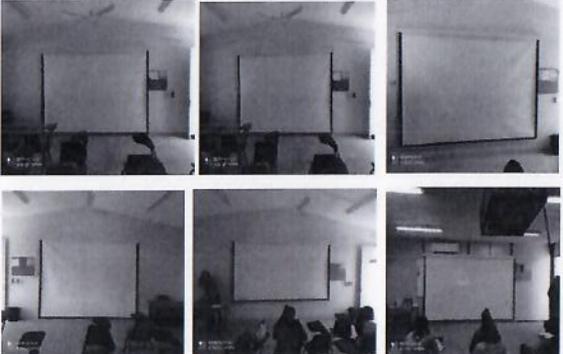


F12: Pantalla de Poyección en Salones 2, 5, 6, 7, 8 y 11.




F13: 2 extintores en el pasillo del edificio 2, 2 extintores en el pasillo de la planta alta del edificio 3, Extintores en salón 12, 13, 14 y 15.


REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

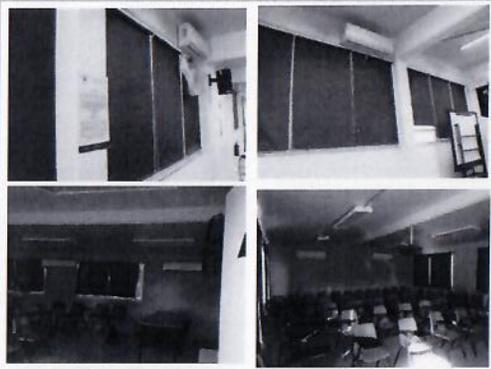


F14: 2 Aire acondicionado en Auditorio, 6 en salón 12, 13, 14 y 15 .

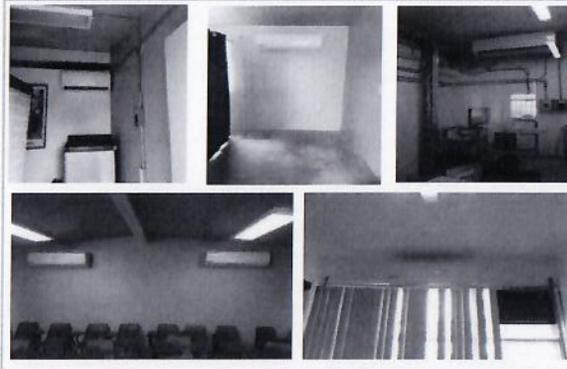

F15: 2 Aire Acondicionado en Aula de actividades culturales y 2 en Centro de Computo.,

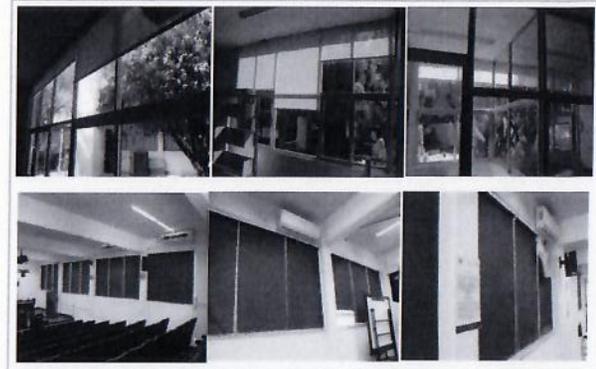

F16: Persianas en Biblioteca y Auditorio.

  
Dr. Gustavo Urquiza Beltrán  
Rector

  
Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández  
Director General de Infraestructura

\* Es muy importante que se anexe reporte fotografico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

2019

FAM

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**1er Trimestre 2021**  
(Ene-Mar)  
FECHA DE CORTE: 31/03/2021

AÑO

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES


REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD

1

Nombre de la obra: **Equipamiento de Espacios Académicos del campus Sur/poniente (Mazatepec)**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

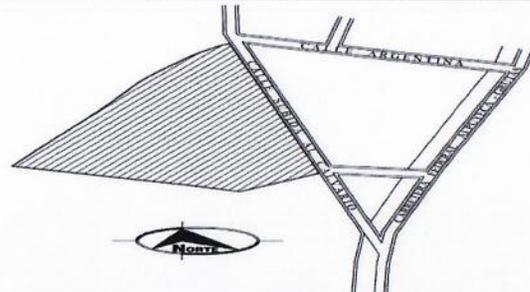

EDIFICIO 1




EDIFICIO 2



EDIFICIO 3



EDIFICIO 4



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Subida al Calvario  
S/N, Col. Justo Sierra, Mazatepec, Morelos.




UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Estado de la universidad


Porcentaje de avance

100.00%

FOTOS (ANTES)

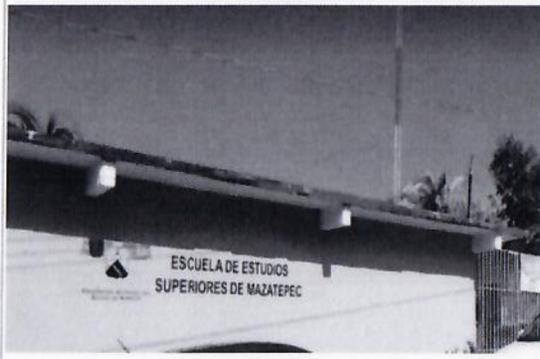

F1: Fachada principal

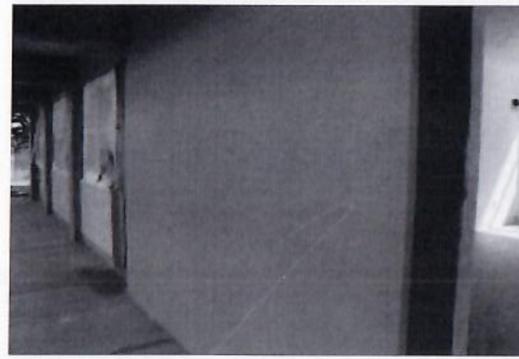

F2: lateral


Comentarios de los trabajos realizados:

Al 31 de marzo de 2020 y de acuerdo a lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, vigente y artículo 4 fracción XIV de la Ley General de Contabilidad Gubernamental vigente. La institución, cumplió al 100 % con la adquisición del equipamiento de espacios académicos del Campus Sur /Poniente. En relación al remanente de capital por un monto de \$35,309.53 (treinta y cinco mil trescientos nueve pesos 53/100 M.N.) será devuelto a la Tesorería de la Federación (TESOFE) conforme a la cláusula décima primera del Convenio para la Transferencia y ejecución de recursos, suscrito por el Poder ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos y la Institución, que a la letra dice: - RECURSOS REMANENTES.- "Las partes acuerdan que los remanentes o saldos disponibles de los subsidios radicados en "LA CUENTA", así como los recursos entregados por "EL EJECUTIVO ESTATAL" a "LA UAEM", incluyendo los rendimientos financieros generados, que no se encuentre totalmente erogados, aplicados o comprometidos a la conclusión del ejercicio fiscal se reintegrarán en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables".

FOTOS (DESPUES)



F3: Se colocaron pizarrones en salones 7, 8 y 9. En Sala de reuniones y Biblioteca.

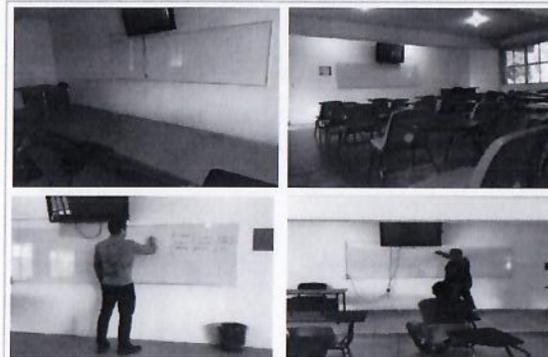

F4: Se colocaron Pizarrones en salones 1, 2, 3, 4, 5 y 6.




F5: Lockers se colocaron en pasillo de edificio 3 y en pared lateral del centro de computo.


REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



F6: Instalación de Extintores en pasillos de edificio 1, 2, 3, bodega

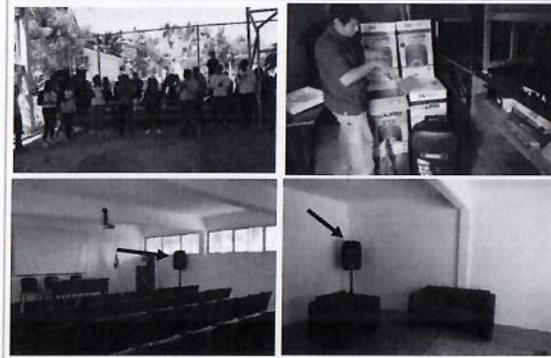


F7: Instalación de Bañes en Sala Audiovisual, espacio de Cabina de radio y television, Centro de Computo y en Canchas de Uso Múltiples.

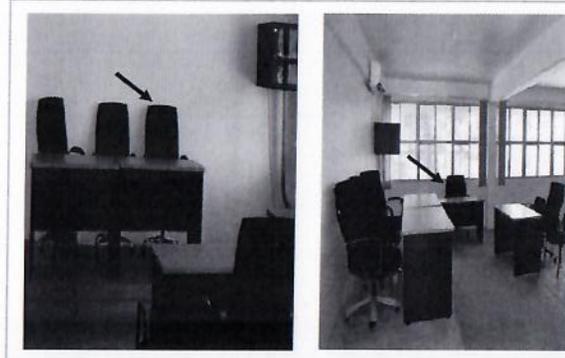


F8: Sillones ejecutivos se colocaron en Sala de Juicios Orales.



F9: Escritorios se colocó en Sala de Asesorías y se colocaron en Sala de Juicios Orales.




F10: Sillas de ISO lumbar se colocaron en Sala de Juicios Orales para realizar practicas de los alumnos de la licenciatura en derecho .

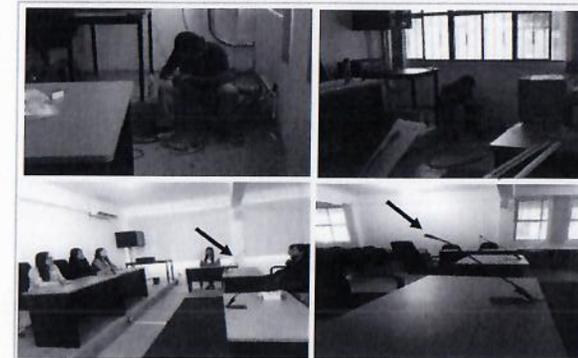

F11: Instalación de micrófonos en Sala de Juicios Orales.



F12: Bocinas instaladas en Sala de Juicios Orales.

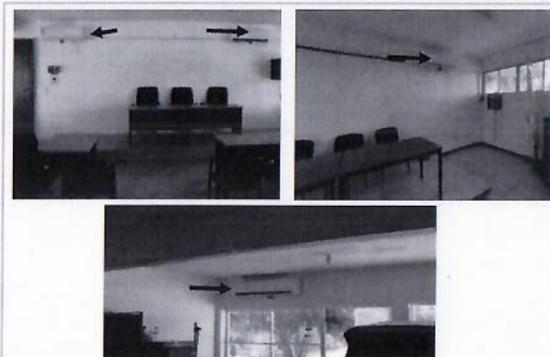

F13: Aire Acondicionado se instalaron en Sala de Juicios Orales, en Sala Audiovisual, en el Centro de cómputo y en Sala de Radio y Televisión.





F14: Silla de polipropileno en Salones 1,2,3 y 4.

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



F15: Silla Polipropileno en Salones 5, 6 y 7.

  
Dr. Celsivo Urquiza Beltrán  
Rector

  
Aja Oscar Gabriel Lastra Fernández  
Director General de Infraestructura

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.  
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

AÑO

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**1er Trimestre 2021**  
**(Ene-Mar)**  
FECHA DE CORTE: 31/03/2021

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIMORDIA

1

Nombre de la obra: **Equipamiento de Espacios Académicos del campus Sur/poniente (Miacatlán)**




UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Estado de la unidad/obra

Porcentaje de avance

**100.00%**


CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

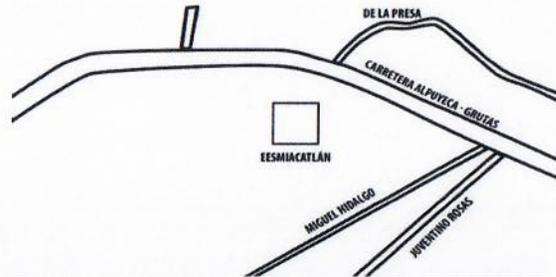

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Alpuyeca -Grutas S/N Col. La Toma,  
Miacatlán, Morelos. C.P. 62605

FOTOS (ANTES)

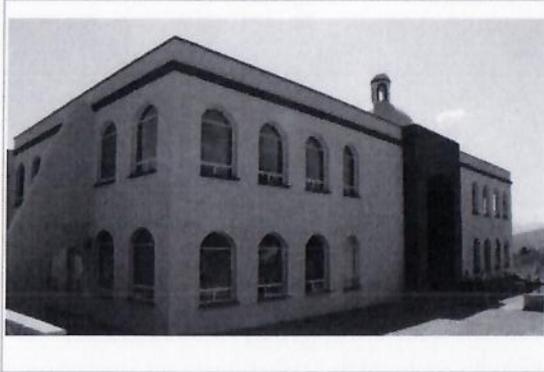


F1: Fachada principal


Comentarios de los trabajos realizados:

Al 31 de marzo de 2020 y de acuerdo a lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, vigente y artículo 4 fracción XIV de la Ley General de Contabilidad Gubernamental vigente. La institución, cumplió al 100 % con la adquisición del equipamiento de espacios académicos del Campus Sur /Poniente. En relación al remanente de capital por un monto de \$35,309.53 (treinta y cinco mil trescientos nueve pesos 53/100 M.N.) será devuelto a la Tesorería de la Federación (TESOFE) conforme a la cláusula décima primera del Convenio para la Transferencia y ejecución de recursos, suscrito por el Poder ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos y la Institución, que a la letra dice: - RECURSOS REMANENTES.- "Las partes acuerdan que los remanentes o saldos disponibles de los subsidios radicados en "LA CUENTA", así como los recursos entregados por "EL EJECUTIVO ESTATAL" a "LA UAEM", incluyendo los rendimientos financieros generados, que no se encuentre totalmente erogados, aplicados o comprometidos a la conclusión del ejercicio fiscal se reintegrarán en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables".


FOTOS (DESPUES)

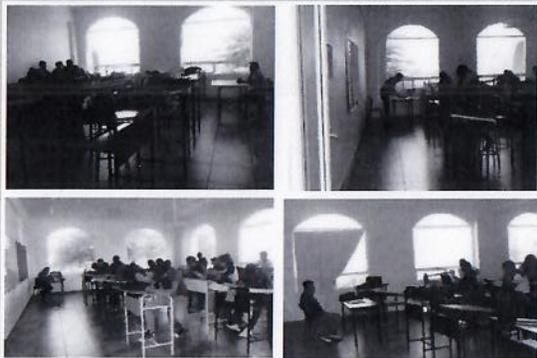

F2: Sillas para maestros, se colocaron en los Salones A-1, A-2, A3-A-4, P-1, P-2, P-3 P-4, P-5 y P6.




F3: Mesas para alumnos están ubicadas en la Biblioteca.

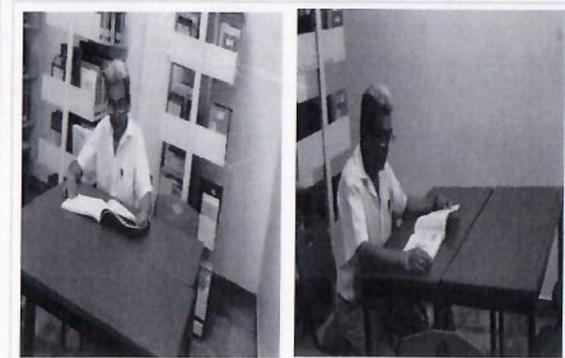


F4: Mesa para maestros están ubicadas en la Biblioteca.


REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

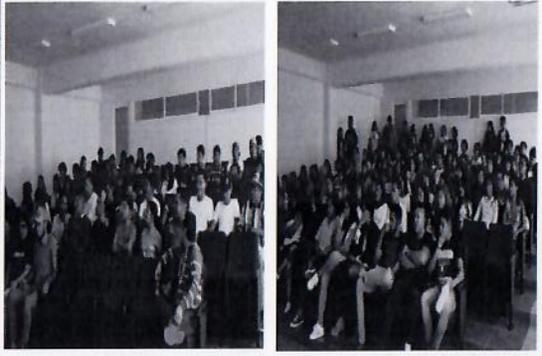


F6: Butacas para auditorio se colocaron en la plataforma del auditorio.



F6: Proyector, se ubica en el Auditorio.

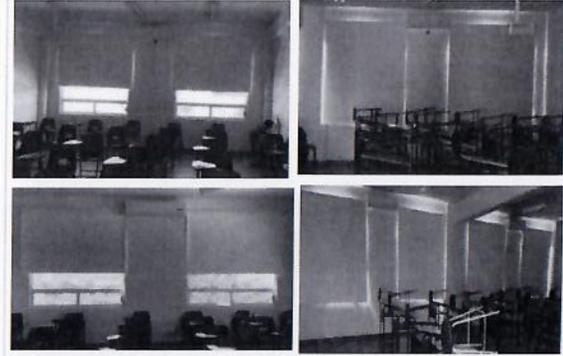

F7: Persianas para Aulas A1-A, A-2, A3, A-4, P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, Biblioteca, Centro de Cómputo y ventanas de área común.

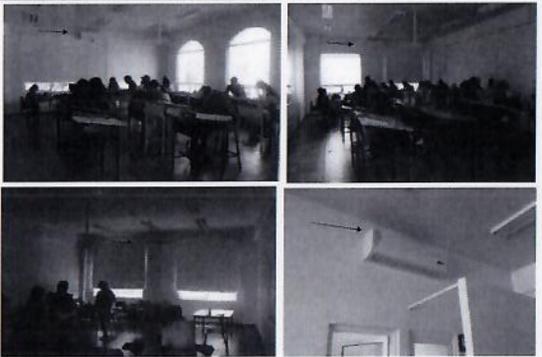

F8: Sistema de aire acondicionado A1, A2, A3, A4, P1, P2, P3, P4, P5, y P6.



F9: Sistema de aire acondicionado Biblioteca, Centro de Cómputo y Auditorio.

*P.P. Zucchi*

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán  
Rector

*[Signature]*

Mq. Oscar Gabriel Lastra Fernández  
Director General de Infraestructura

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
1er Trimestre 2021  
(Ene-Mar)  
FECHA DE CORTE: 31/03/2021

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD 1 Nombre de la obra

Equipamiento de Espacios Académicos del campus Sur/poniente (Tetecala)

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO


Av. Lazaro Cardenas, Esquina con Altamirano  
S/N, colonia  
centro C.P. 62620 en el Municipio de Tetecala,  
Morelos.



Escudo de la universidad  
Porcentaje de avance

100.00%

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

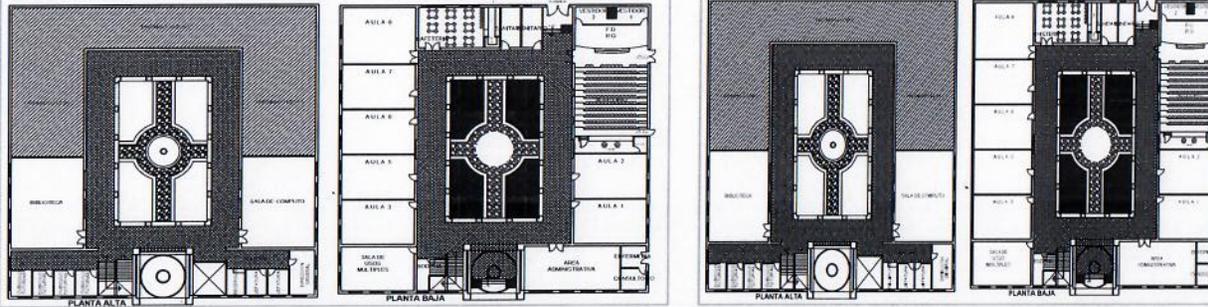

FOTOS (ANTES)




F1: Fachada principal


Comentarios de los trabajos realizados:

Al 31 de marzo de 2020 y de acuerdo a lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, vigente y artículo 4 fracción XIV de la Ley General de Contabilidad Gubernamental vigente. La institución, cumplió al 100 % con la adquisición del equipamiento de espacios académicos del Campus Sur /Poniente. En relación al remanente de capital por un monto de \$35,309.53 (treinta y cinco mil trescientos nueve pesos 53/100 M.N.) será devuelto a la Tesorería de la Federación (TESOFE) conforme a la cláusula décima primera del Convenio para la Transferencia y ejecución de recursos, suscrito por el Poder ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos y la Institución, que a la letra dice:.- RECURSOS REMANENTES.- "Las partes acuerdan que los remanentes o saldos disponibles de los subsidios radicados en "LA CUENTA", así como los recursos entregados por "EL EJECUTIVO ESTATAL" a "LA UAEM", incluyendo los rendimientos financieros generados, que no se encuentre totalmente erogados, aplicados o comprometidos a la conclusión del ejercicio fiscal se reintegrarán en los terminos de las disposiciones jurídicas aplicables".


FOTOS (DESPUES)

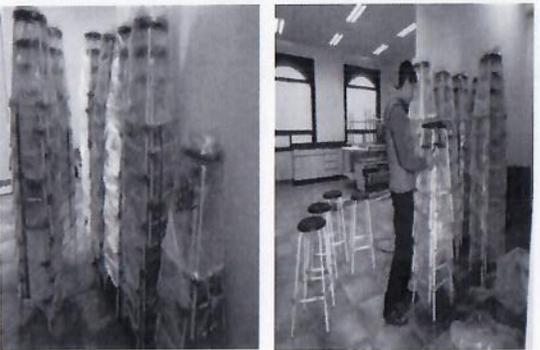

F2: Bancos para laboratorio se instalaron en el Aula 3-C.

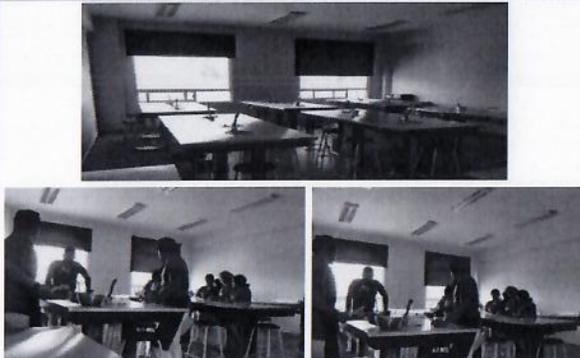


F3: Se colocará Mesas de laboratorio en el Salón 3-C.

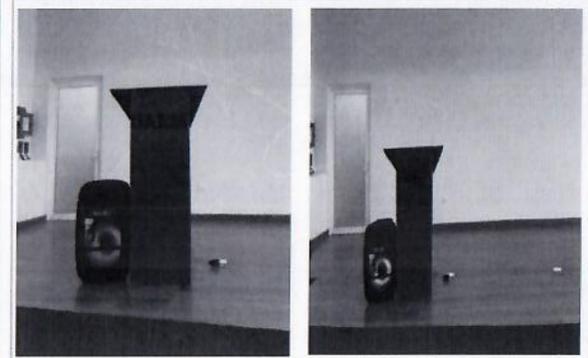


F4: Se instaló Barre en Auditorio.


REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



F5: Pantalla de proyección en área 6, Auditorio.

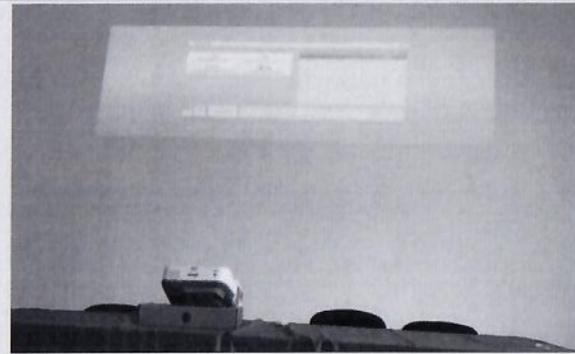


F6: Proyector se ubica en el Auditorio.

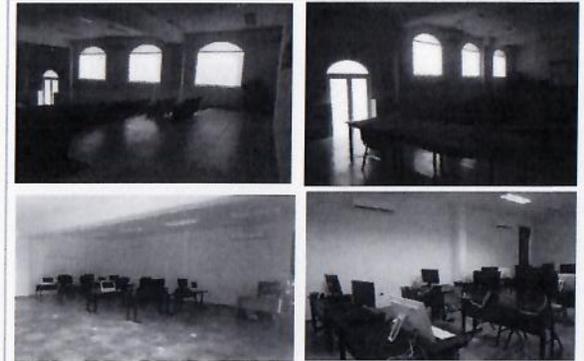

F7: Se colocaron Aire acondicionado en Auditorio y Centro de Cómputo.



F8: Se colocaron persianas en Salones 3-A, 3-B y 3-C.

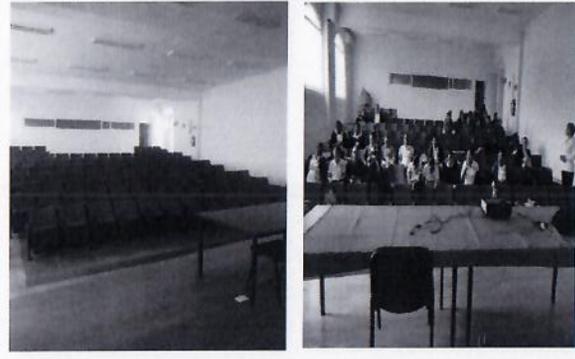

F9: Se colocaron las butacas para auditorio en el área 6, Auditorio.



F10: Se colocaron persianas en Salon 11, 12 y Biblioteca.

P.P. *[Signature]*

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán  
Rector

*[Signature]*

Ago. Oscar Gabriel Lastra Fernández  
Director General de Infraestructura

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

2019

FAM

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**Primer Trimestre 2021**  
(Enero-Marzo)  
FECHA DE CORTE: 31/03/2021

AÑO

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

2 Nombre de la obra:

Segunda Etapa de la Escuela de Estudios Superiores de Atlalahucán



Estado de la universidad  
Porcentaje de avance

100%

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



Calle Universidad

EESAI-UAEM

Predio EESAI-UAEM

Aplicación de la OSISMA


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Calle Universidad S/N Barrio San Antonio  
Atlalahucan, Morelos C.P. 62840

FOTOS



F1: Fachada principal

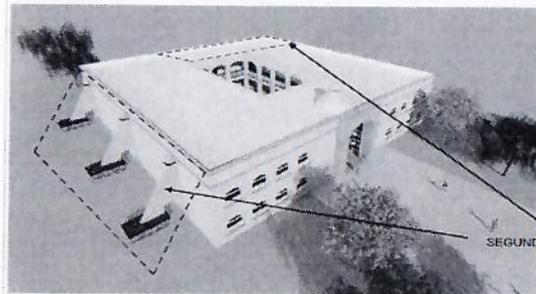


F2: lateral

Comentarios de los trabajos realizados:


Los trabajos complementarios contratados para esta etapa final contempla la obra exterior como son: conclusión de conexión de instalación sanitaria a red municipal, demolición y colado con concreto hecho en obra de banqueta y parte de vialidad, colocación de sistema de tierras, colado de cadenas y andador perimetral de fachada oriente y fachada sur, construcción de muros de contención y relleno con material producto de las excavaciones para soporte de contrafuertes de fachada sur, plantilla de concreto, habilitado de acero acero, habilitado de cimbra, colado con concreto hecho en obra de cimentación, colocación de anclas para soporte de placas, colocación de estructura metálica para escalera, aplicación de primer, pintura esmalte y puerta de aluminio blanco con barra antipánico para salida de emergencia, colocación de rejillas pluvial en puertas de auditorio y puerta posterior, colado con concreto hecho en obra de vestíbulo, forjado de escalones en acceso posterior y costado de colindancia, construcción de muro de contención lado poniente, conexión de bombas existentes a cárcamo seco de cisterna y aplicación de pintura en muros exteriores.

Informe que refleja el cierre del proyecto, cumpliéndose así las acciones establecidas en el proyecto original, en cumplimiento a lo anterior se adjuntan las acta de entrega recepción y acta administrativa de finiquito y extinción de derechos y obligaciones de los contratos 06-15520-OS-2019 y 09-15520-OS-2020. La obra complementaria en mención de este informe corresponde al contrato No. 09-15520-OS-2020. "obra complementaria para la E.E.S. Atlalahucan, escalera de emergencia, pintura y obra exterior."


FOTOS (DURANTE)

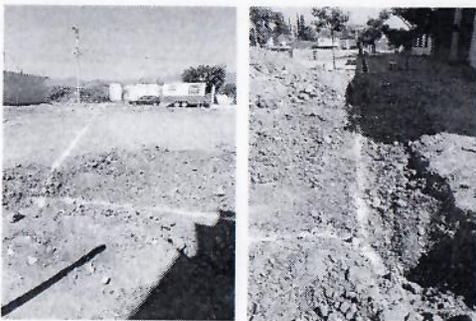


F3: Trazo de terreno para excavación de drenaje

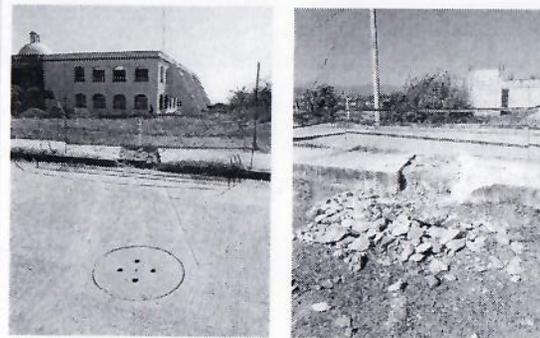


F4: Corte y demolición en concreto de vialidad para conexión a red de drenaje municipal

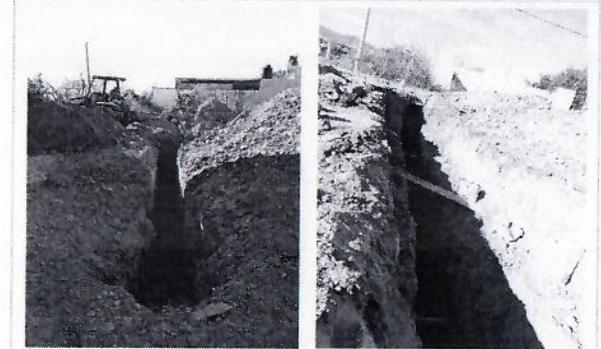

F5: Excavación de terreno por medios mecánicos para zanja de drenaje

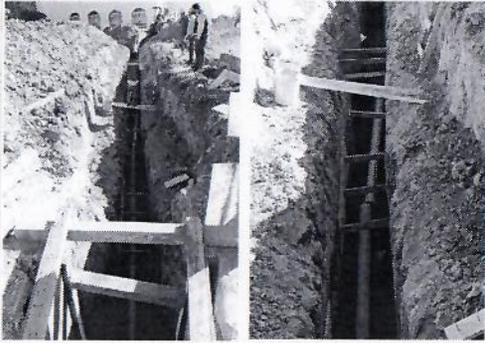


F6: Tendido de tubo de pvc sanitario a conexión con red municipal

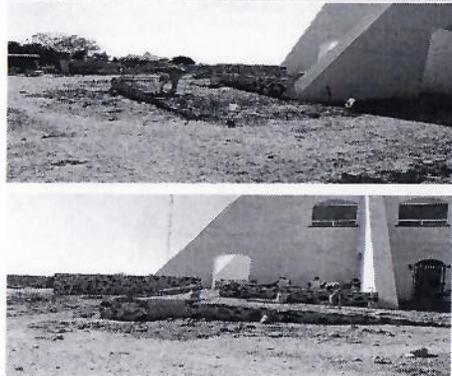


F7: Muro de mampostería para andador y contención de contrafuertes



F8: Muro de mampostería para andador y contención de contrafuertes

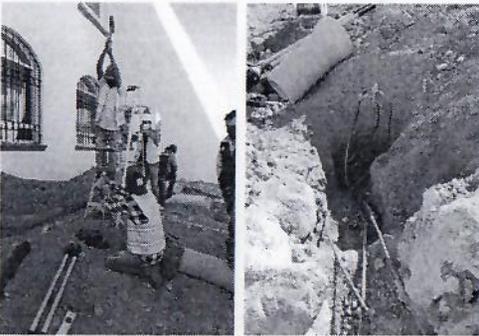


F9: Colocación de sistema de tierras en perímetro de claustro

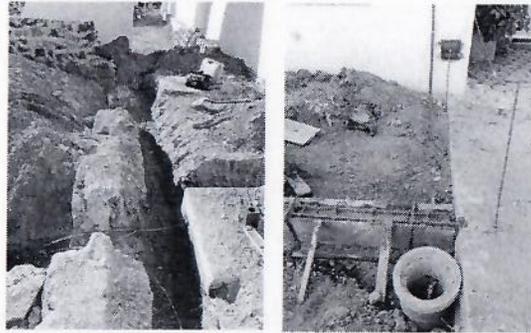

F10: Colocación de sistema de tierras en perímetro de claustro



F11: Conexión de cable desnudo a varilla de cobre para sistema de tierras

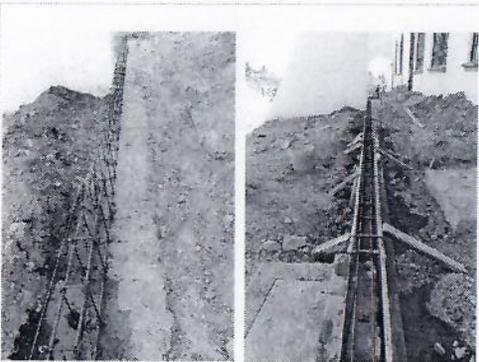


F12: Habilitado de acero y cimbra para cadena de andador perimetral




F13: Colado de cadena con concreto hecho en obra de andador perimetral




F14: Colado de cadena con concreto hecho en obra de andador perimetral

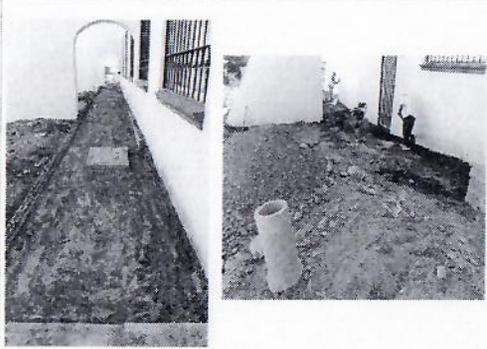

F15: Relleno y compactación de material por medios mecánicos en andador perimetral

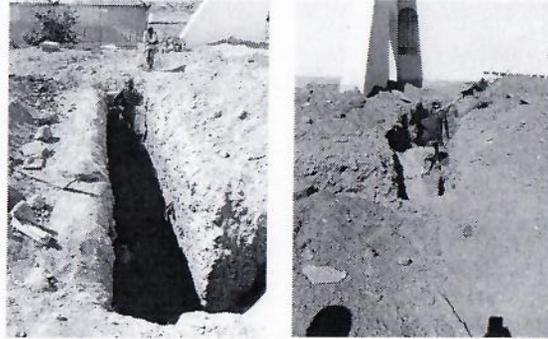

F16: Excavación de terreno por medios manuales para muro de contención

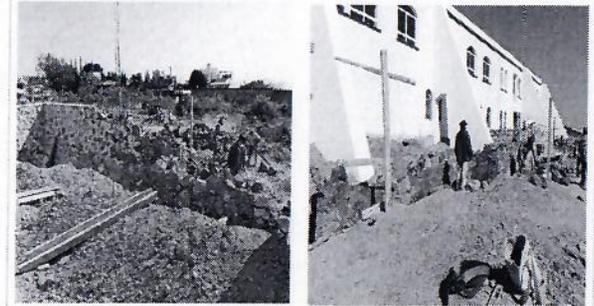


F17: Construcción de muro de contención para soporte de contrafuertes fachada sur



F18: Construcción de muro de contención para soporte de contrafuertes fachada sur



F19: Colado de plantilla de concreto hecho en obra para cimentación de escalera de emergencia

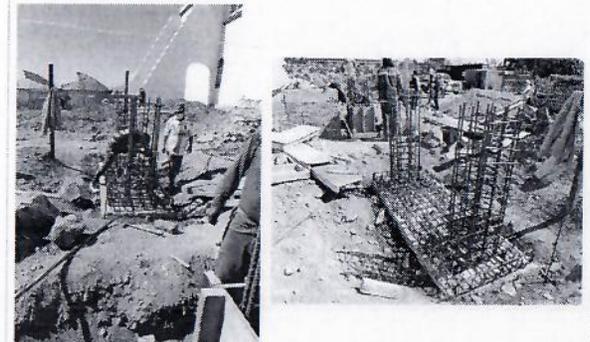

F20: Habilitado de acero para cimentación (zapatas, dados y traves) de escalera de emergencia




F21: Habilitado de cimbra para cimentación (zapatas, dados y traves) de escalera de emergencia



F22: Colado con concreto hecho en obra en primera parte de cimentación




F23: Habilitado de cimbra puente para traves de liga de cimentación de escalera de emergencia

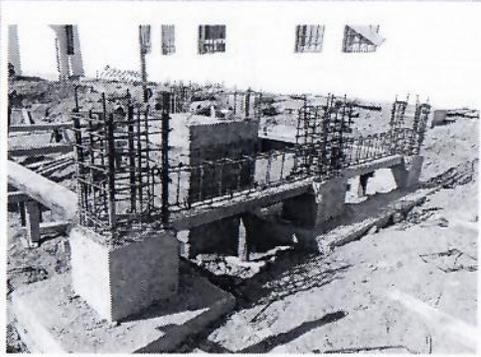


F24: Habilitado de acero para cimentación (dados y trabeas) de escalera de emergencia



F25: Habilitado de acero y cimbra para cimentación (dados y trabeas) de escalera de emergencia

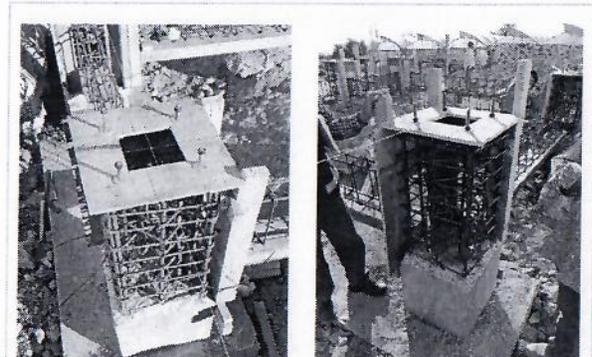


F26: Colocación de anclas en dados de cimentación para soporte de estructura de escalera de emergencia

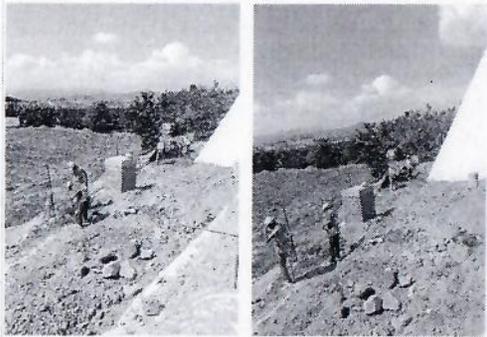


F27: Trazo de terreno para muro de contención de colindancia




F28: Excavación de terreno por medios manuales para muro de contención de colindancia

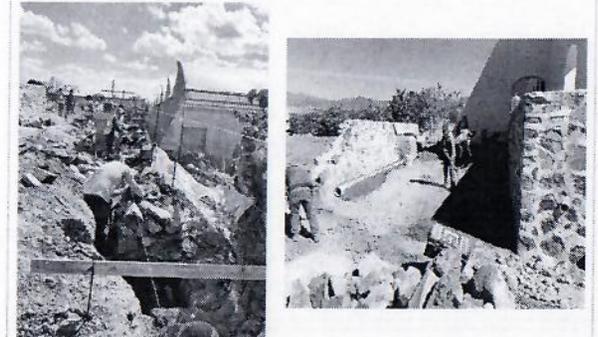


F29: Construcción de muro de contención de colindancia

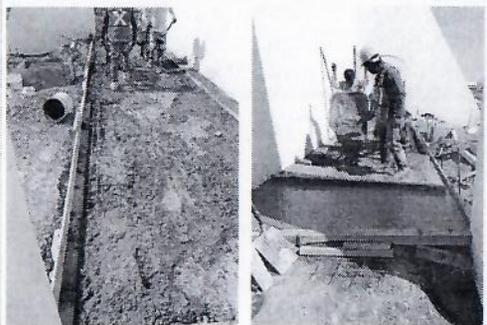

F30: Colado con concreto hecho en obra de andador perimetral

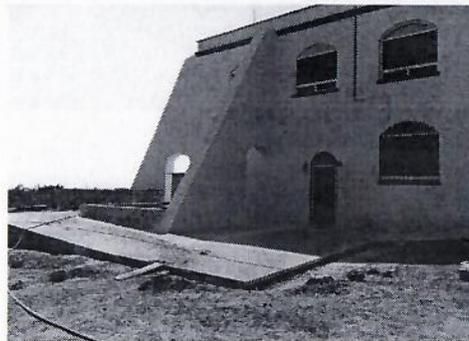


F31: Colado con concreto hecho en obra de andador perimetral

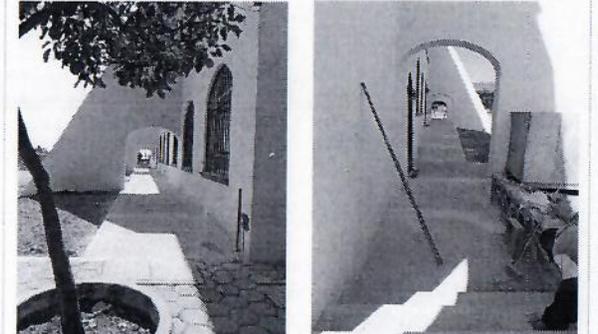


F32: Colado con concreto hecho en obra de andador perimetral




F33: Colocación de rejilla pluvial en puerta de auditorio

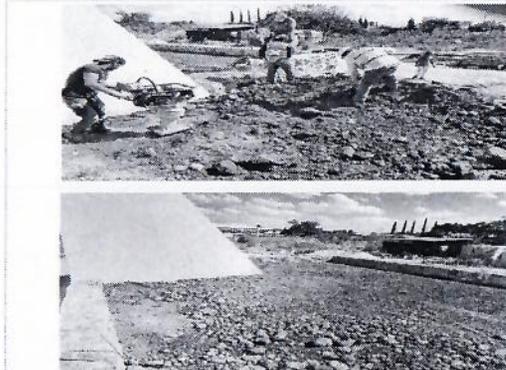


F34: Relleno y compactación por medios mecánicos de material producto de excavación en base de contrafuertes

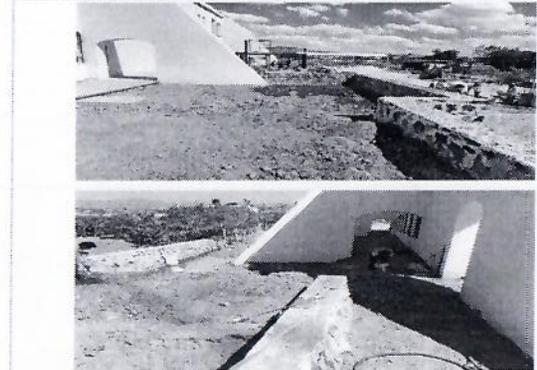


F34: Relleno y compactación por medios mecánicos de material producto de excavación en base de contrafuertes

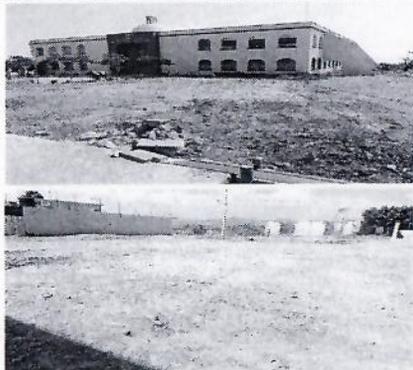


F34: Relleno y compactación por medios mecánicos de material producto de excavación en zanja de instalación de drenaje

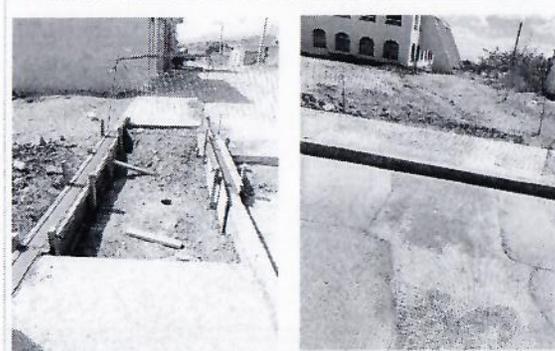


F35: Colado con concreto hecho en obra de guarnición y vialidad por conexión a red de drenaje municipal

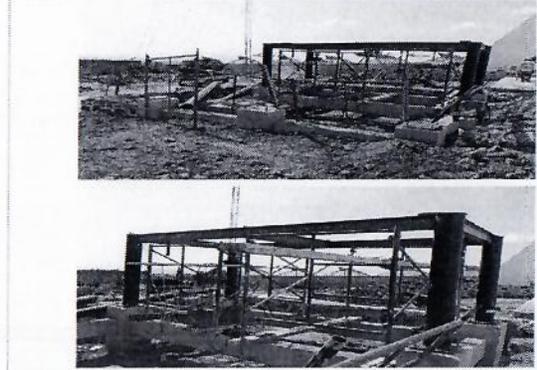


F36: Colocación de estructura metálica para escalera de emergencia

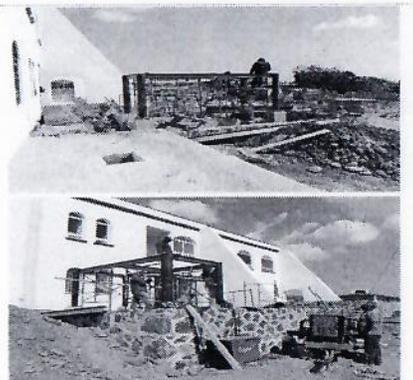


F37: Colocación de estructura metálica para escalera de emergencia

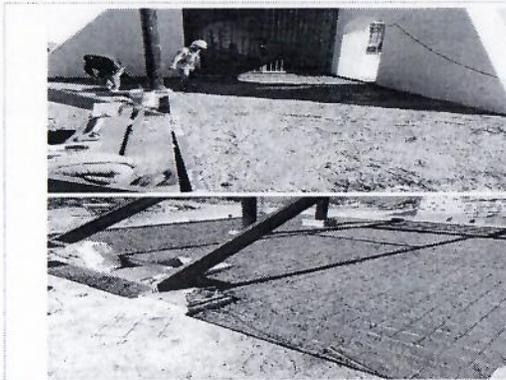


F38: Colado con concreto hecho en obra de vestíbulo de puerta posterior

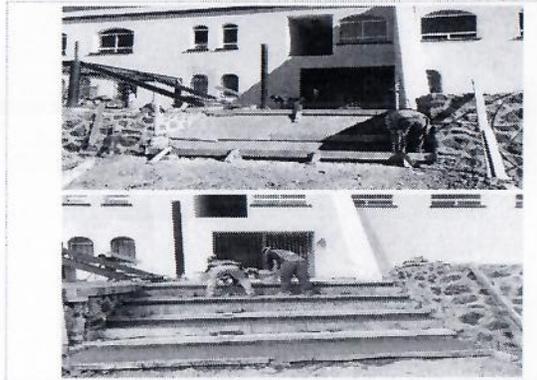


F39: Forjado y colado de escalones de acceso a vestíbulo de puerta posterior

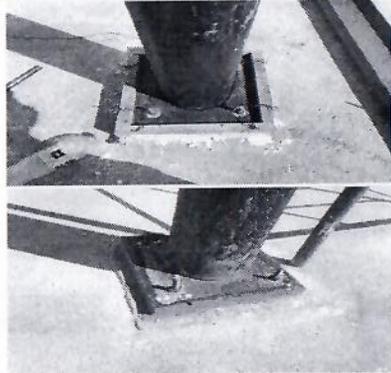


F40: Colado de grout en base de columnas metálicas de escalera de emergencia

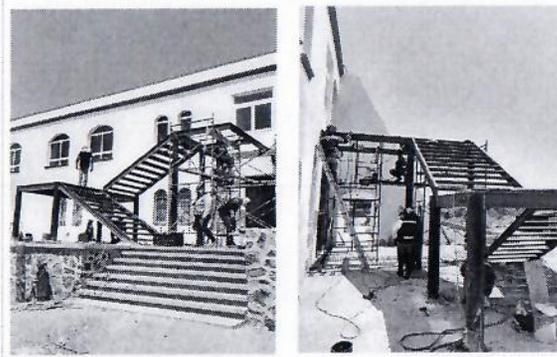


F41: Colocación de estructura metálica para escalera de emergencia

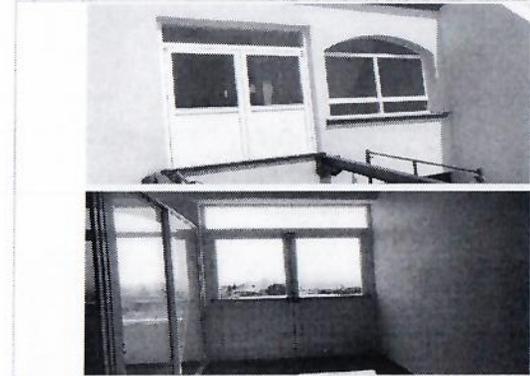


F42: Suministro y colocación de puerta de aluminio blanco con barra antipánico para salida de emergencia

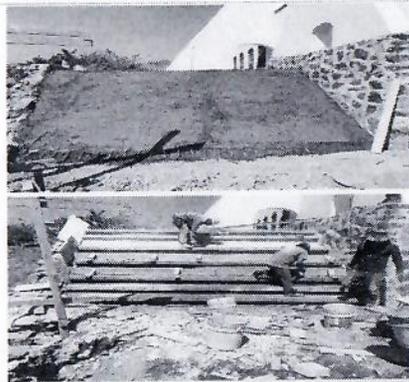


F43: Forjado y colado de escalones de andador poniente

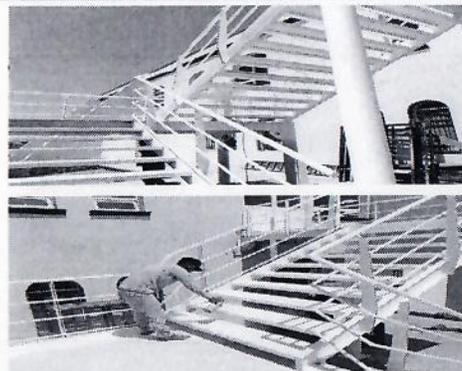


F44: Aplicación de primer y pintura esmalte color blanco en estructura de escalera de emergencia

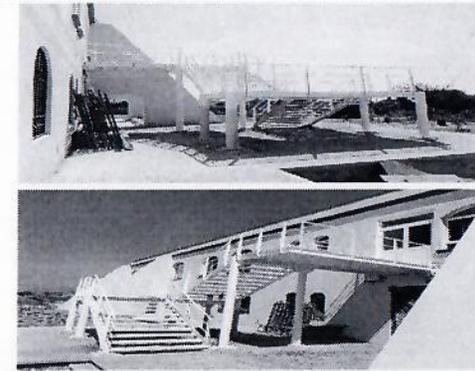

F45: Aplicación de pintura esmalte color blanco en estructura de escalera de emergencia

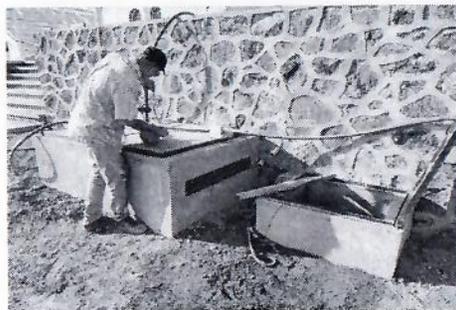

F46: Conexión de bombas existentes a cárcamo seco de cisterna

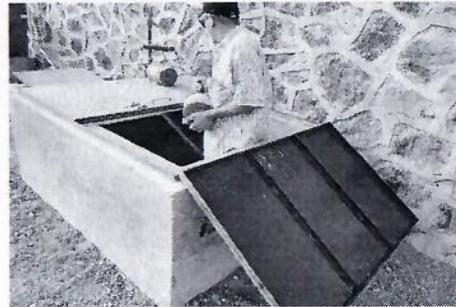

F47: Conexión de bombas existentes a cárcamo seco de cisterna



F48: Conexión de bombas existentes a cárcamo seco de cisterna

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

FOTOS (DESPUES)



F49: Aplicación de pintura vinílica en muros exteriores



F50: Aplicación de pintura vinílica en muros exteriores




F51: Aplicación de pintura vinílica en muros exteriores



F52: Termino de trabajos contratados de obra exterior fachada sur



F53: Termino de trabajos contratados de obra exterior fachada oriente y sur

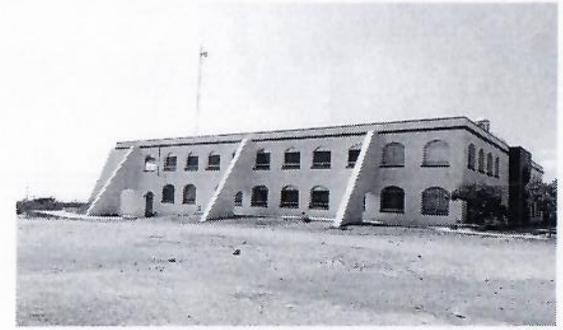

F54: Termino de trabajos contratados de obra exterior fachada oriente

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán  
Rector

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández  
Director General de Infraestructura

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

2019

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
Primer Trimestre 2021  
(Enero-Marzo)  
FECHA DE CORTE: 31/03/2021

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



3 Nombre de la obra: Segunda etapa planta alta para laboratorios en la Escuela de Estudios Superiores de Xalostoc



Porcentaje de avance


100%

CRÓQUIS DE LOCALIZACIÓN

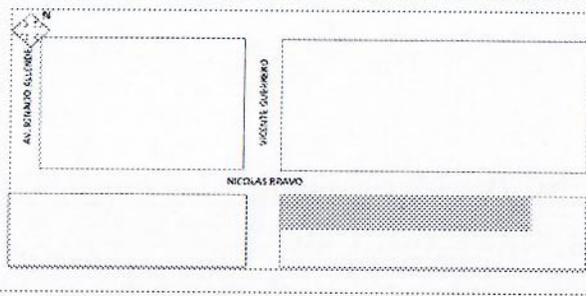


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Av. Nicolas Bravo S/N Parque Industrial  
Cuautla C.P. 62715




F1: Fachada principal




F2: lateral

Comentarios de los trabajos realizados:


Informe que refleja el cierre del proyecto, cumpliéndose así las acciones establecidas en el proyecto original, en cumplimiento a lo anterior se adjuntan las acta de entrega recepción y acta administrativa de finiquito y extinción de derechos y obligaciones del contrato 05-15520-OS-2019. Actualmente en este plantel no se cuenta con trabajos pendientes de ejecutar. Nota aclaratoria: en la estimación finiquito se aplico una deductiva en el concepto de tubería de gas L.P. por un importe de \$ 5,980.15 (cinco mil novecientos ochenta pesos 15/100 M.N.) esta deductiva se ve reflejada como SALDO NO EJERCIDO y esta documentado en la estimación FINIQUITO. En respuesta al oficio 511/2021-0160, inciso 3), relacionado con el remanente por un monto de \$5,980.15 (cinco mil novecientos ochenta pesos 15/100 M.N.) cantidad que será devuelta a la TESOFE.

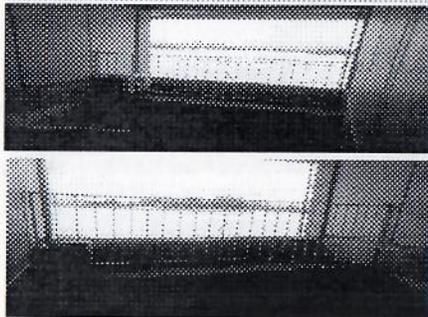

F3: Colocación de protectores de herrera en escaleras

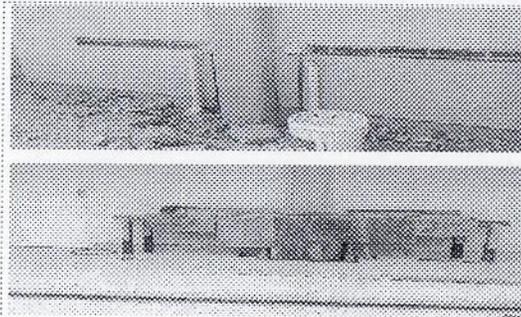


F4: Elaboración de meseta de concreto para módulo sanitario

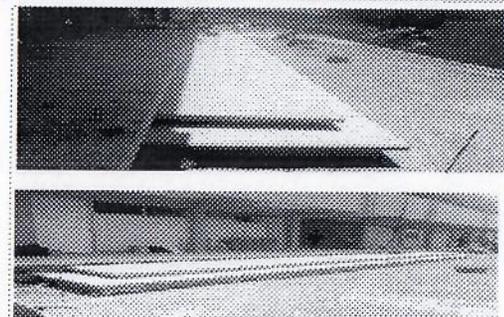

F5: Forjado de estalones de concreto para acceso a edificación




F10. Excavación por medias manuales para colado de guarnición

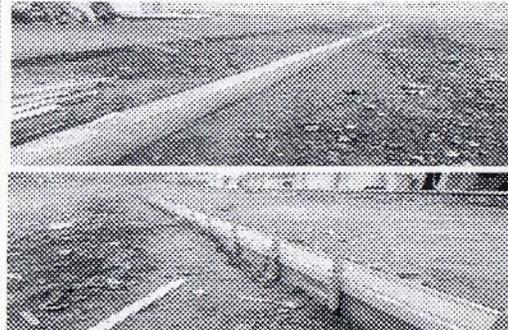



F11. Colado de guarnición de concreto en área de estacionamiento



F12. Colocación de adhesivo en área de estacionamiento




F13. Colocación de adhesivo en área de estacionamiento




F14. Excavación y arreglo por medios mecánicos de material fuerte



F15. Segurarse parte de plataforma de estacionamiento

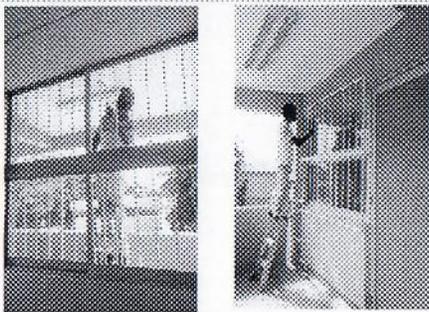


F16. Aplicación de pintura especial en protecciones de herrera

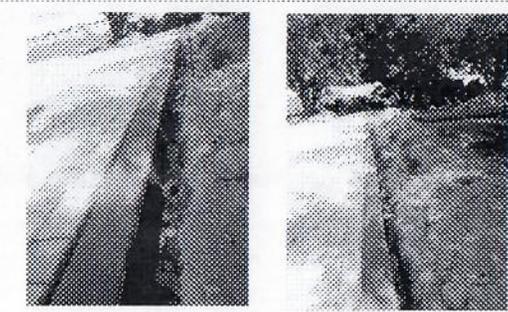


F17. Colado de guarnición de concreto en área de estacionamiento




F18. Colocación de acceso porta en cada laboratorio

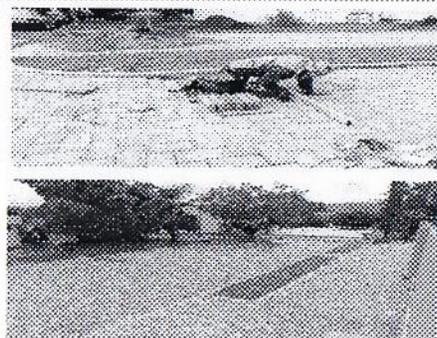


F19: Colocación de adoquero en área de estacionamiento

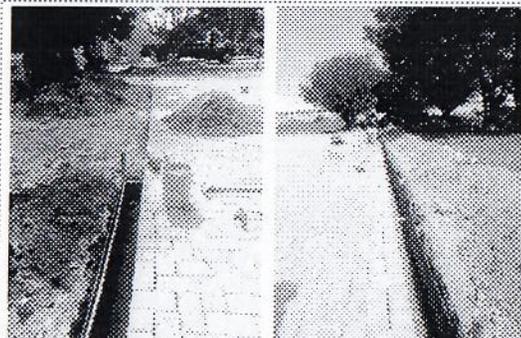


F20: Habilitado de cimbra para guarnición en área de estacionamiento

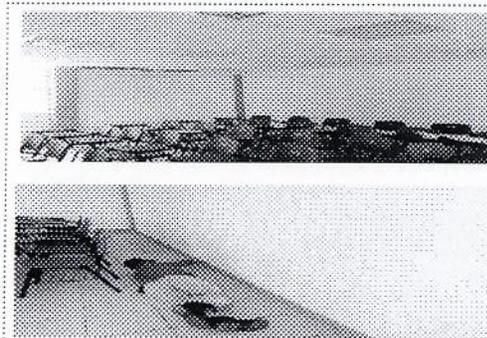


F21

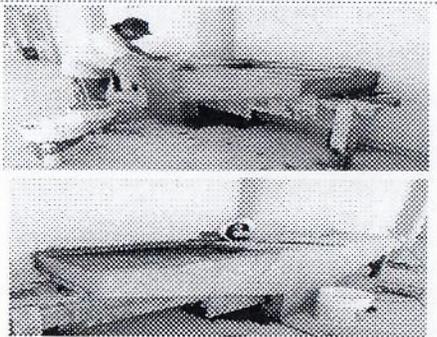

F22: Elaboración de meseta de concreto para módulo sanitario

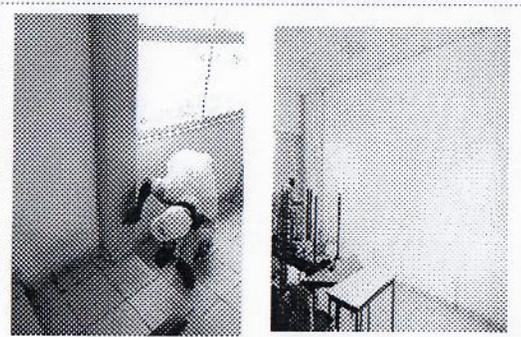

F23: Aplicación de pintura vinílica en interior de planta baja

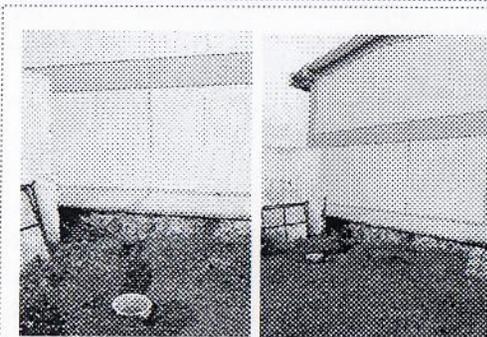

F24: Colocación de tubería de pvc pesada para bajada de pararrayos


### CONSTRUYENDO




F25: Aplicación de pintura epóxica en módulo sanitario




F26: Aplicación de pintura epóxica en módulo sanitario

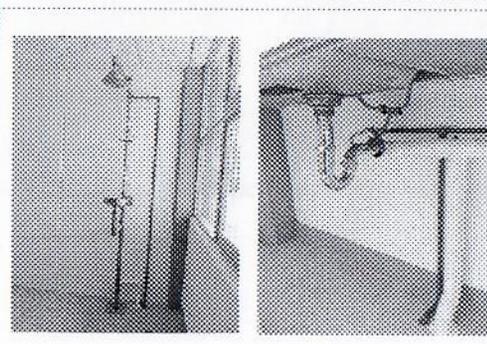



F27: Aplicación de pintura esmalte en tubería ex. cobre de salidas hidráulicas



F28: Colocación de cristal templado en puertas de barras de concreto




F29: Colocación de access paint en cada laboratorio




F30: Colocación de mesas de lavas




F31: Colocación de protecciones de herrería

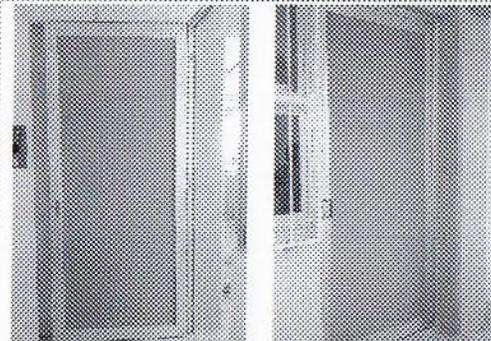


F32: Colocación de puertas de acceso a laboratorios

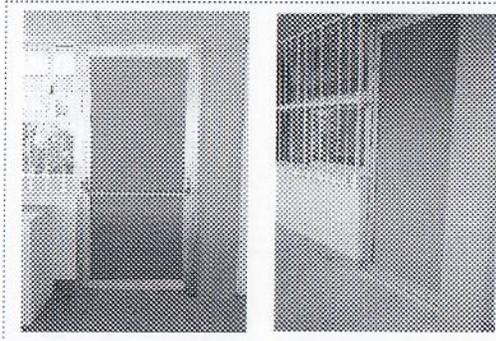


F33: Colocación de puertas de emergencia en laboratorios

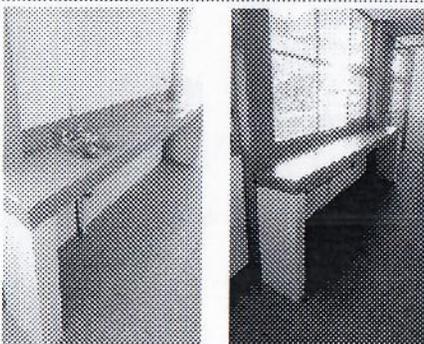


F34: Aplicación de pintura epóxica sobre barras de concreto

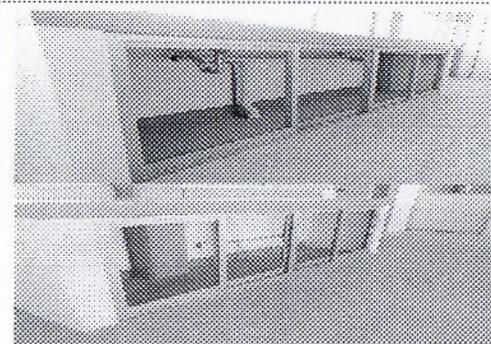


F35: Colocación de marcos de aluminio para puertas en barras de concreto

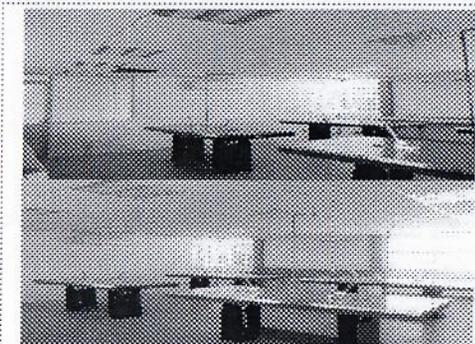


F36: Instalación de gas en mesas de laboratorio

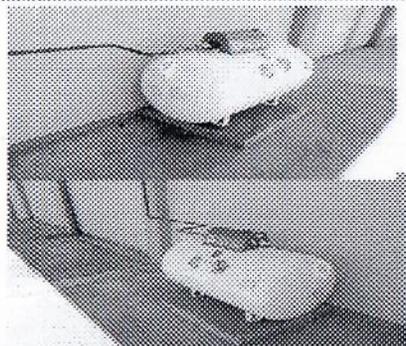


F37: Colocación de tanque estacionario de 200 litros

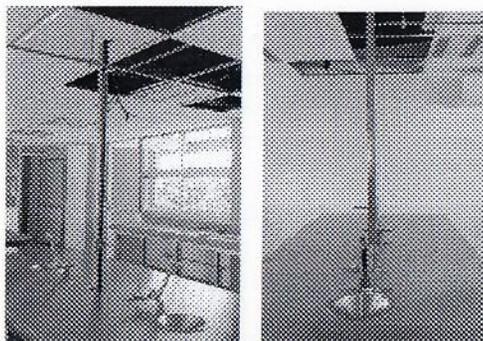


F38: Colocación de un canal para soporte de tubos de gas

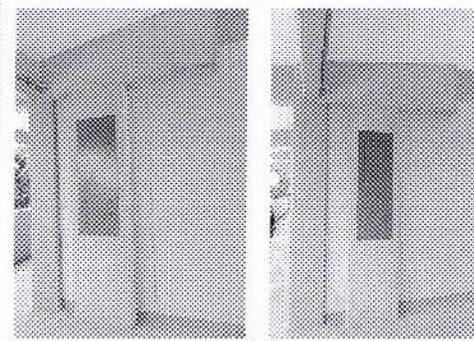


F39: Colocación de caja de muros en tablero principal de planta alta

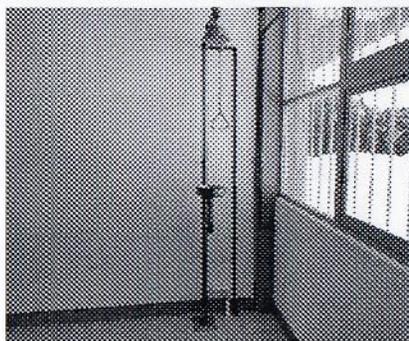


F40: Colocación de regadera de emergencia con lavabos

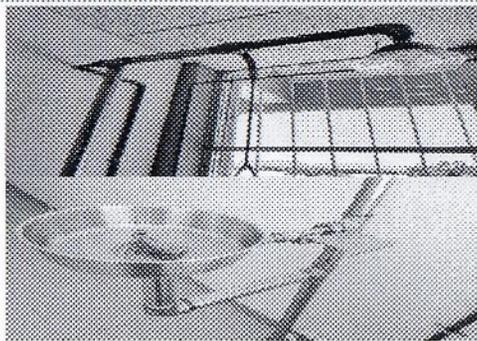


F41: Colocación de regadera de emergencia con lavabos

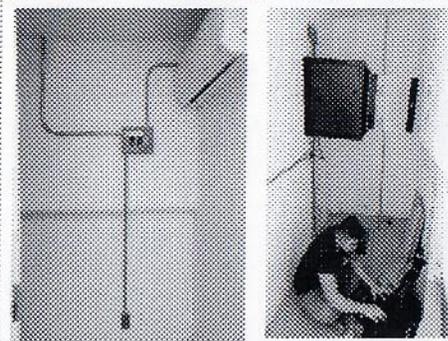

F42: Acabado de Sire




F43: Colocación de topos para puertas interiores y de emergencia

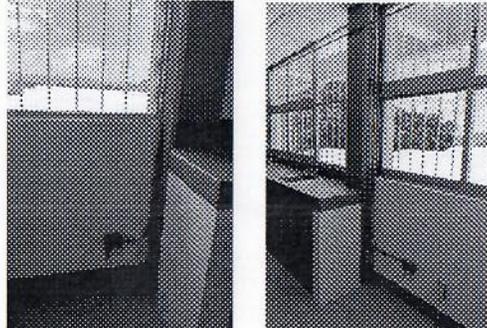


F44: Bases eléctricas para contactos bifásicos



F45: Colocación de arena y los estroboscópica en pasillo de planta alta

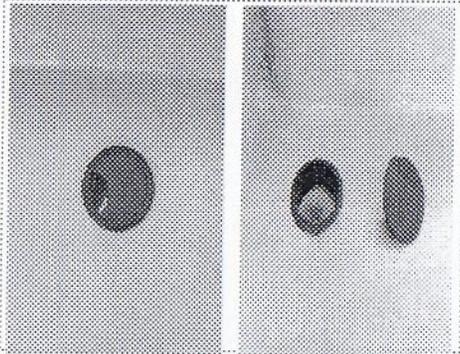

F46: Colocación de pasos en barras de concreto

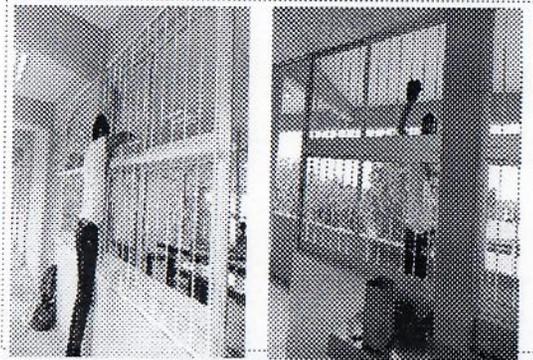

F47: Limpieza fina, en ventanas y herrería

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán  
Rector

Arq. Óscar Gabriel Lastra Fernández  
Director General de Infraestructura

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.
