



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL  
ESTADO DE MORELOS

RECTORÍA

Cuernavaca, Morelos, 11 de febrero de 2021  
R/028/2021

**DR. ISAÍAS ELIZARRARAZ ALCARAZ**  
Director de Fortalecimiento Institucional  
Dirección General de Educación Superior  
Universitaria e Intercultural (DGESUI)  
PRESENTE

En respuesta a su atento correo del día 11 de febrero del actual, relacionado con el documento en **versión PDF debidamente firmado del primero, segundo, tercero y cuarto trimestre** del reporte descriptivo del informe de avance y reporte fotográfico de los proyectos apoyados en el marco del **Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) ejercicio 2020** de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, anexo al presente los reportes descriptivos conforme a lo requerido.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.



*Atentamente*  
*Por una humanidad culta*

**RECTORÍA**   
**DR. GUSTAVO URQUIZA BELTRÁN**  
**RECTOR**

C.c.p. Dra. Carmen E. Rodríguez Armenta. Directora General. DGESUI. Para su conocimiento.  
Dr. Álvaro Zamudio Lara. Coordinador General de Planeación y Administración. UAEM. Para su conocimiento.  
Dr. Pedro Antonio Márquez Aguilar. Director General de Planeación Institucional. UAEM. Mismo Fin  
Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández. Director General de Infraestructura. UAEM. Mismo fin.  
Archivo  
AZL/PAMA/ANPM

Av. Universidad 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca Morelos, México, 62209, 7º Piso, Torre de Rectoría,  
Tel. (777) 329 70 01, 329 70 02, rectoria@uaem.mx



Una universidad de excelencia

RECTORÍA  
2017-2023

Cuernavaca, Morelos, 06 de octubre de 2020.  
DGPI/240/2020.

**DR. ISAÍAS ELIZARRARAZ ALCARAZ**  
**DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL**  
P R E S E N T E

En el marco del **Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)** hago llegar a Usted de manera electrónica los informes de avance de obra e informes descriptivos, correspondientes al tercer trimestre (julio, agosto y septiembre) 2020, conforme a lo siguiente:

- **Informe FAM 2015**, correspondiente al tercer trimestre de 2020 (julio, agosto y septiembre) en formato Excel, así como documentación respectiva.
- **Informe FAM 2016**, correspondiente al tercer trimestre de 2020 (julio, agosto y septiembre) en formato Excel.
- **Reporte descriptivo de avance y reporte fotográfico FAM 2019**, correspondiente al tercer trimestre de 2020 (julio, agosto y septiembre) en formato Excel, así como documentación respectiva.
- **Reporte descriptivo de avance y reporte fotográfico. FAM 2020**, correspondiente al tercer trimestre de 2020 (julio, agosto y septiembre) en formato Excel, así como documentación respectiva.

Finalmente, le comento que los informes han sido enviados en los tiempos establecidos a las cuentas de correo electrónico [isaias.elizarraz@nube.sep.gob.mx](mailto:isaias.elizarraz@nube.sep.gob.mx) , [rocio@nube.sep.gob.mx](mailto:rocio@nube.sep.gob.mx) y [cenrique.sanchez@nube.sep.gob](mailto:cenrique.sanchez@nube.sep.gob), conforme a lo siguiente:

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo cordial.

Atentamente  
*Por una humanidad culta*

**DR. PEDRO ANTONIO MÁRQUEZ AGUILAR**  
**DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL**

C.c.p. Dra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta. - Directora General de Educación Superior Universitaria e Intercultural. Para su conocimiento.

Dr. Alvaro Zamudio Lara. - Coordinador General de Planeación y Administración. Mismo fin.

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán. - Rector. Mismo fin.

Archivo.

PAMA/ANPM/ngpb

Av. Universidad 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca Morelos, México, 62209, Piso 2 Torre de Rectoría Tel. (777) 329 7031  
dgp@uaem.mx



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL  
ESTADO DE MORELOS

Se expide el presente documento firmado electrónicamente de conformidad con el ACUERDO GENERAL PARA LA CONTINUIDAD DEL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA PROVOCADA POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) emitido el 27 de abril del 2020.

El presente documento cuenta con la firma electrónica UAEM del funcionario universitario competente, amparada por un certificado vigente a la fecha de su elaboración y es válido de conformidad con los LINEAMIENTOS EN MATERIA DE FIRMA ELECTRÓNICA PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ESTADO DE MORELOS emitidos el 13 de noviembre del 2019 mediante circular No. 32.

### Sello electrónico

**PEDRO ANTONIO MARQUEZ AGUILAR** | Fecha:2020-10-05 14:54:05 | Firmante

plK+LlYlwJp76aSFtWda/D40CTvMAAyG0SNUq3g5Lc9nnv78O9hyX/RsEfzQf3hdgGLdKO8s2TDUve1INac2ZZI1SWa+Yn9anqJtOsM/xU0LTfY2dgoYbz9J5g4n5cxUf8Mdzck6B  
CvtRG0nvzGJMcyj4xQ3tvXzon4nRKnTLYWMJeT4wLNyb3THCezQ+DRAb1yhleyGv6eW2jeMkAJrWEKE6daMaSiCIM7YjbA1fiZqTN3GTx4qJ3GQiUjMlpJeSf0zLKSraZkeDG3d6  
R7d06jU/ZSCo6NKNSY4II1OvNc3QfFotmoN4T0HqszcRUNMsyjjRWeNXn/i2uXQo4vg==

Puede verificar la autenticidad del documento en la siguiente dirección electrónica o  
escaneando el código QR ingresando la siguiente clave:



[lfcrbZ](#)

<https://efirma.uaem.mx/noRepudio/tgTA76nYI2UJ16h3oYSN9sieQOJkMSh6>



2020



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Tercer trimestre 2020
(Julio-Septiembre)
FECHA DE CORTE: 30/09/2020

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: Universidad Autónoma del Estado de Morelos
Entidad federativa: Morelos
Clave Inst 911: 17M6L0017P



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS
Escudo de la universidad

Nombre: Alberto Zamudio Lara
Cargo: Coordinador General de Planeación y Administración
Teléfono: (777) 5 29 70 00 Ext. 7035 y 4312
Correo electrónico: alamu@uaem.mx

Planeación

RESPONSABLES

Nombre: Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Cargo: Director General de Infraestructura
Teléfono: (777) 5 29 70 00 Ext. 3136
Correo electrónico: oscar.lastra@uaem.mx

Obras y Mantenimiento

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Table with columns: Prioridad, Nombre del proyecto, Tipo de proyecto, Monto autorizado, Monto ejercido, Remanente, Alcance del proyecto, Acciones que sustentan el avance, Acciones por realizar, % de avance, Fechas, Observaciones, ¿Es susceptible de ser inaugurada?, ¿Cuánta con fotos del evento?, ¿Quién y cuándo inauguró?, Entrega-Recpción (Acta finiquito), Acta Administrativa de Entrega-Recepción, Monto de Acta Administrativa.

Signature of Dr. Gustavo Urquiza Beltrán, Rector

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector

Signature of Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández, Director General de Infraestructura

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

1 Se capturan los espacios más característicos de la obra o proyecto. Se podrán anexionar tantas fotos como sea necesario.
2 En esta sección se detallará de forma breve y concisa los hitos a realizar, mismos que se van reflejados en el reporte fotográfico.
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

2020

AÑO

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**3er Trimestre**  
**(Jul-Sep)**  
FECHA DE CORTE: 30/09/2020

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIOREDAD

1

Nombre de la obra:

**Construcción de la segunda etapa para los Talleres de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (etapa final).**




UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Escuela de la universidad

Porcentaje de avance

**0.00%**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

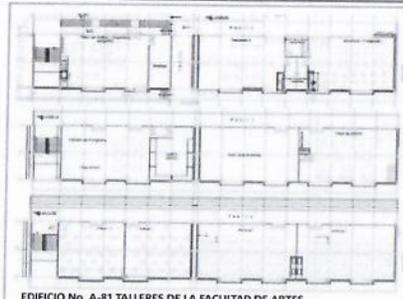

PLANTA BAJA

PRIMER NIVEL

SEGUNDO NIVEL

EDIFICIO No. A-81 TALLERES DE LA FACULTAD DE ARTES

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa,  
Cuernavaca, Mor. C.P.62209. Cuernavaca  
Morelos.

FOTOS (ANTES)



F1: Fachada Principal



F2: Fachada Lateral



Comentarios de los trabajos realizados:

De acuerdo al oficio SE/0275/2020 signado por el Lic. Luis Arturo Cornejo Alatorre Secretario de Educación del Estado de Morelos y dirigido al Lic. José Alejandro Villareal Gaxos, Secretario de Hacienda, en el cual se solicita alentarmento ministrar los recursos o la institución conforme al anexo 1 "propuesta para ministración de recursos FAM 2020", conforme al oficio R/195/2020. Una vez aprobada la propuesta, la institución recibió las ministraciones conforme a lo siguiente: 4 de agosto del presente recibieron los recursos correspondientes a los meses de mayo y junio por un monto de \$12,892,084.50 (doce millones ochocientos noventa y dos mil ochenta y cuatro pesos 50/100 M.N.), el 25 de agosto de 2020 se recibió la ministración correspondiente al mes de julio por un monto de \$2,148,680.75 (dos millones ciento cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta pesos 75/100 M.N.), el 29 de agosto del presente recibió la ministración correspondiente al mes de agosto por un monto de \$2,148,680.75 (dos millones ciento cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta pesos 75/100 M.N.), el 29 de septiembre del presente recibió la ministración correspondiente al mes de septiembre por un monto de \$2,148,680.75 (dos millones ciento cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta pesos 75/100 M.N.). En este mismo sentido, mediante oficio INEIED/404/2020 se entregó de manera física tres ejemplares en original del Convenio de Colaboración y Ejecución del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraestructura Física Educativa de Nivel Superior 2020 y el programa de ejecución de obras debidamente firmados por el Titular del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM) con la finalidad de recibir la firma del rector. Mediante oficio CGPYA/334/2020 signado por el Dr. Alvaro Zamudio Lara Coordinador General de Planeación y Administración se hace entrega al Lic. José Evaristo Silva Bandala Director General del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM) un ejemplar en original debidamente firmado y rubricado del Convenio de Colaboración y Ejecución del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraestructura Física Educativa de Nivel Superior 2020 y su programa de ejecución de obras, celebrado Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM) y la Institución.

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán  
Rector

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández  
Director General de Infraestructura

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2020

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
3er Trimestre  
(Jul-Sep)  
FECHA DE CORTE: 30/09/2020

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD

2

Nombre de la obra:

Equipamiento de Espacios Académicos del campus Norte (Centro de Investigación en Ciencias)





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Estado de la universidad

Porcentaje de avance

0.00%

CRÓQUIS DE LOCALIZACIÓN

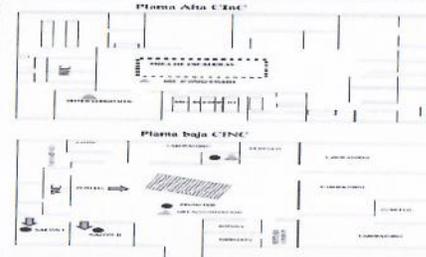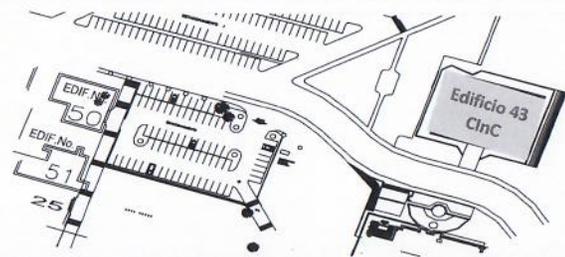


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Avenida Universidad #1001, Col. Chamilpa, Código Postal 62209, Cuernavaca, Morelos.

FOTOS (ANTES)



F1: Fachada Principal

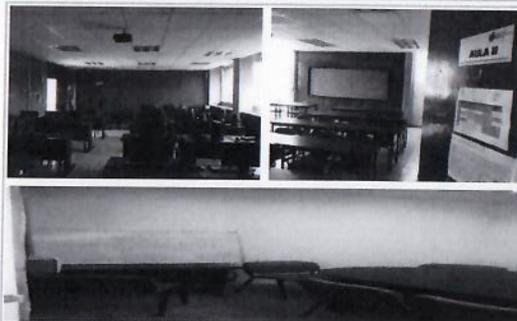

F2: Los cañones serán colocados en Sistemas digitales, Aula II Y Salon de Seminarios



F3: Los sistemas de aire acondicionado serán colocados en Sistemas Digitales y Salon de seminarios.



F4: Los pupitres serán colocados en Aula I y Aula II

Comentarios de los trabajos realizados:

De acuerdo al Mius SE/0275/2020 signado por el Lic. Luis Arturo Corona Alatorre Secretario de Educación del Estado de Morelos y dirigido al L.C. José Alejandro Villareal Gacón Secretario de Hacienda, en el cual se solicita alientemente minimizar los recursos a la institución, conforme al anexo 1 "propuesta para minimización de recursos FAM 2020", conforme al oficio RH/65/2020. Una vez aprobada la propuesta, la institución recibió las ministraciones conforme a lo siguiente: 4 de agosto del presente recibieron los recursos correspondientes a las meses de mayo y junio, por un monto de \$12,822,084.50 (doce millones ochocientos noventa y dos mil ochenta y cuatro pesos 50/100 M.N.), el 25 de agosto de 2020 se recibió la ministración correspondiente al mes de julio por un monto de \$2,148,660.75 (dos millones ciento cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta pesos 75/100 M.N.), el 29 de agosto del presente recibió la ministración correspondiente al mes de agosto por un monto de \$2,148,660.75 (dos millones ciento cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta pesos 75/100 M.N.). En este mismo sentido, mediante oficio INE/EM/MD/PA/404/2020 se entregan de manera física tres tercios en original del Convenio de Colaboración y Ejecución del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraestructura Física Educativa de Nivel Superior 2020 y el programa de ejecución de obras, debidamente firmados por el Titular del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM) con la finalidad de recibir la firma del rector.

Mediante oficio OGP/A/204/2020 signado por el Dr. Avaro Zamudio Lara Coordinador General de Planeación y Administración se hace entrega al Lic. José Everisto Silva Benítez Director General del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM) un expediente en original debidamente firmado y rubricado del Convenio de Colaboración y Ejecución del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraestructura Física Educativa de Nivel Superior 2020 y su programa de ejecución de obras.

Mediante oficio DGP/238/2020 dirigido al Dr. Itzáias Elkamranz Alcaraz, Director de Fortalecimiento Institucional de la DCE/IS, se adjunta copia simple en versión electrónica y en PDF del Convenio de Colaboración y Ejecución del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraestructura Física Educativa de Nivel Superior 2020 y su programa de ejecución de obras, celebrado Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM) y la Institución.



F5: Fachada Lateral

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán  
Rector

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández  
Director General de Infraestructura

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2020

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
3er Trimestre  
(Jul-Sep)  
FECHA DE CORTE: 30/09/2020

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Estado de la universidad

Porcentaje de avance


0.00%

PRORIDAD 2

Nombre de la obra

Equipamiento de Espacios Académicos del campus Norte (Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas)

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

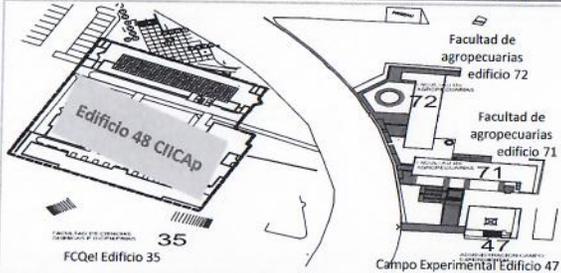

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Avenida Universidad #1001, Col. Chamilpa, Código Postal 62209, Cuernavaca, Morelos.


FOTOS (ANTES)



F1: Fachada Principal



F2: Se colocaran sillas y equipo de aire acondicionado en Aula 4 y Aula 5

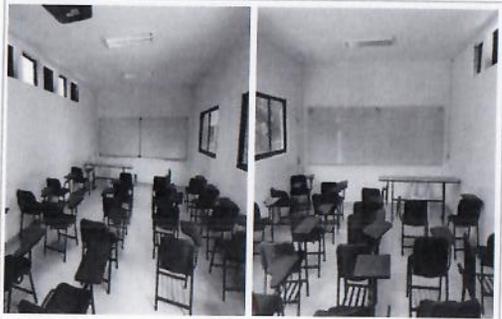

F3: Se colocará equipo de aire acondicionado en Aula 9 y Aula 10



F4: Se colocará equipo de aire acondicionado en Laboratorio TIC Aula Magna

Comentarios de los trabajos realizados:

De acuerdo al oficio SE/0275/2020 signado por el Lic. Luis Arturo Carrero Alatorre Secretario de Educación del Estado de Morelos y dirigido al Lic. José Alejandro Villalón Gaxca Secretario de Hacienda en el cual se solicita formalmente manifieste los recursos a la institución conforme al anexo 1 "propuesta para ministración de recursos FAM 2020" conforme al oficio R/16/05/2020. Una vez recibidos los recursos la institución recibió las ministraciones conforme a lo siguiente: 4 de agosto del presente recibieron los recursos correspondientes a los meses de mayo y junio por un monto de \$12 692 084.50 (doce millones ochocientos noventa y dos mil ochenta y cuatro pesos 50/100 M.N.); el 25 de agosto de 2020 se recibió la ministración correspondiente al mes de julio por un monto de \$2 148 690.75 (dos millones seiscientos ochenta y ocho mil seiscientos ochenta pesos 75/100 M.N.); el 29 de agosto del presente recibió la ministración correspondiente al mes de agosto por un monto de \$2 148 690.75 (dos millones seiscientos ochenta y ocho mil seiscientos ochenta pesos 75/100 M.N.); el 29 de septiembre del presente recibió la ministración correspondiente al mes de septiembre por un monto de \$2 148 690.75 (dos millones seiscientos ochenta y ocho mil seiscientos ochenta pesos 75/100 M.N.). En este mismo sentido, mediante oficio INEEM/CDV/A/404/2020 se entregó de manera física tres ejemplares en original del Convenio de Colaboración y Ejecución del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraestructura Física Educativa de Nivel Superior Morelos (INEIEM) con la finalidad de recabar la firma del rector.

Mediante oficio CGP/A/034/2020 signado por el Dr. Alvaro Zamudio Lara Coordinador General de Planeación y Administración se hace entrega al Lic. José Evaristo Siles Bandala Director General del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM) un ejemplar en original debidamente firmado y rubricado del Convenio de Colaboración y Ejecución del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraestructura Física Educativa de Nivel Superior 2020 y su programa de ejecución de obras, celebrado Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM) y la institución.

Mediante oficio DGP/0239/2020 dirigido al Dr. Itzel Elzamaraz Alvaraz, Director de Fortalecimiento Institucional de la DGESU, se adjunta copia simple en versión electrónica y en PDF del Convenio de Colaboración y Ejecución del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraestructura Física Educativa de Nivel Superior 2020 y su programa de ejecución de obras, celebrado Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM) y la institución.



F5: Fachada Lateral

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán  
Rector

Araceli Oscar Gabriel Lastra Fernández  
Director General de Infraestructura

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2020

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
3er Trimestre  
(Jul-Sep)

FECHA DE CORTE: 30/09/2020

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD 2

Nombre de la obra **Equipamiento de Espacios Académicos del campus Norte (Centro de Investigaciones Químicas)**





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Escuela de la universidad

Porcentaje de avance

0.00%

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

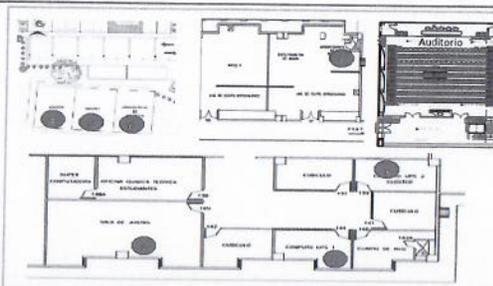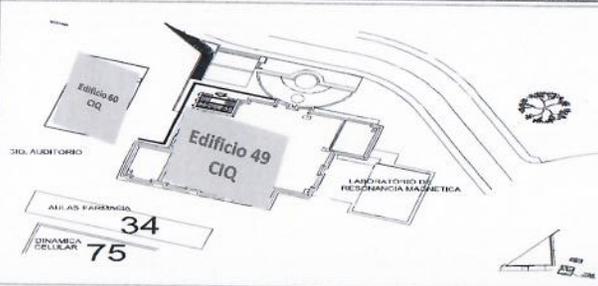


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Avenida Universidad #1001, Col. Chamilpa, Código Postal 62209, Cuernavaca, Morelos.

FOTOS (ANTES)



F1: Fachada Principal

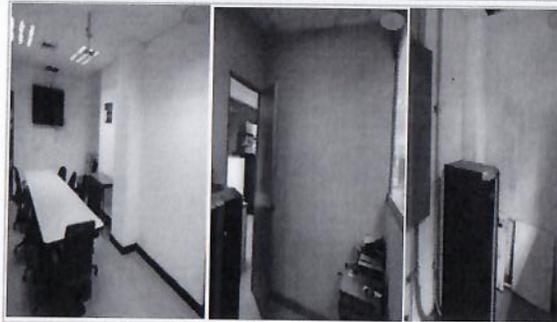


F2: Se colocará aire acondicionado en Sala de juntas, Cluser y Cuarto de cómputo UPS 1

Comentarios de los trabajos realizados:

De acuerdo al oficio SE02752020 signado por el Lic. Luis Arturo Cornejo Abizaco Secretario de Educación del Estado de Morelos y dirigido al L.C. José Alejandro Villarreal Gaxoa, Secretario de Hacienda, en el cual se solicita adelantamiento ministerial los recursos a la institución conforme al anexo 1 "propuesta para ministración de recursos FAM 2020", conforme al oficio R/165/2020. Una vez aprobada la propuesta, la institución recibió las ministraciones conforme a lo siguiente: 4 de agosto del presente recibieron los recursos correspondientes a los meses de mayo y junio por un monto de \$12,180,094.50 (doce millones ochocientos noventa y dos mil ochenta y cuatro pesos, 50/100 M.N.), el 25 de agosto de 2020 se recibió la ministración correspondiente al mes de julio por un monto de \$2,148,880.75 (dos millones ochocientos ochenta y ocho mil seiscientos ochenta y ocho pesos, 75/100 M.N.), el 29 de agosto de 2020 se recibió la ministración correspondiente al mes de agosto por un monto de \$2,148,880.75 (dos millones ochocientos ochenta y ocho mil seiscientos ochenta y ocho pesos, 75/100 M.N.). En este mismo sentido, mediante oficio R/165/2020 se entregó de manera física tres ejemplares en original del Convenio de Colaboración y Ejecución del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraestructura Física Educativa de Nivel Superior 2020 y el programa de ejecución de obras debidamente firmados por el Titular del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (IEIEM) con la finalidad de recabar la firma del rector. Mediante oficio CGPA/034/2020 signado por el Dr. Alvaro Zamudio Lara Coordinador General de Planeación y Administración se hizo entrega al Lic. José Evaristo Silva Blandón Director General del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (IEIEM) un ejemplar en original debidamente firmado y rubricado del Convenio de Colaboración y Ejecución del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraestructura Física Educativa de Nivel Superior 2020 y su programa de ejecución de obras, celebrado Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (IEIEM) y la Institución.



F3: Se colocará proyector en Auditorio.

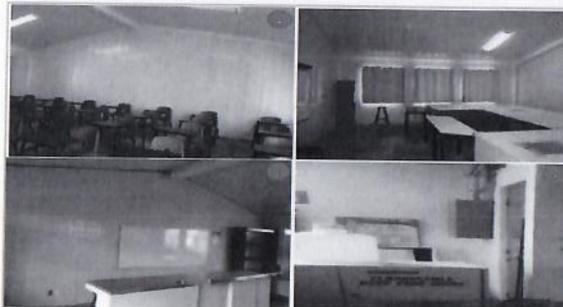

F4: Se colocará aire acondicionado en Salón 6, Salón 5, Laboratorio de docencia #2 y Laboratorio de gases.



F5: Fachada Lateral

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán  
Rector

Arq. Óscar Gabriel Lastra Fernández  
Director General de Infraestructura

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2020

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
3er Trimestre  
(Jul-Sep)  
FECHA DE CORTE: 30/09/2020

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD 2 Nombre de la obra



Equipamiento de Espacios Académicos del campus Norte (Facultad de Ciencias Agropecuarias)



Escudo de la universidad

Porcentaje de avance

0.00%

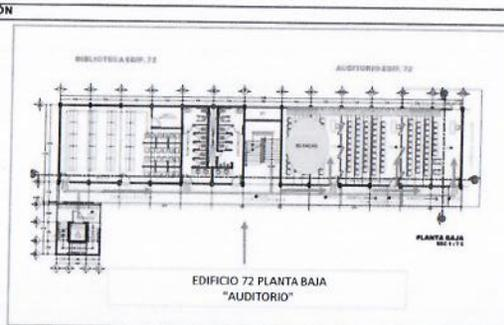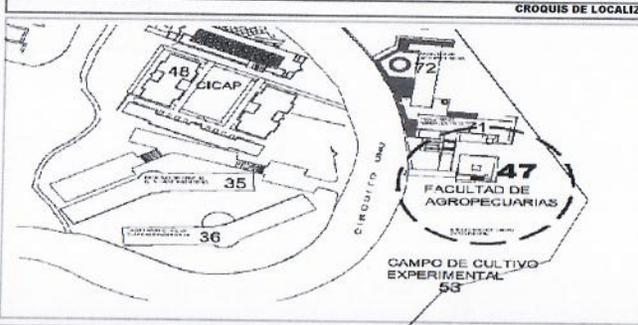


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Avenida Universidad #1001, Col. Chamila,  
Código Postal 62209, Cuernavaca, Morelos.

FOTOS (ANTES)




F1: Fachada Principal (Edificio 72)

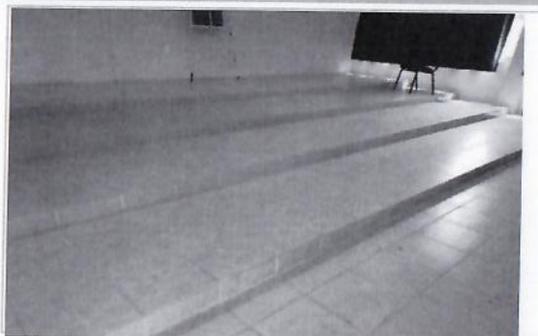

F2: Se colocarán butacas en el Auditorio (edificio 72)

Comentarios de los trabajos realizados:

De acuerdo al oficio SE/0275/2020 signado por el Lic. Luis Arturo Comejo Alatorre Secretario de Educación del Estado de Morelos y dirigido al L.C. José Alejandro Villareal Gazca, Secretario de Hacienda, en el cual se solicita atentamente ministra los recursos a la institución conforme al anexo 1 "propuesta para ministración de recursos FAM 2020", conforme al oficio R/195/2020. Una vez aprobada la propuesta, la institución recibió las ministraciones conforme a lo siguiente: 4 de agosto del presente recibieron los recursos correspondientes a los meses de mayo y junio por un monto de \$12,892,084.50 (doce millones ochocientos noventa y dos mil ochenta y cuatro pesos 50/100 M.N.), el 25 de agosto de 2020 se recibió la ministración correspondiente al mes de julio por un monto de \$2,148,680.75 (dos millones ciento cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta pesos 75/100 M.N.), el 29 de agosto del presente recibió la ministración correspondiente al mes de agosto por un monto de \$2,148,680.75 (dos millones ciento cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta pesos 75/100 M.N.), el 29 de septiembre del presente recibió la ministración correspondiente al mes de septiembre por un monto de \$2,148,680.75 (dos millones ciento cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta pesos 75/100 M.N.). En este mismo sentido, mediante oficio INEIE/MDV/LA/404/2020 se entregan de manera física tres ejemplares en original del Convenio de Colaboración y Ejecución del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraestructura Física Educativa de Nivel Superior 2020 y el programa de ejecución de obras debidamente firmados por el Titular del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM) con la finalidad de recabar la firma del rector. Mediante oficio CDP/ya/334/2020 signado por el Dr. Alvaro Zamudio Lara Coordinador General de Planeación y Administración se hace entrega al Lic. José Evaristo Silva Bandala Director General del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM) un ejemplar en original debidamente firmado y rubricado del Convenio de Colaboración y Ejecución del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraestructura Física Educativa de Nivel Superior 2020 y su programa de ejecución de obras. Mediante oficio DGPI/238/2020 dirigido al Dr. Isaias Elizarraraz Alcaraz, Director de Fortalecimiento Institucional de la DGESEU, se adjunta copia simple en versión electrónica y en PDF del Convenio de Colaboración y Ejecución del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraestructura Física Educativa de Nivel Superior 2020 y su programa de ejecución de obras, celebrado Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM) y la Institución.

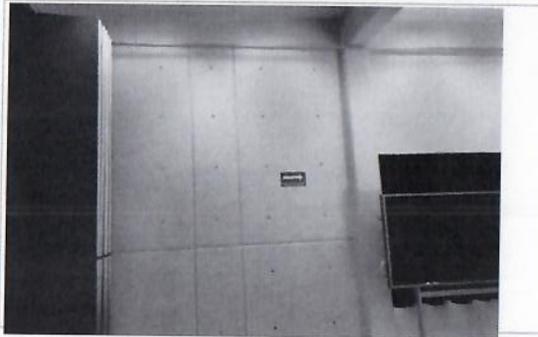

F3: Se colocará sistema de aire acondicionado en Auditorio (Edificio 72)



F4: Se colocará sistema de aire acondicionado (Edificio 72)



F5: Fachada Lateral (Edificio 72)

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán  
Rector

Arq. Óscar Gabriel Lasso Fernández  
Director General de Infraestructura

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2020

AÑO

# FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**3er Trimestre**  
(Jul-Sep)  
FECHA DE CORTE: 30/09/2020

### REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Escudo de la Universidad  
Porcentaje de avance

## 0.00%



PRECEDENCIA

2

Nombre de la obra

### Equipamiento de Espacios Académicos del campus Norte (Facultad de Ciencias del Deporte)

#### CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

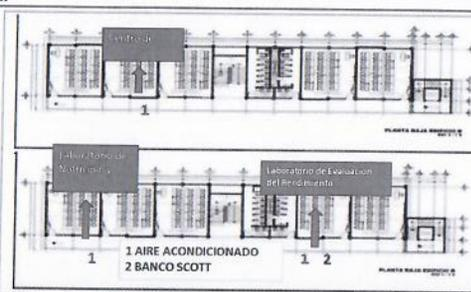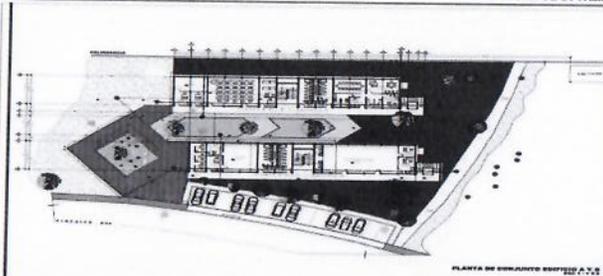

#### UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Avenida Universidad #1001, Col. Chamilpa,  
Código Postal 62209, Cuernavaca, Morelos.

#### FOTOS (ANTES)



F1: Fachada Principal



F2: El aire acondicionado será colocado en el Laboratorio de Evaluación y Rendimiento.

#### Comentarios de los trabajos realizados:

De acuerdo al oficio SE/0275/2020 signado por el Lic. Luis Arturo Cornejo Alatorre Secretario de Educación del Estado de Morelos y dirigido al Lic. José Alajalovo Villareal Casca, Secretario de Hacienda, en el cual se solicita oportunamente ministrar los recursos a la institución, conforme al anexo 1 propuesta para ministración de recursos FAM 2020, conlleva al oficio 06/652/2020. Una vez aprobada la propuesta, la institución recibió las ministraciones conforme a lo siguiente: 4 de agosto del presente se recibieron los recursos correspondientes a las meses de mayo y junio por un monto de \$12,892,084.50 (doce millones ochocientos noventa y dos mil ochocientos ochenta y cuatro pesos 50/100 M.N.), el 20 de agosto de 2020 se recibe la ministración correspondiente al mes de julio por un monto de \$2,148,680.75 (dos millones ciento cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta pesos 75/100 M.N.), el 29 de agosto del presente se recibió la ministración correspondiente al mes de agosto por un monto de \$2,148,680.75 (dos millones ciento cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta pesos 75/100 M.N.), el 29 de septiembre del presente se recibió la ministración correspondiente al mes de septiembre por un monto de \$2,148,680.75 (dos millones ciento cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta pesos 75/100 M.N.). En este mismo sentido, mediante oficio INEEM/DV/AL/484/2020 se entregan de manera física tres tercios en original del Convenio de Colaboración y Ejecución del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraestructura Física Educativa de Nivel Superior 2020 y el programa de ejecución de obras, debidamente firmados por el Titular del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM) con la finalidad de reabrir la firma del texto. Mediante oficio 02/PV/234/2020 signado por el Dr. Alvaro Zamudio Lara Coordinador General de Planeación y Administración se hace entrega al Lic. José Evaristo Silva Bandala Director General del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM) un ejemplar en original debidamente firmado y rubricado del Convenio de Colaboración y Ejecución del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraestructura Física Educativa de Nivel Superior 2020 y su programa de ejecución de obras, celebrado Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM) y la Institución.

Mediante oficio DGFI/238/2020 dirigido al Dr. Isaias Elizagereaz Alcaraz, Director de Fortalecimiento Institucional de la DGE/SU, se adjunta copia impresa en versión electrónica en PDF, del Convenio de Colaboración y Ejecución del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraestructura Física Educativa de Nivel Superior 2020 y su programa de ejecución de obras, celebrado Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM) y la Institución.



F3: El aire acondicionado será colocado en el Laboratorio de nutrición y terapia física y en el Centro de cómputo.



F4: Los Banco Scott se colocarán en el laboratorio de Evaluación y Rendimiento.



F5: Fachada lateral

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán  
Rector

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández  
Director General de Infraestructura

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2020

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

3er Trimestre  
(Jul-Sep)

FECHA DE CORTE: 30/09/2020

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL


PRIORIDAD

2

Nombre de la obra:

Equipamiento de Espacios Académicos del campus Norte (Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería)

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

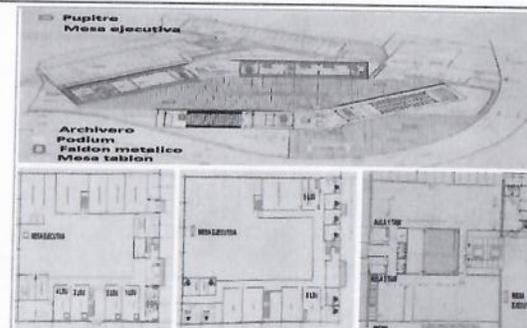

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Avenida Universidad #1001, Col. Chamilpa,  
Código Postal 62209, Cuernavaca, Morelos.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Escudo de la universidad


Porcentaje de avance

0.00%

FOTOS (ANTES)



F1: Fachada Principal

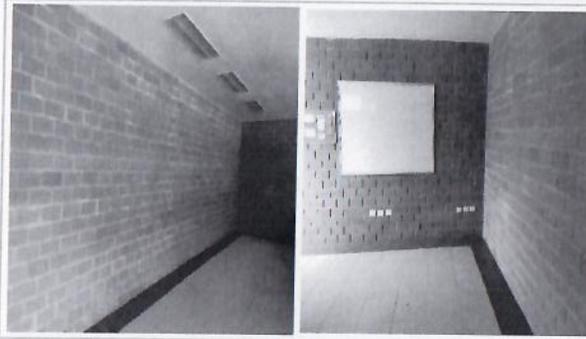


F2: Se equipará Salones 9 y 10 con Pupitre

**Comentarios de los trabajos realizados:**  
De acuerdo al oficio SE/0275/2020 signado por el Lic. Luis Arturo Cornejo Alatorre Secretario de Educación del Estado de Morelos y dirigido al Lic. José Abajero Villareal Gaxca, Secretario de Hacienda, en el cual se solicita atentamente ministrar los recursos a la institución conforme al anexo 1 "propuesta para ministración de recursos FAM 2020", conforme al oficio R/165/2020. Una vez aprobada la propuesta, la institución recibió las ministraciones conforme a lo siguiente: 4 de agosto del presente se recibieron los recursos correspondientes a los meses de mayo y junio por un monto de \$12,892,084.50 (doce millones ochocientos noventa y dos mil ochenta y cuatro pesos 50/100 M.N.), el 25 de agosto de 2020 se recibió la ministración correspondiente al mes de julio por un monto de \$2,148,680.75 (dos millones ciento cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta pesos 75/100 M.N.), el 29 de agosto del presente recibió la ministración correspondiente al mes de agosto por un monto de \$2,148,680.75 (dos millones ciento cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta pesos 75/100 M.N.), el 29 de septiembre del presente recibió la ministración correspondiente al mes de septiembre por un monto de \$2,148,680.75 (dos millones ciento cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta pesos 75/100 M.N.). En este mismo sentido, mediante oficio INEIEIM/DI-VPL/404/2020 se entregan de manera física tres ejemplares en original del Convenio de Colaboración y Ejecución del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraestructura Física Educativa de Nivel Superior 2020 y el programa de ejecución de obras debidamente firmados por el Titular del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM) con la finalidad de recabar la firma del rector. Mediante oficio DGP/IA/334/2020 signado por el Dr. Alvaro Zamudio Lara Coordinador General de Planeación y Administración se hace entrega al Lic. José Evaristo Silva Bandilla Director General del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM) un ejemplar en original debidamente firmado y rubricado del Convenio de Colaboración y Ejecución del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraestructura Física Educativa de Nivel Superior 2020 y su programa de ejecución de obras, colorado Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM) y la Institución.



F5: Se equipará Auditorio con Mesa Faldon

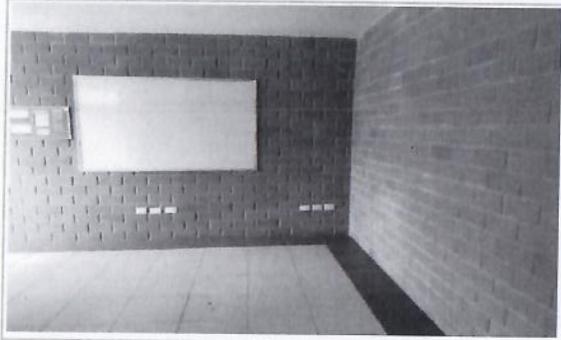

F3: Se equipará Salones ( 1-6 LOU 1-2 TAMULBA 9 al 14 (EDIF 35 ) con Mesa Ejecutiva




F4: Se equipará Area de archivo de control escolar, 5 jefaturas de PE con Archivero

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



F6: Se Equipará patio frontal de Unidad Académica con Mesa Tablon.

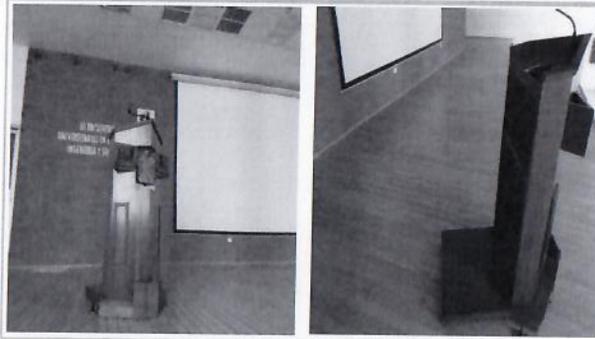

F7: Se equipara Auditorio con Podium.

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán  
Rector

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández  
Director General de Infraestructura

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2020

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA


Mes reportado  
3er Trimestre  
(Jul-Sep)  
FECHA DE CORTE: 30/09/2020

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRORIDAD 2

Nombre de la obra: Equipamiento de Espacios Académicos del campus Norte (Facultad de Psicología)

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

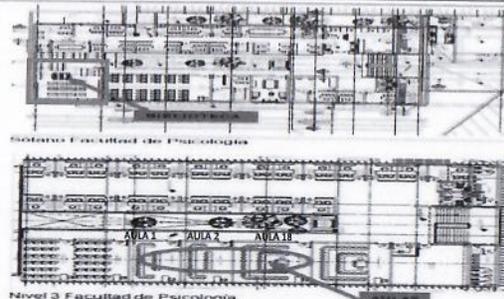

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO


Avenida Universidad #1001, Col. Chamilpa,  
Código Postal 62209, Cuernavaca, Morelos.



Porcentaje de avance

0.00%

FOTOS (ANTES)

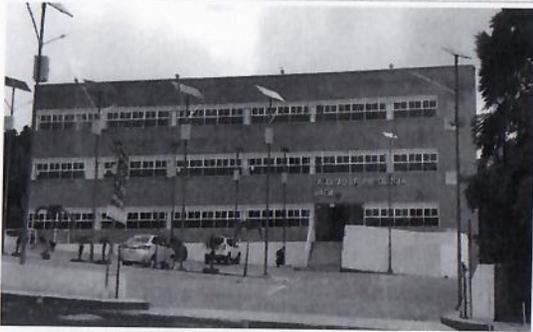

F1: Fachada Principal



F2: Biblioteca Facultad de Psicología- Estante anaquel

Comentarios de los trabajos realizados:

De acuerdo al oficio BE/0275/2020 signado por el Lic. Luis Arturo Cornejo Alatorre Secretario de Educación del Estado de Morelos y dirigido al L.C. José Alejandro Villareal Gatica, Secretario de Hacienda, en el cual se solicita atentamente ministrar los recursos a la institución conforme al anexo 1 "propuesta para ministración de recursos FAM 2020", conforme al oficio RI/165/2020. Una vez aprobada la propuesta, la institución recibió las ministraciones conforme a lo siguiente: 4 de agosto del presente recibieron los recursos correspondientes a los meses de mayo y junio por un monto de \$12,852,084.50 (doce millones ochocientos noventa y dos mil ochenta y cuatro pesos 50/100 M.N.), el 25 de agosto de 2020 se recibió la ministración correspondiente al mes de julio por un monto de \$2,148,680.75 (dos millones ciento cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta pesos 75/100 M.N.), el 29 de agosto del presente recibió la ministración correspondiente al mes de agosto por un monto de \$2,148,680.75 (dos millones ciento cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta pesos 75/100 M.N.), el 29 de agosto del presente recibió la ministración correspondiente al mes de agosto por un monto de \$2,148,680.75 (dos millones ciento cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta pesos 75/100 M.N.). En este mismo sentido, mediante oficio INEIE/MDV/AL/404/2020 se entregan de manera física tres tantos en original del Convenio de Colaboración y Ejecución del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraestructura Física Educativa de Nivel Superior 2020 y el programa de ejecución de obras, debidamente firmados por el Titular del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM) con la finalidad de recibir la firma del reactor.

Mediante oficio CGPY/334/2020 signado por el Dr. Alvaro Zamudio Lara Coordinador General de Planeación y Administración se hace entrega al Lic. José Evaristo Silva Bandala Director General del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM) un ejemplar en original debidamente firmado y rubricado del Convenio de Colaboración y Ejecución del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraestructura Física Educativa de Nivel Superior 2020 y su programa de ejecución de obras.


Mediante oficio DGPV/238/2020 dirigido al Dr. Isaias Elzarraraz Alcaraz, Director de Fortalecimiento Institucional de la DGE/SUI, se adjunta copia simple - en versión electrónica y en PDF - del Convenio de Colaboración y Ejecución del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraestructura Física Educativa de Nivel Superior 2020 y su programa de ejecución de obras, celebrado Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM) y la Institución.



F3: Biblioteca Facultad de Psicología- Mesa ejecutiva




F4:Aula 1 Maestría en Psicología-Proyector de tiro largo

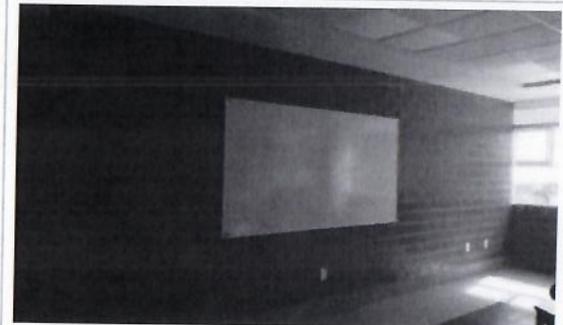

F5:Aula 3 Maestría en Psicología- Pantalla interactiva electrónica

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

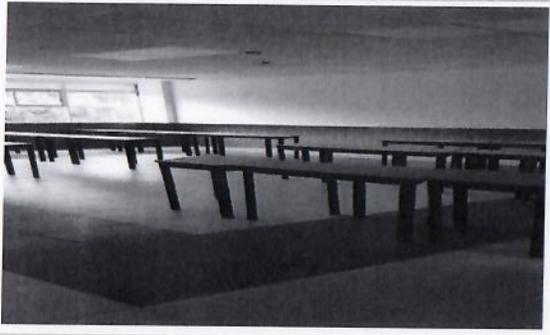

F6:Aula 18 Licenciatura en Psicología-Silla

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán  
Rector

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández  
Director General de Infraestructura

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2020

AÑO

# FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**3er Trimestre**  
**(Jul-Sep)**  
FECHA DE CORTE: 30/09/2020

### REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PROYECTO

2

Nombre de la obra:

**Equipamiento de Espacios Académicos del campus Norte (Facultad de Diseño)**

#### CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



#### UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Avenida Universidad #1001, Col. Chamilpa,  
Código Postal 62209, Cuernavaca, Morelos.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Escudo de la universidad


Porcentaje de avance

## 0.00%

#### FOTOS (ANTES)



F1: Fachada Principal

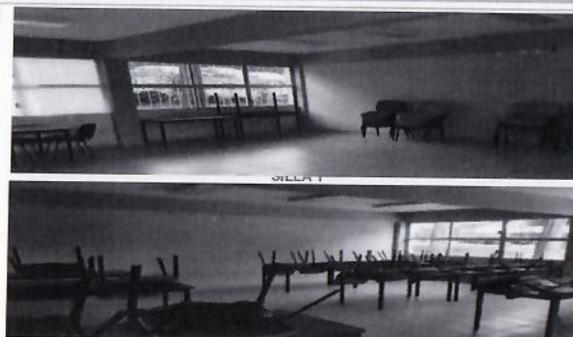


F2: Se adquirirán sillas para el salón 1 y 2.

#### Comentarios de los trabajos realizados:

De acuerdo al oficio SE/0275/2020 signado por el Lic. Luis Arturo Cornejo Alatorre Secretario de Educación del Estado de Morelos y dirigido al L.C. José Alejandro Villareal Gazca, Secretario de Hacienda, en el cual se solicita atentamente ministrar los recursos a la institución conforme al anexo 1 "propuesta para ministración de recursos FAM 2020", conforme al oficio R/165/2020. Una vez aprobada la propuesta, la institución recibió las ministraciones conforme a lo siguiente: 4 de agosto del presente recibieron los recursos correspondientes a los meses de mayo y junio por un monto de \$12,892,084.50 (doce millones ochocientos noventa y dos mil ochenta y cuatro pesos 50/100 M.N.), el 25 de agosto de 2020 se recibió la ministración correspondiente al mes de julio por un monto de \$2,148,680.75 (dos millones ciento cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta pesos 75/100 M.N.), el 29 de agosto del presente recibió la ministración correspondiente al mes de agosto por un monto de \$2,148,680.75 (dos millones ciento cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta pesos 75/100 M.N.), el 29 de septiembre del presente recibió la ministración correspondiente al mes de septiembre por un monto de \$2,148,680.75 (dos millones ciento cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta pesos 75/100 M.N.). En este mismo sentido, mediante oficio INEIEM/DV/AL/404/2020 se entregan de manera física tres tantos en original del Convenio de Colaboración y Ejecución del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraestructura Educativa de Nivel Superior 2020 y el programa de ejecución de obras, debidamente firmados por el Titular del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM) con la finalidad de recabar la firma del rector. Mediante oficio CGPyA/334/2020 signado por el Dr. Alvaro Zamudio Lara Coordinador General de Planeación y Administración se hace entrega al Lic. José Evanisto Silva Bandala Director General del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM) un ejemplar en original debidamente firmado y rubricado del Convenio de Colaboración y Ejecución del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraestructura Física Educativa de Nivel Superior 2020 y su programa de ejecución de obras.


Mediante oficio DGP/1238/2020 dirigido al Dr. Isaías Elizarraraz Alcaraz, Director de Fortalecimiento Institucional de la DGESU, se adjunta copia simple en versión electrónica y en PDF del Convenio de Colaboración y Ejecución del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraestructura Física Educativa de Nivel Superior 2020 y su programa de ejecución de obras, celebrado Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM) y la Institución.

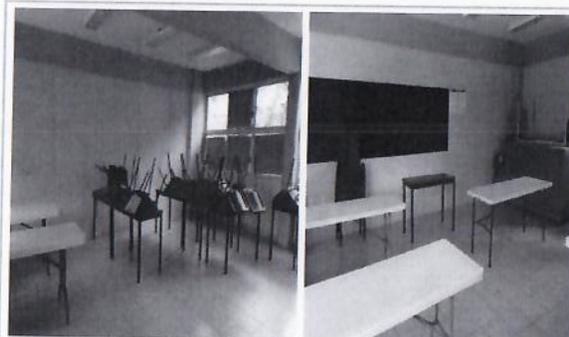

F3: Se adquirirán sillas para el salón 3 y 4.




F4: Se adquirirán mesas para el salón 1 y 2.

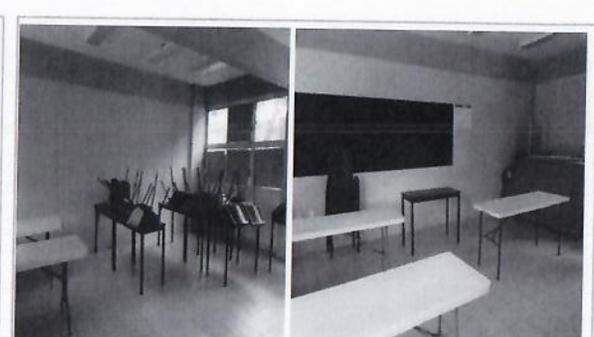


F5: Se adquirirán mesas para el salón 3 y 4.


REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

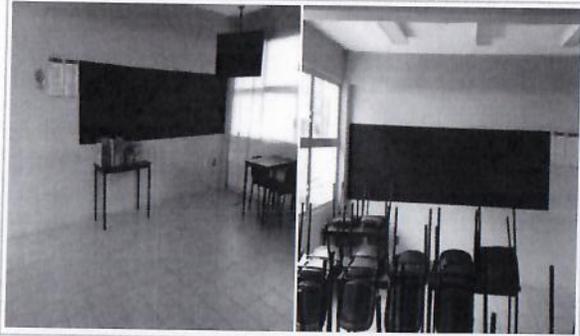


F6: Se adquirirá pizarrón blanco para salón 1 y 2.

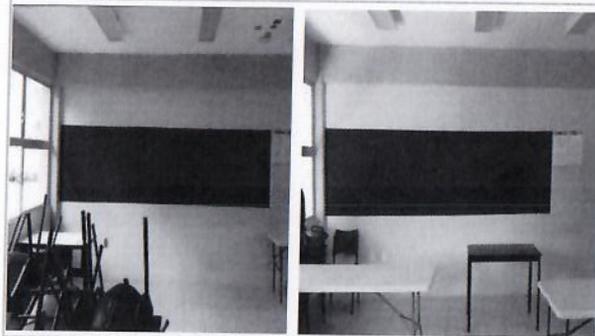


F7: Se adquirirá pizarrón blanco para salón 3 y 4.

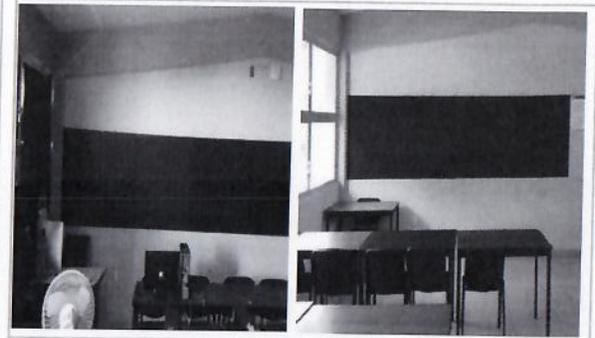

F8: Se adquirirá pizarrón blanco para salón 5 y 6.

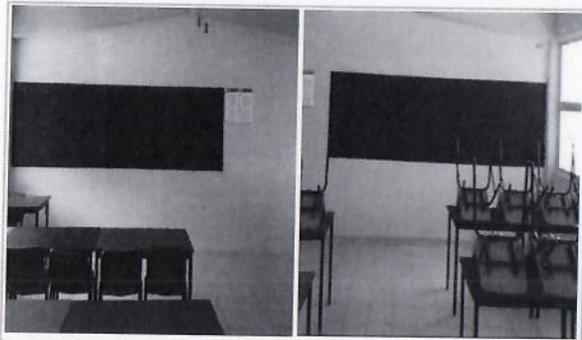

F9: Se adquirirá pizarrón blanco para salón 7 y 8.

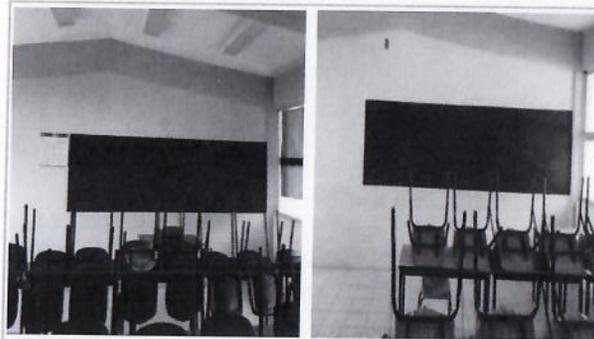

F10: Se adquirirá pizarrón blanco para salón 9 y 10.

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán  
Rector

Arq. Óscar Gabriel Lastra Fernández  
Director General de Infraestructura

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2020

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
3er Trimestre  
(Jul-Sep)  
FECHA DE CORTE: 30/09/2020

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



PRORIDAD 2 Nombre de la obra: Equipamiento de Espacios Académicos del campus Norte (Biblioteca Central Universitaria)



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

0.00%

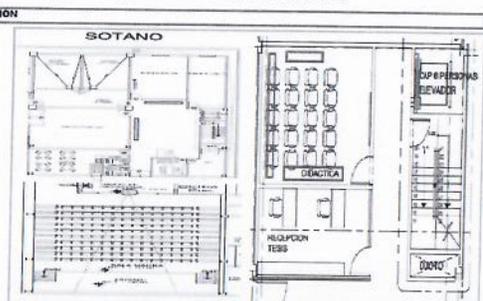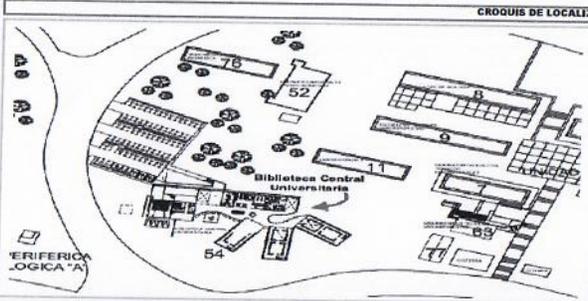


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO  
Edificio No. 54 asignado a la Biblioteca Central Universitaria (BCU)  
Avenida Universidad #1001, Col. Chamilpa, Código Postal 62209, Cuernavaca, Morelos.

FOTOS (ANTES)



F1: Fachada Principal

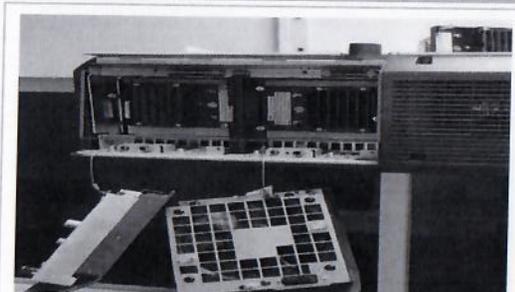

F2: Se quipara proyector NEC NP-PX760U con lámparas .



F3: Instalación de estantería en el sótano del Edificio de la BCU



F4: Instalación de estantería en la sala didáctica del Edificio de la BCU

**Comentarios de los trabajos realizados:**  
De acuerdo al oficio SE-0275/2020 signado por el Lic. Luis Arturo Cornejo Alatorre Secretario de Educación del Estado de Morelos y dirigido al Lic. José Alejandro Villanar García, Secretario de Hacienda, en el cual se solicita atentamente ministrar los recursos a la institución conforme al anexo 1 'propuesta para ministración de recursos FAM 2020', conforme al oficio R/165/2020.  
Una vez aprobada la propuesta, la institución recibió las ministraciones conforme a lo siguiente: 4 de agosto del presente recibieron los recursos correspondientes a los meses de mayo y junio por un monto de \$12,892,004.50 (doce millones ochocientos noventa y dos mil ochenta y cuatro pesos 50/100 M.N.), el 25 de agosto de 2020 se recibió la ministración correspondiente al mes de julio por un monto de \$2,148,680.75 (dos millones ciento cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta pesos 75/100 M.N.), el 29 de agosto del presente recibió la ministración correspondiente al mes de agosto por un monto de \$2,148,680.75 (dos millones ciento cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta pesos 75/100 M.N.), el 29 de septiembre del presente recibió la ministración correspondiente al mes de septiembre por un monto de \$2,148,680.75 (dos millones ciento cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta pesos 75/100 M.N.).  
En este mismo sentido, mediante oficio INEIE/M/DyA/404/2020 se entregan de manera física tres tantos en original del Convenio de Colaboración y Ejecución del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraestructura Física Educativa de Nivel Superior 2020 y el programa de ejecución de obras, debidamente firmados por el Titular del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM) con la finalidad de recabar la firma del rector.  
Mediante oficio DGP/A/334/2020 signado por el Dr. Alvaro Zamudio Lara Coordinador General de Planeación y Administración se hace entrega al Lic. José Everardo Silva Bernaldo Director General del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM) un ejemplar en original debidamente firmado y rubricado del Convenio de Colaboración y Ejecución del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraestructura Física Educativa de Nivel Superior 2020 y su programa de ejecución de obras.  
Mediante oficio DGP/238/2020 dirigido al Dr. Isaias Elizarráz Alcaraz, Director de Fortalecimiento Institucional de la DGEBSU, se adjunta copia simple en versión electrónica y en PDF del Convenio de Colaboración y Ejecución del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraestructura Física Educativa de Nivel Superior 2020 y su programa de ejecución de obras, celebrado Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM) y la Institución.

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán  
Rector

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández  
Director General de Infraestructura

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2020

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
3er Trimestre  
(Jul-Sep)  
FECHA DE CORTE: 30/09/2020

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRECEDENCIA

2

Nombre de la obra:

Equipamiento de Espacios Académicos del campus Norte (Centro de Investigación Transdisciplinar en Psicología)




UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Estado de la universidad

Porcentaje de avance

0.00%

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

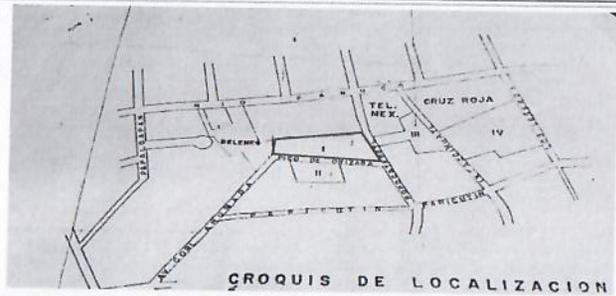

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Calle Pico de Orizaba Número 1, Colonia Volcanes, Cuernavaca, Morelos. Código Postal 62350

FOTOS (ANTES)



F1: Fachada Principal



F2: Fachada lateral

Comentarios de los trabajos realizados:

De acuerdo al oficio SE/0275/2020 signado por el Lic. Luis Arturo Cornejo Alatorre Secretario de Educación del Estado de Morelos y dirigido al L.C. José Alejandro Villareal Garza, Secretario de Hacienda, en el cual se solicita atentamente manifestar los recursos a la institución conforme al anexo 1 "Propuesta para ministración de recursos FAM 2020", conforme al oficio R/165/2020.

Una vez aprobada la propuesta, la institución recibió las ministraciones conforme a lo siguiente: 4 de agosto del presente recibieron los recursos correspondientes a los meses de mayo y junio por un monto de \$12,802,084.50 (doce millones ochocientos noventa y dos mil ochenta y cuatro pesos 50/100 M.N.), el 25 de agosto de 2020 se recibió la ministración correspondiente al mes de julio por un monto de \$2,148,680.75 (dos millones ciento cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta pesos 75/100 M.N.), el 29 de agosto del presente recibió la ministración correspondiente al mes de agosto por un monto de \$2,148,680.75 (dos millones ciento cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta pesos 75/100 M.N.), el 29 de septiembre del presente recibió la ministración correspondiente al mes de julio por un monto de \$2,148,680.75 (dos millones ciento cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta pesos 75/100 M.N.).


En este mismo sentido, mediante oficio INEIE/MDV/AL/404/2020 se entregan de manera física tres tantos en original del Convenio de Colaboración y Ejecución del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraestructura Física Educativa de Nivel Superior 2020 y el programa de ejecución de obras debidamente firmados por el Titular del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM) con la finalidad de recabar la firma del rector.

Mediante oficio CGPyA/334/2020 signado por el Dr. Alvaro Zamudio Lara Coordinador General de Planeación y Administración se hace entrega al Lic. José Evaristo Silva Bernaldo Director General del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM) un ejemplar en original debidamente firmado y rubricado del Convenio de Colaboración y Ejecución del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraestructura Física Educativa de Nivel Superior 2020 y su programa de ejecución de obras.

Mediante oficio DOP/238/2020 dirigido al Dr. Ismael Elcarranza Alcaraz, Director de Fortalecimiento Institucional de la DGESEU, se adjunta copia simple en versión electrónica y en PDF del Convenio de Colaboración y Ejecución del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraestructura Física Educativa de Nivel Superior 2020 y su programa de ejecución de obras, celebrado Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM) y la Institución.



F3: Se equipará Aula 1 con Pizarrón de cristal.

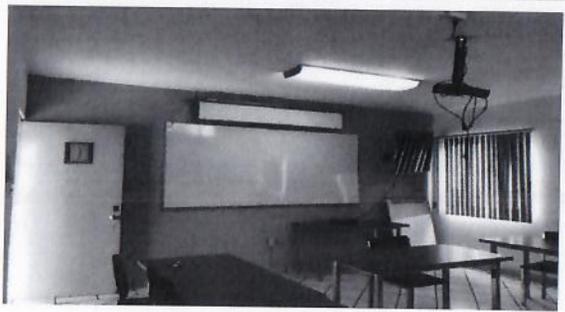

F4: Se equipará Aula 2 con Pizarrón de cristal.



F5: Se equipará Aula 5 con Sillas ISO

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán  
Rector

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández  
Director General de Infraestructura

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2020

AÑO

# FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**3er Trimestre**  
**(Jul-Sep)**


FECHA DE CORTE: 30/09/2020

### REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD **3**

Nombre de la obra: **Equipamiento de Espacios Académicos del campus Norte (Escuela de Estudios Superiores de Atlatlahuacan)**

#### CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

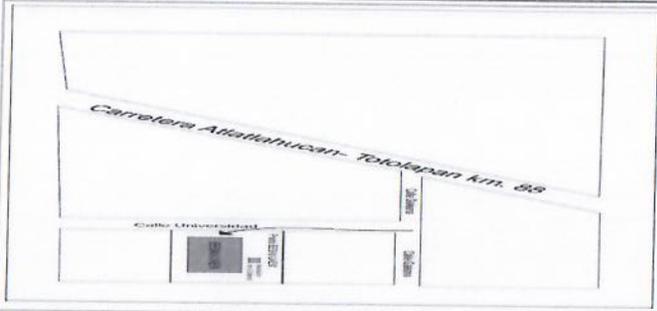

#### UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Calle Universidad S/N Barrio San Antonio  
Atlatlahuacan, Morelos C.P. 62840



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Escudo de la universidad

Porcentaje de avance

# 0.00%

#### FOTOS (ANTES)



F1: Fachada Principal



F2: Fachada lateral


#### Comentarios de los trabajos realizados:

De acuerdo al oficio SE/0275/2020 signado por el Lic. Luis Arturo Cornejo Alatorre Secretario de Educación del Estado de Morelos y dirigido al L.C. José Alejandro Villareal Gazca, Secretario de Hacienda, en el cual se solicita atentamente ministrar los recursos a la institución conforme al anexo 1 "propuesta para ministración de recursos FAM 2020", conforme al oficio R/165/2020. Una vez aprobada la propuesta, la institución recibió las ministraciones conforme a lo siguiente: 4 de agosto del presente recibieron los recursos correspondientes a los meses de mayo y junio por un monto de \$12,892,084.50 (doce millones ochocientos noventa y dos mil ochenta y cuatro pesos 50/100 M.N.), el 25 de agosto de 2020 se recibió la ministración correspondiente al mes de julio por un monto de \$2,148,680.75 (dos millones ciento cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta pesos 75/100 M.N.), el 29 de agosto del presente recibió la ministración correspondiente al mes de agosto por un monto de \$2,148,680.75 (dos millones ciento cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta pesos 75/100 M.N.), el 29 de agosto del presente recibió la ministración correspondiente al mes de agosto por un monto de \$2,148,680.75 (dos millones ciento cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta pesos 75/100 M.N.).

En este mismo sentido, mediante oficio INEIEM/DV/VAL/404/2020 se entregó de manera física tres tantos en original del Convenio de Colaboración y Ejecución del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraestructura Física Educativa de Nivel Superior 2020 y el programa de ejecución de obras, debidamente firmados por el Titular del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM) con la finalidad de recibir la firma del rector.

Mediante oficio CGPYA/334/2020 signado por el Dr. Alvaro Zamudio Lara Coordinador General de Planeación y Administración se hace entrega al Lic. José Evaristo Silva Bandala Director General del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM) un ejemplar en original debidamente firmado y rubricado del Convenio de Colaboración y Ejecución del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraestructura Física Educativa de Nivel Superior 2020 y su programa de ejecución de obras.

Mediante oficio DGPV/238/2020 dirigido al Dr. Isaias Ekzarraz Alcaraz, Director de Fortalecimiento Institucional de la DGE/SUI, se adjunta copia simple en versión electrónica y en PDF del Convenio de Colaboración y Ejecución del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraestructura Física Educativa de Nivel Superior 2020 y su programa de ejecución de obras, celebrado Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM) y la Institución.

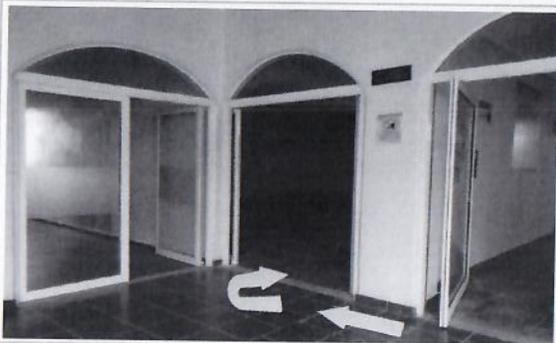

F3: Exterior lateral derecho del centro de computo



F4: Entrada del Centro de Computo



F5: Interior Centro de Computo lateral derecho

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



F6: Ubicación del Aire acondicionado lateral izquierdo

Handwritten signature of Dr. Gustavo Urquiza Beltrán in blue ink.

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán  
Rector

Handwritten signature of Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández in blue ink.

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández  
Director General de Infraestructura

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2020

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
3er Trimestre  
(Jul-Sep)  
FECHA DE CORTE: 30/09/2020

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Escuela de la universidad  
Porcentaje de avance

0.00%

PRIORIDAD

3

Nombre de la obra: Equipamiento de Espacios Académicos del campus Norte (Escuela de Estudios Superiores de Axochiapan)

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN




UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Libramiento San Pablo s/n C.P. 62954, Axochiapan, Morelos.

PLANTA ALTA

EQUIPAR CON BANCOS: Laboratorio y Cocina



LABORATORIO 519  
COCINA 07  
LABORATORIO 544  
COCINA 07

FOTOS (ANTES)



F1: Fachada Principal



F2: Salón (67) de la planta alta para butacas



F3: Salón (54) de la planta alta para butacas



F4: Laboratorio (planta alta) para bancos de laboratorio

**Comentarios de los trabajos realizados:**  
De acuerdo al oficio SE/0275/2020 signado por el Lic. Luis Arturo Cornejo Alatorre Secretario de Educación del Estado de Morelos y dirigido al Lic. José Alejandro Vázquez Gallo, Secretario de Hacienda, en el cual se solicita atentamente ministrar los recursos a la institución conforme al anexo 1 propuesta para ministración de recursos FAM 2020; conforme al oficio R/055/2020. Una vez aprobada la propuesta, la institución recibió las ministraciones conforme a lo siguiente: 4 de agosto del presente recibieron los recursos correspondientes a los meses de mayo y junio por un monto de \$12,602,084.50 (doce millones ochocientos noventa y dos mil ochenta y cuatro pesos 50/100 M.N.); el 25 de agosto de 2020 se recibió la ministración correspondiente al mes de julio por un monto de \$2,148,680.75 (dos millones ciento cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta pesos 75/100 M.N.); el 28 de agosto del presente recibió la ministración correspondiente al mes de agosto por un monto de \$2,148,680.75 (dos millones ciento cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta pesos 75/100 M.N.); el 29 de septiembre del presente recibió la ministración correspondiente al mes de septiembre por un monto de \$2,148,680.75 (dos millones ciento cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta pesos 75/100 M.N.). En este mismo sentido, mediante oficio INE/EMV/IA/1404/2020 se entregó de manera física tres tantos en original del Convenio de Colaboración y Ejecución del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraestructura Física Educativa de Nivel Superior (CAE) y el programa de ejecución de obras, debidamente firmados por el Titular del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM) con la finalidad de rescatar la firma del recto. Mediante oficio CGP/A/034/2020 signado por el Dr. Álvaro Zamudio Lara Coordinador General de Planeación y Administración se hace entrega al Lic. José Evaristo Silva Bernaldo Director General del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM) un exemplar en original debidamente firmado y rubricado del Convenio de Colaboración y Ejecución del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraestructura Física Educativa de Nivel Superior 2020 y su programa de ejecución de obras, cedidos al Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM) y la institución.

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán  
Rector

Arq. Óscar Gabriel Lastra Fernández  
Director General de Infraestructura

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2020

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
3er Trimestre  
(Jul-Sep)  
FECHA DE CORTE: 30/09/2020

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



PRORIDAD

3

Nombre de la obra:

Equipamiento de Espacios Académicos del campus Norte (Escuela de Estudios Superiores de Xalostoc)

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

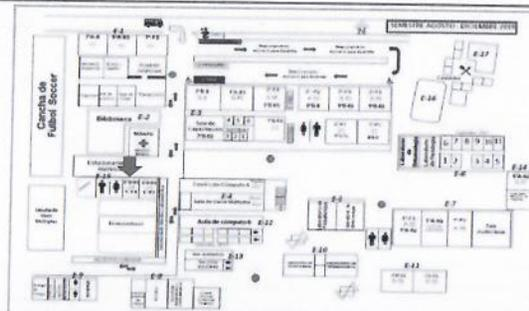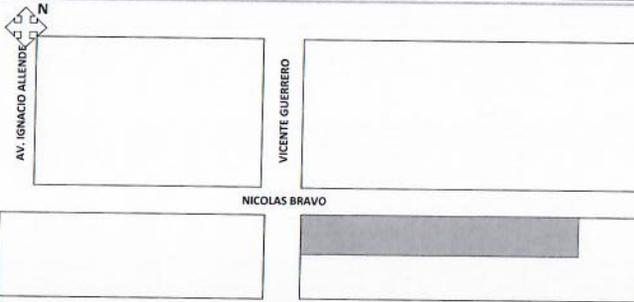

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Av. Nicolás Bravo s/n, Parque Industrial Cuautla,  
Código Postal 62717 Xalostoc, Ayala, Morelos



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Escudo de la universidad

Porcentaje de avance

0.00%

FOTOS (ANTES)



F1: Fachada Principal



F2: Fachada del edificio 15, aulas 4 y 5

Comentarios de los trabajos realizados:

De acuerdo al oficio SE-0275/2020 signado por el Lic. Luis Arturo Cornejo Alatorre Secretario de Educación del Estado de Morelos y dirigido al L.C. José Alejandro Vilareal Gazca, Secretario de Hacienda, en el cual se solicita atentamente ministrar los recursos a la institución conforme al anexo 1 "propuesta para ministración de recursos FAM 2020", conforme al oficio R/165/2020. Una vez aprobada la propuesta, la institución recibió las ministraciones conforme a lo siguiente: 4 de agosto del presente recibieron los recursos correspondientes a los meses de mayo y junio por un monto de \$12,892,084.50 (doce millones ochocientos noventa y dos mil ochocientos y cuatro pesos 50/100 M.N.), el 25 de agosto de 2020 se recibió la ministración correspondiente al mes de julio por un monto de \$2,148,680.75 (dos millones ciento cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta pesos 75/100 M.N.), el 29 de agosto del presente recibió la ministración correspondiente al mes de agosto por un monto de \$2,148,680.75 (dos millones ciento cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta pesos 75/100 M.N.), el 29 de septiembre del presente recibió la ministración correspondiente al mes de agosto por un monto de \$2,148,680.75 (dos millones ciento cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta pesos 75/100 M.N.). En este mismo sentido, mediante oficio INEIEI/DV/AL/404/2020 se entregan de manera física tres tantos en original del Convenio de Colaboración y Ejecución del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraestructura Física Educativa de Nivel Superior 2020 y el programa de ejecución de obras debidamente firmados por el Titular del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM) con la finalidad de recabar la firma del rector. Mediante oficio COPyA/334/2020 signado por el Dr. Akhoro Zamudio Lara Coordinador General de Planeación y Administración se hace entrega al Lic. José Evaristo Silva Bandalá Director General del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM) un ejemplar en original debidamente firmado y rubricado del Convenio de Colaboración y Ejecución del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraestructura Física Educativa de Nivel Superior 2020 y su programa de ejecución de obras.

Mediante oficio DGP/238/2020 dirigido al Dr. Isela Elizarraraz Alcaraz, Director de Fortalecimiento Institucional de la DGESUT, se adjunta copia simple en versión electrónica y en PDF del Convenio de Colaboración y Ejecución del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraestructura Física Educativa de Nivel Superior 2020 y su programa de ejecución de obras, celebrado Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM) y la Institución.



F3: Exterior de aulas 4 y 5.



F4: Aula 4 (1 aire acondicionado)




F5: Aula 5 (1 aire acondicionado)

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



F3: Laboratorio "Biotecnología" para extintores

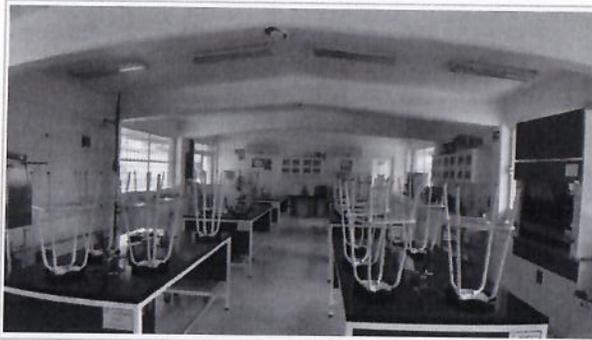

F4: Laboratorio "Química Básica" para extintores



F5: Laboratorio "Análisis de aguas y suelos" para extintores



F2: Laboratorio "Termodinámica" para extintores



F2: Almacén de reactivos para extintores



F3: Laboratorio de Entomología para extintores

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán  
Rector

Arq. Óscar Gabriel Lastra Fernández  
Director General de Infraestructura

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.  
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2020

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
3er Trimestre  
(Jul-Sep)

FECHA DE CORTE: 30/09/2020

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIMORDIA

3

Nombre de la obra:

Equipamiento de Espacios Académicos del campus Norte (Escuela de Estudios Superiores de Tototlan)




UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Escudo de la universidad


Porcentaje de avance

0.00%

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

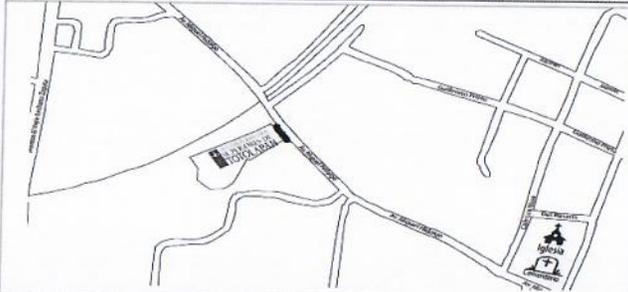

Propiedad Privada

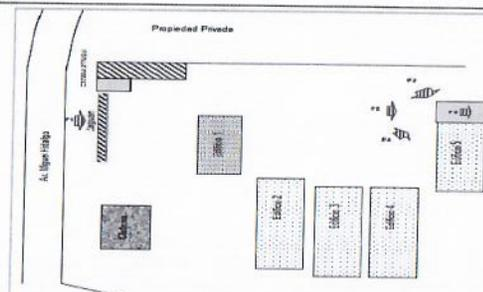

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Tototlan-Nepopualco S/N Ahuatlán  
Tototlan Morelos

FOTOS (ANTES)



F1: Fachada Principal



F2: Edificio 5 Laboratorio de Bioquímica frente

Comentarios de los trabajos realizados:

De acuerdo al oficio SE/0275/2020 asignado por el Lic. Luis Arturo Consejo Abatoro Secretario de Educación del Estado de Morelos y dirigido al Lic. José Alejandro Villaveal Gazca, Secretario de Hacienda, en el cual se solicita adelantamente minister los recursos a la institución conforme al anexo 1 "propuesta para ministración de recursos FAM 2020", conforme al oficio R/165/2020. Una vez aprobada la propuesta, la institución recibió los ministraciones conforme a lo siguiente: 4 de agosto del presente recibieron los recursos correspondientes a los meses de mayo y junio por un monto de \$12,892,084.50 (doce millones ochocientos noventa y dos mil ochenta y cuatro pesos 50/100 M.N.), el 25 de agosto de 2020 se recibió la ministración correspondiente al mes de julio por un monto de \$2,148,680.75 (dos millones, ciento cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta pesos 75/100 M.N.), el 29 de agosto del presente recibió la ministración correspondiente al mes de agosto por un monto de \$2,148,680.75 (dos millones, ciento cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta pesos 75/100 M.N.), el 29 de septiembre del presente recibió la ministración correspondiente al mes de septiembre por un monto de \$2,148,680.75 (dos millones, ciento cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta pesos 75/100 M.N.). En este mismo sentido, mediante oficio INEIM/04/AL/404/2020 se entregan de manera física tres tantos en original del Convenio de Colaboración y Ejecución del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraestructura Física Educativa de Nivel Superior 2020 y el programa de ejecución de obras, debidamente firmados por el Titular del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIM) con la finalidad de recabar la firma del rector.

Mediante oficio CCFY/034/0200 asignado por el Dr. Alberto Zamudio Lara Coordinador General de Planeación y Administración se hace entrega al Lic. José Evaristo Silva Bandala Director General del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIM) un ejemplar en original debidamente firmado y rubricado del Convenio de Colaboración y Ejecución del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraestructura Física Educativa de Nivel Superior 2020 y su programa de ejecución de obras.

Mediante oficio DGPI/238/2020 dirigido al Dr. Isaias Elizarraz Alcaraz, Director de Fortalecimiento Institucional de la DGE/SUI, se adjunta copia simple en versión electrónica y en PDF del Convenio de Colaboración y Ejecución del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraestructura Física Educativa de Nivel Superior 2020 y su programa de ejecución de obras, celebrado Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIM) y la Institución.



F3: Edificio 5 Laboratorio de Bioquímica Lateral izquierdo



F5: Edificio 5 Laboratorio de Bioquímica se requieren mesas de laboratorio



F6: Edificio 5 Laboratorio de Bioquímica, se requieren mesas de laboratorio

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán  
Rector

Arg. Oscar Gabriel Lastra Fernández  
Director General de Infraestructura

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2020

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

3er Trimestre  
(Jul-Sep)

FECHA DE CORTE: 30/09/2020

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRORIDAD

3

Nombre de la obra:

Equipamiento de Espacios Académicos del campus Norte (Escuela de Estudios Superiores de Yecapixtla)

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Avenida Félix Arias, Quinta Sección de los Amates, Yecapixtla, Morelos



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Escudo de la universidad

Porcentaje de avance

0.00%

FOTOS (ANTES)



F1: Fachada Principal



F2: SILLA: Sillas que se colocaran en el edificio de INGENIERO-ARQUITECTO en la biblioteca.

Comentarios de los trabajos realizados:

De acuerdo al oficio SE-0276/2020 signado por el Lic. Luis Arturo Cornejo Alatorre Secretario de Educación del Estado de Morelos y dirigido al L.C. José Alejandro Vilareal Gasca, Secretario de Hacienda, en el cual se solicita atentamente minimizar los recursos a la institución conforme al anexo 1 "propuesta para ministración de recursos FAM 2020", conforme al oficio R/165/2020. Una vez aprobada la propuesta, la institución recibió las ministraciones conforme a lo siguiente: 4 de agosto del presente recibieron los recursos correspondientes a los meses de mayo y junio por un monto de \$12,892,084.50 (doce millones ochocientos noventa y dos mil ochenta y cuatro pesos 50'100 M.N.), el 25 de agosto de 2020 se recibió la ministración correspondiente al mes de julio por un monto de \$2,148,680.75 (dos millones ciento cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta pesos 75'100 M.N.), el 29 de agosto del presente recibió la ministración correspondiente al mes de agosto por un monto de \$2,148,680.75 (dos millones ciento cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta pesos 75'100 M.N.), el 29 de septiembre del presente recibió la ministración correspondiente al mes de septiembre por un monto de \$2,148,680.75 (dos millones ciento cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta pesos 75'100 M.N.). En este mismo sentido, mediante oficio INEIEI/DV/AL/404/2020 se entregan de manera física tres tantos, en original del Convenio de Colaboración y Ejecución del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraestructura Física Educativa de Nivel Superior 2020 y el programa de ejecución de obras debidamente firmados por el Titular del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM) con la finalidad de recibir la firma del resto. Mediante oficio CQP/A/234/2020 signado por el Dr. Alvaro Zamudio Lara Coordinador General de Planeación y Administración se hace entrega al Lic. José Evaristo Silva Bandala Director General del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM) un ejemplar en original debidamente firmado y rubricado del Convenio de Colaboración y Ejecución del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraestructura Física Educativa de Nivel Superior 2020 y su programa de ejecución de obras.

Mediante oficio DGP/236/2020 dirigido al Dr. Isaias Elzarraraz Alcaraz, Director de Fortalecimiento Institucional de la DGESUT se adjunta copia simple en versión electrónica y en PDF del Convenio de Colaboración y Ejecución del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraestructura Física Educativa de Nivel Superior 2020 y su programa de ejecución de obras, celebrado Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM) y la Institución.



F3: ESTACIONES DE TRABAJO: Se colocaran en el Edificio de Talleres en el Taller de Robotica.



F4: SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO: 1 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO: Se colocará en el Edificio de Talleres en el Centro de Computo.




F5: PROYECTOR DE TIRO LLARGO: Se colocará en el Edificio de INGENIERO EN ROBOTICA Y SISTEMAS DE MANUFACTURA INDUSTRIAL AULA 1

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



F6: PROYECTOR DE TIRO LARGO: Se colocará en el edificio de INGENIERO EN ROBOTICA Y SISTEMAS DE MANUFACTURA INDUSTRIAL EN EL AULA 2

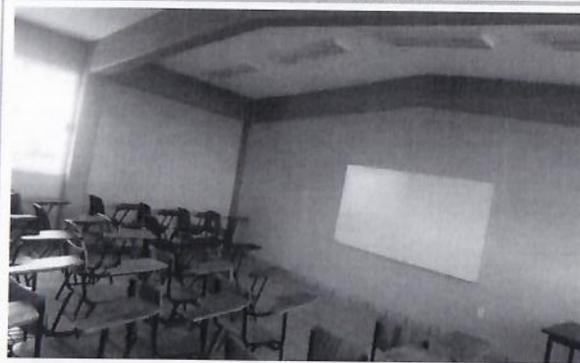

F7: PROYECTOR DE TIRO LARGO: Se colocara en el edificio de INGENIERO EN ROBOTICA Y SISTEMAS DE MANUFACTURA INDUSTRIAL EN EL AULA 3 PLANTA ALTA



F8: PROYECTOR DE TIRO LARGO: Se colocara en el edificio de INGENIERO EN ROBOTICA Y SISTEMAS DE MANUFACTURA INDUSTRIAL EN EL AULA 4 PLANTA ALTA

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán  
Rector

Arg. Oscar Gabriel Lastra Fernández  
Director General de Infraestructura

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

2020

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
3er Trimestre  
(Jul-Sep)

FECHA DE CORTE: 30/09/2020

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PROYECTO 4 Nombre de la obra:

Adecuación y mejoras del Campus Norte (Centro de Investigación en Biotecnología)


CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Escuela de la universidad  
Porcentaje de avance

0.00%

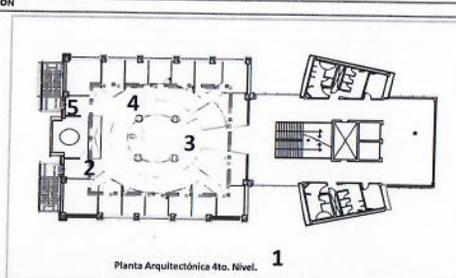

Planta Arquitectónica 4to. Nivel. 1

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa,  
Cuernavaca, Mor. C.P.62209.

FOTOS (ANTES)



F1: Fachada Principal



F2: Vestíbulo donde se harán divisiones de laboratorios con muros de tablaroca y cancelería de aluminio



F3: Se desmontarán muros existentes de tablaroca y cancelería, se reubicarán contactos y salidas de voz datos



F4: Área donde se desarrollarán muros de tablaroca, con suministro y colocación de cancelería de aluminio.

Comentarios de los trabajos realizados:

De acuerdo al oficio SE/02/75/2020 signado por el Lic. Luis Arturo Cornejo Alatorre Secretario de Educación del Estado de Morelos y dirigido al L.C. José Alejandro Villarreal Gasca, Secretario de Hacienda, en el cual se solicita atentamente ministrar los recursos a la institución conforme al anexo 1 "propuesta para ministración de recursos FAM 2020", conforme al oficio R/165/2020. Una vez aprobada la propuesta, la institución recibió las ministraciones conforme a lo siguiente: 4 de agosto del presente recibió los recursos correspondientes a los meses de mayo y junio por un monto de \$17,892,084.50 (diez millones ochocientos noventa y dos mil ochenta y cuatro pesos 50/100 M.N.), el 25 de agosto de 2020 se recibió la ministración correspondiente al mes de julio por un monto de \$2,145,680.75 (dos millones ciento cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta pesos 75/100 M.N.), el 29 de agosto del presente recibió la ministración correspondiente al mes de agosto por un monto de \$2,148,680.75 (dos millones ciento cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta pesos 75/100 M.N.), el 29 de septiembre del presente recibió la ministración correspondiente al mes de septiembre por un monto de \$2,148,680.75 (dos millones ciento cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta pesos 75/100 M.N.).

En este mismo sentido, mediante oficio NEEEM/DV/AL/404/2020 se entregó de manera física tres tantos en original del Convenio de Colaboración y Ejecución del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraestructura Física Educativa de Nivel Superior 2020 y el programa de ejecución de obras, debidamente firmados por el Titular del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM) con la finalidad de recabar la firma del rector. Mediante oficio CGP/A334/2020 signado por el Dr. Alvaro Zamudio Lara Coordinador General de Planeación y Administración se hizo entrega al Lic. José Evaristo Silva Bandala Director General del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM) un ejemplar en original debidamente firmado y rubricado del Convenio de Colaboración y Ejecución del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraestructura Física Educativa de Nivel Superior 2020 y su programa de ejecución de obras.

Mediante oficio DGPI/238/2020 dirigido al Dr. Isaías Elizamanzar Alcaraz, Director de Fortalecimiento Institucional de la DGE/SU, se adjunta copia simple en versión electrónica y en PDF del Convenio de Colaboración y Ejecución del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraestructura Física Educativa de Nivel Superior 2020 y su programa de ejecución de obras, celebrado Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM) y la institución.



F8: Área de salidas de emergencia

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán  
Rector

Ing. Oscar Gabriel Lastra Fernández  
Director General de Infraestructura

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2020

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
3er Trimestre  
(Jul-Sep)

FECHA DE CORTE: 30/09/2020

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD

4

Nombre de la obra

Adecuación y mejoras del Campus Norte ( Centro de Investigación en Ciencias)




Estado de la universidad


Porcentaje de avance

0.00%

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

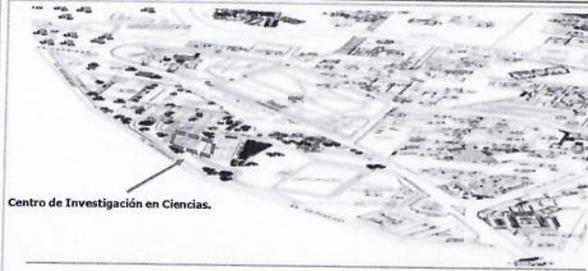

Centro de Investigación en Ciencias.

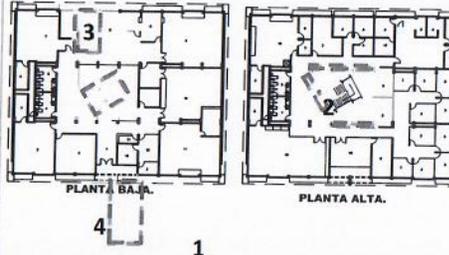

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa,  
Cuernavaca, Mor. C.P.62209.

FOTOS (ANTES)



1.- Fachada Principal.



2.- Módulo de escaleras - Sustitución de barandales existentes.



3.- Planta baja barandales por cambiar.



4.- Barandales por cambiar en módulo de escaleras.

Comentarios de los trabajos realizados:

De acuerdo al oficio SE/0275/2020 signado por el Lic. Luis Arturo Cornejo Alatorre Secretario de Educación del Estado de Morelos y dirigido al L.C. José Alejandro Vilareal Gazca, Secretario de Hacienda, en el cual se solicita atentamente ministrar los recursos a la institución conforme al anexo 1 "propuesta para ministración de recursos FAM 2020", conforme al oficio 09/165/2020. Una vez aprobada la propuesta, la institución recibió las ministraciones conforme a lo siguiente: 4 de agosto del presente recibieron los recursos correspondientes a los meses de mayo y junio por un monto de \$12,892,084.50 (doce millones ochocientos noventa y dos mil ochenta y cuatro pesos 50/100 M.N.), el 25 de agosto de 2020 se recibió la ministración correspondiente al mes de julio por un monto de \$2,148,680.75 (dos millones ciento cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta pesos 75/100 M.N.), el 29 de agosto del presente recibió la ministración correspondiente al mes de agosto por un monto de \$2,148,680.75 (dos millones ciento cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta pesos 75/100 M.N.), el 29 de septiembre del presente recibió la ministración correspondiente al mes de septiembre por un monto de \$2,148,680.75 (dos millones ciento cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta pesos 75/100 M.N.). En este mismo sentido, mediante oficio INEEM/DV/L404/2020 se entregan de manifa física tres tantos en original del Convenio de Colaboración y Ejecución del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraestructura Física Educativa de Nivel Superior 2020 y el programa de ejecución de obras debidamente firmados por el Titular del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM) con la finalidad de recabar la firma del rector.

Mediante oficio CGPyA/334/2020 signado por el Dr. Alvaro Zamudio Lara Coordinador General de Planeación y Administración se hace entrega al Lic. José Evaristo Silva Bandala Director General del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM) un ejemplar en original debidamente firmado y rubricado del Convenio de Colaboración y Ejecución del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraestructura Física Educativa de Nivel Superior 2020 y su programa de ejecución de obras.

Mediante oficio DGPI/238/2020 dirigido al Dr. Isaias Elizarraras Alcaraz, Director de Fortalecimiento Institucional de la DGESUI, se adjunta copia simple en versión electrónica y en PDF del Convenio de Colaboración y Ejecución del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraestructura Física Educativa de Nivel Superior 2020 y su programa de ejecución de obras, celebrado Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM) y la Institución.

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán  
Rector

Dr. Oscar Gabriel Lastra Fernández  
Director General de Infraestructura

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2020

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
3er Trimestre  
(Jul-Sep)

FECHE DE CORTE: 30/09/2020

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Escuela de la universidad  
Porcentaje de avance

0.00%

#PROYECTO

4


Nombre de la obra

Adecuación y mejoras del Campus Norte (Centro de Investigación en Dinámica Celular)

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



Centro de Investigación en Dinámica Celular.  
Edificio A-43

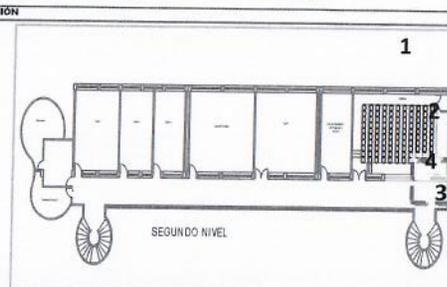


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilla,  
Cuernavaca, Mor, C.P.62209.

FOTOS (ANTES)




F1: Fachada Principal.

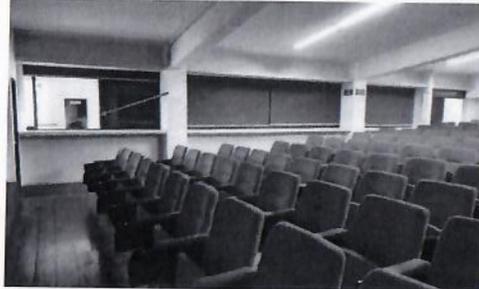

F2: Interior de auditorio donde se colocara puerta de emergencia.



F3: Demolición de muro, desmantelamiento de ventana, suministro y colocación de puerta de emergencia

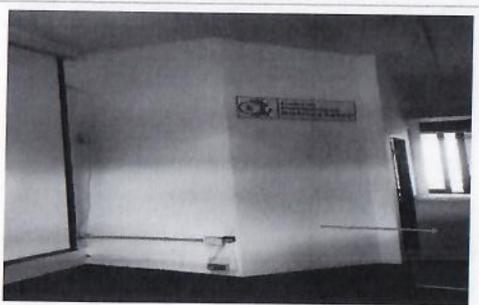

F4: Ubicación de salida de emergencia.

Comentarios de los trabajos realizados:

De acuerdo al oficio SE/0275/2020 signado por el Lic. Luis Arturo Carrero Alatorre Secretario de Educación del Estado de Morelos y dirigido al L.C. José Alejandro Vilareal Gazca, Secretario de Hacienda, en el cual se solicita oportunamente suministrar los recursos a la institución conforme al anexo 1 "propuesta para ministración de recursos FAM 2020", conforme al oficio RI/165/2020. Una vez aprobada la propuesta, la institución recibió las ministraciones conforme a lo siguiente: 4 de agosto del presente recibió los recursos correspondientes a los meses de mayo y junio por un monto de \$17,892,064.50 (diecisiete millones ochocientos noventa y dos mil ochenta y cuatro pesos 50/100 M.N.), el 25 de agosto de 2020 se recibió la ministración correspondiente al mes de julio por un monto de \$2,148,680.75 (dos millones ciento cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta pesos 75/100 M.N.), el 29 de agosto del presente recibió la ministración correspondiente al mes de agosto por un monto de \$2,148,680.75 (dos millones ciento cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta pesos 75/100 M.N.), el 29 de septiembre del presente recibió la ministración correspondiente al mes de septiembre por un monto de \$2,148,680.75 (dos millones ciento cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta pesos 75/100 M.N.).

En el mismo sentido, mediante oficio INEIEMD/VA/404/2020 se entregan de manera física tres tantos en original del Convenio de Colaboración y Ejecución del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraestructura Física Educativa de Nivel Superior 2020 y el programa de ejecución de obras debidamente firmados por el Titular del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM) con la finalidad de recabar la firma del sector.

Mediante oficio CGPYA/334/2020 signado por el Dr. Alvaro Zamudio Lara Coordinador General de Planeación y Administración se hace entrega al Lic. José Evaristo Silva Bandala Director General del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM) un ejemplar en original debidamente firmado y rubricado del Convenio de Colaboración y Ejecución del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraestructura Física Educativa de Nivel Superior 2020 y su programa de ejecución de obras.

Mediante oficio DGPI/238/2020 dirigido al Dr. Ismael Elizarraraz Alcaraz, Director de Fortalecimiento Institucional de la DGE-SU, se adjunta copia simple en versión electrónica y en PDF del Convenio de Colaboración y Ejecución del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraestructura Física Educativa de Nivel Superior 2020 y su programa de ejecución de obras, celebrado Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM) y la Institución.

Dr. Gustavo Urjuzá Beltrán  
Rector

Arq. Oscar Gabriel Lastra Ferrández  
Director General de Infraestructura

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2020

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
3er Trimestre  
(Jul-Sep)  
FECHA DE CORTE: 30/09/2020


REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD 4

Nombre de la obra:

Adecuación y mejoras del Campus Norte (Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas)

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

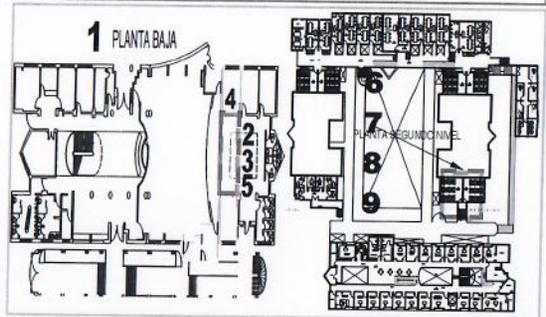

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca, Mor. C.P.62209.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Escudo de la universidad

Porcentaje de avance

0.00%

FOTOS (ANTES)




F1: Fachada Principal



F2: Fachada biblioteca.



F3: Fachada biblioteca.

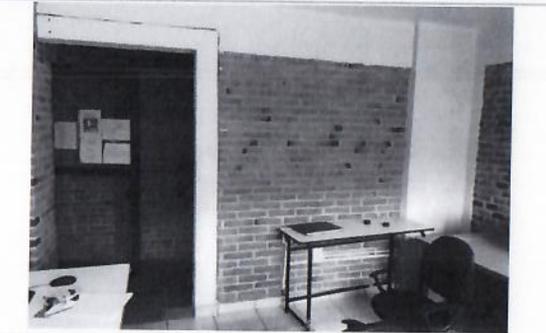

F4: Muro que se demolerá para ampliar biblioteca.

Comentarios de los trabajos realizados:

De acuerdo al oficio SE0275/2020 signado por el Lic. Luis Arturo Cornejo Alatorre Secretario de Educación del Estado de Morelos y dirigido al L.C. José Alejandro Villareal Gacza, Secretario de Hacienda, en el cual se solicita atentamente ministrar los recursos a la institución conforme al anexo 1 "propuesta para ministración de recursos FAM 2020", conforme al oficio R/165/2020.

Una vez aprobada la propuesta, la institución recibió las ministraciones conforme a lo siguiente: 4 de agosto del presente recibieron los recursos correspondientes a los meses de mayo y junio por un monto de \$12,892,084.50 (doce millones ochocientos noventa y dos mil ochenta y cuatro pesos 50/100 M.N.), el 25 de agosto de 2020 se recibió la ministración correspondiente al mes de julio por un monto de \$2,148,680.75 (dos millones ciento cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta pesos 75/100 M.N.), el 29 de agosto del presente recibió la ministración correspondiente al mes de agosto por un monto de \$2,148,680.75 (dos millones ciento cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta pesos 75/100 M.N.), el 29 de septiembre del presente recibió la ministración correspondiente al mes de septiembre por un monto de \$2,148,680.75 (dos millones ciento cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta pesos 75/100 M.N.).

En este mismo sentido, mediante oficio INEIE/MDV/AL/04/2020 se entregó de manera física tres tantos en original del Convenio de Colaboración y Ejecución del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraestructura Física Educativa de Nivel Superior 2020 y el programa de ejecución de obras debidamente firmados por el Titular del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM) con la finalidad de recabar la firma del rector.


Mediante oficio CGPyA/034/2020 signado por el Dr. Alvaro Zamudio Lara Coordinador General de Planeación y Administración se hace entrega al Lic. José Evaristo Silva Gándara Director General del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM) un ejemplar en original debidamente firmado y rubricado del Convenio de Colaboración y Ejecución del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraestructura Física Educativa de Nivel Superior 2020 y su programa de ejecución de obras.

Mediante oficio DGPI/238/2020 dirigido al Dr. Isaias Elzarráz Alcaraz, Director de Fortalecimiento Institucional de la DGE/II, se adjunta copia simple en versión electrónica y en PDF del Convenio de Colaboración y Ejecución del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraestructura Física Educativa de Nivel Superior 2020 y su programa de ejecución de obras, celebrado Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM) y la institución.




F5: Interior de la biblioteca, donde se quitará muro para ampliar la misma.


REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

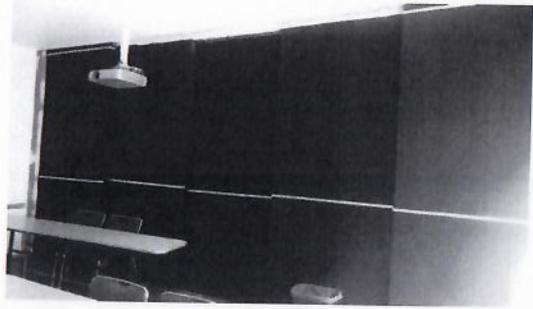


F6: Interior de Salones, donde se encuentra muro móvil a cambiar.

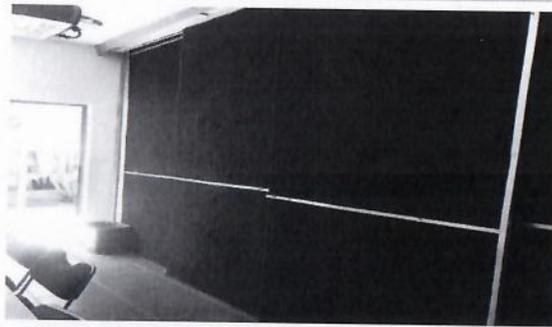

F7: Interior de Salones, donde se encuentra muro móvil a cambiar.

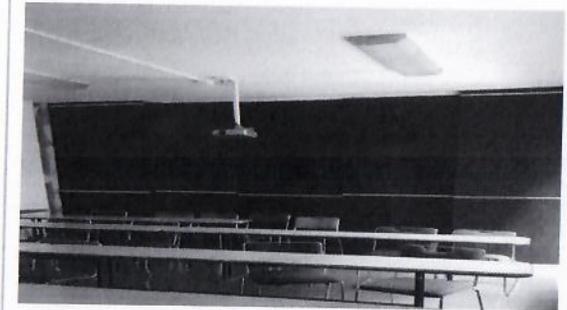

F8: Interior de Salones, donde se encuentra muro móvil a cambiar.

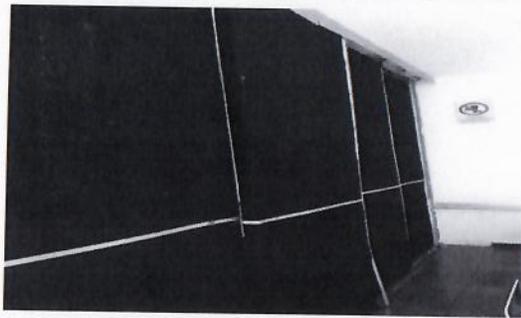

F9: Interior de Salones, donde se encuentra muro móvil a cambiar.

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán  
Rector

Mr. Oscar Gabriel Lastra Fernández  
Director General de Infraestructura

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2020

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
3er Trimestre  
(Jul-Sep)  
FECHA DE CORTE: 30/09/2020

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD

4

Nombre de la obra


Adecuación y mejoras del Campus Norte (Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería)



Escuela de la universidad  
Porcentaje de avance


0.00%

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

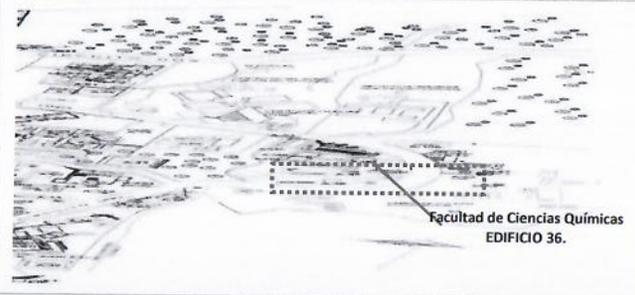

Facultad de Ciencias Químicas  
EDIFICIO 36.

EDIFICIO 36.

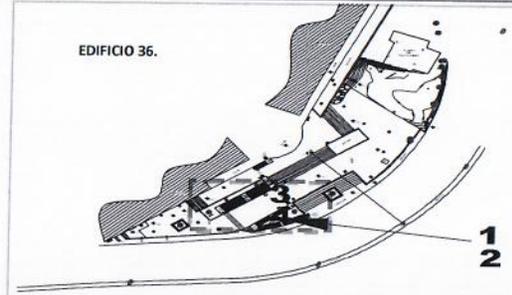

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa,  
Cuernavaca, Mor. C.P.62209.


FOTOS (ANTES)



F1: Facultad de Ciencias Químicas e Ingenierías, EDIFICIO 36, construcción de rampa peatonal



F2: Área de rampa de rampa de concreto, realizándose excavaciones, demolición de firme, excavación, construcción de muretes de contención, colocación de barandal

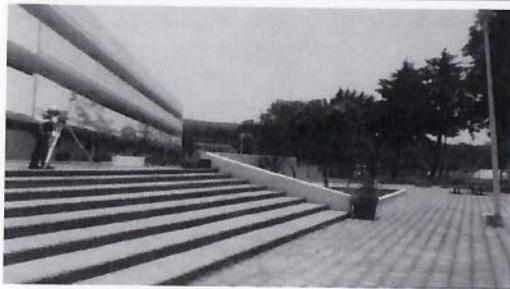

F3: Nivel Intermedio de plaza de acceso, intercomunicación con rampa



F4: Vista general de escalera de acceso principal al plantel

Comentarios de los trabajos realizados:

De acuerdo al oficio SE/0275/2020 signado por el Lic. Luis Arturo Cornejo Alatorre Secretario de Educación del Estado de Morelos y dirigido al L.C. José Alejandro Villareal Gazca, Secretario de Hacienda, en el cual se solicita atentamente ministrar los recursos a la institución conforme al anexo 1 "propuesta para ministración de recursos FAM 2020", conforme al oficio R/165/2020. Una vez aprobada la propuesta, la institución recibió las ministraciones conforme a lo siguiente: 4 de agosto del presente recibió los recursos correspondientes a los meses de mayo y junio por un monto de \$12,892,064.50 (doce millones ochocientos noventa y dos mil ochenta y cuatro pesos 50/100 M.N.), el 25 de agosto de 2020 se recibió la ministración correspondiente al mes de julio por un monto de \$2,148,680.75 (dos millones ciento cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta pesos 75/100 M.N.), el 29 de agosto del presente recibió la ministración correspondiente al mes de agosto por un monto de \$2,148,680.75 (dos millones ciento cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta pesos 75/100 M.N.), el 29 de septiembre del presente recibió la ministración correspondiente al mes de septiembre por un monto de \$2,148,680.75 (dos millones ciento cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta pesos 75/100 M.N.). En este mismo sentido, mediante oficio INEIEI/DVYAL/404/2020 se entregan de manera física tres tantos en original del Convenio de Colaboración y Ejecución del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraestructura Física Educativa de Nivel Superior 2020 y el programa de ejecución de obras debidamente firmados por el Titular del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM) con la finalidad de recabar la firma del rector. Mediante oficio CGPYA/334/2020 signado por el Dr. Alvaro Zamudio Lara Coordinador General de Planeación y Administración se hace entrega al Lic. José Evaristo Silva Bandala Director General del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM) un ejemplar en original debidamente firmado y rubricado del Convenio de Colaboración y Ejecución del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraestructura Física Educativa de Nivel Superior 2020 y su programa de ejecución de obras.

Mediante oficio DGP/238/2020 dirigido al Dr. Isaias Elizarraraz Alcaraz, Director de Fortalecimiento Institucional de la DGESUL se adjunta copia simple en versión electrónica y en PDF del Convenio de Colaboración y Ejecución del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraestructura Física Educativa de Nivel Superior 2020 y su programa de ejecución de obras, celebrado Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM) y la Institución.

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán  
Rector

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández  
Director General de Infraestructura

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2020

AÑO

# FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**3er Trimestre  
(Jul-Sep)**  
FECHA DE CORTE: 30/09/2020

### REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



PRIMORDIA

4

Nombre de la obra:

**Adecuación y mejoras del Campus Norte (Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería) Anexo TAMULBA**

#### CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

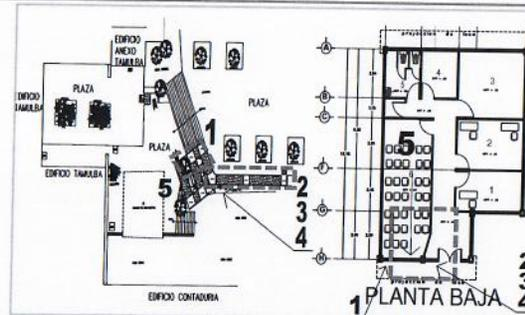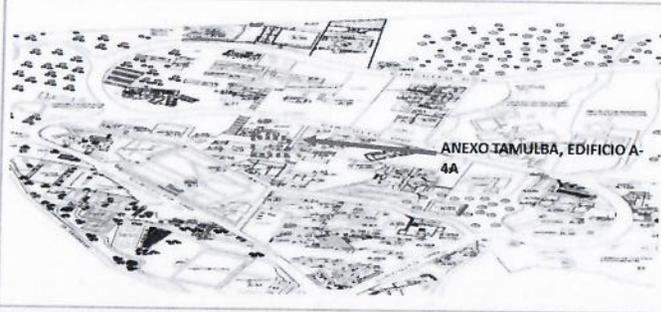

#### UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa,  
Cuernavaca, Mor. C.P.62209.



Estado de la universidad  
Porcentaje de avance

**0.00%**

#### FOTOS (ANTES)



F1: Fachada Edificio Anexo Tamulba, E-4A.



F2: Fachada donde se construirá la salida de emergencia.

**Comentarios de los trabajos realizados:**  
De acuerdo al oficio SE.0275/2020 signado por el Lic. Luis Arturo Cornejo Alatorre Secretario de Educación del Estado de Morelos y dirigido al Lic. José Alejandro Villarreal García, Secretario de Hacienda, en el cual se solicita atentamente manifestar los recursos a la institución conforme al anexo 1 "propuesta para ministración de recursos FAM 2020", conforme al oficio R/105/2020. Una vez aprobada la propuesta, la institución recibió las ministraciones conforme a lo siguiente: 4 de agosto del presente recibieron los recursos correspondientes a los meses de mayo y junio por un monto de \$12,692,084.50 (doce millones ochocientos noventa y dos mil ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), el 25 de agosto de 2020 se recibió la ministración correspondiente al mes de julio por un monto de \$2,148,680.75 (dos millones ciento cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), el 29 de agosto del presente recibió la ministración correspondiente al mes de agosto por un monto de \$2,148,680.75 (dos millones ciento cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), el 29 de septiembre del presente recibió la ministración correspondiente al mes de julio por un monto de \$2,148,680.75 (dos millones ciento cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), el 29 de agosto del presente recibió la ministración correspondiente al mes de agosto por un monto de \$2,148,680.75 (dos millones ciento cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), el 29 de agosto del presente recibió la ministración correspondiente al mes de agosto por un monto de \$2,148,680.75 (dos millones ciento cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta pesos 00/100 M.N.). En este mismo sentido, mediante oficio INEIEDV/AL/04/2020 se entregan de manera física tres tantos en original del Convenio de Colaboración y Ejecución del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraestructura Física Educativa de Nivel Superior 2020 y el programa de ejecución de obras debidamente firmados por el Titular del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM) con la finalidad de recabar la firma del rector. Mediante oficio CGP/A/334/2020 signado por el Dr. Anareo Zamudio Lara Coordinador General de Planeación y Administración se hace entrega al Lic. José Evaristo Silva Bandala Director General del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM) un ejemplar en original debidamente firmado y rubricado del Convenio de Colaboración y Ejecución del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraestructura Física Educativa de Nivel Superior 2020 y su programa de ejecución de obras. Mediante oficio DGPI/238/2020 dirigido al Dr. Isaias Elizarraraz Alcaraz, Director de Fortalecimiento Institucional de la DGESUI, se adjunta copia simple en versión electrónica y en PDF del Convenio de Colaboración y Ejecución del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraestructura Física Educativa de Nivel Superior 2020 y su programa de ejecución de obras, celebrado Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM) y la Institución.




F3: Fachada Edificio Anexo Tamulba, E-4A.



F4: Fachada Edificio Anexo Tamulba, E-4A, Rampa



F5: Fachada Edificio Anexo Tamulba, E-4A.

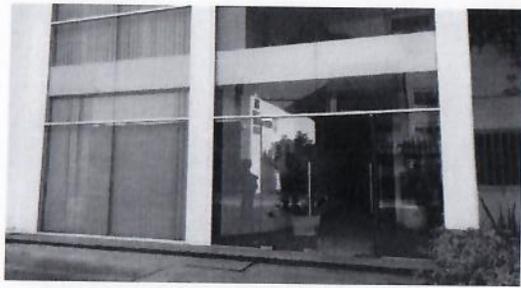

F6: Fachada donde se construirá la salida de emergencia.

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán  
Rector



F7: Fachada Edificio Anexo Tamulba, E-4A.



F8: Aula interior donde abrirá puerta de emergencia E-4A.

Am. Oscar Gabriel Lastra Fernández  
Director General de Infraestructura

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2020

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
3er Trimestre  
(Jul-Sep)

FECHA DE CORTE: 30/08/2020

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



PRIORIDAD

4

Nombre de la obra:

Adecuación y mejoras del Campus Norte (Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería) Anexo LOU

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

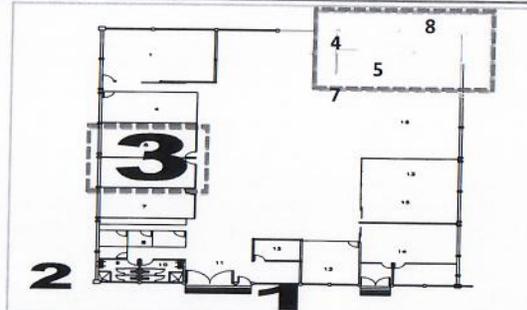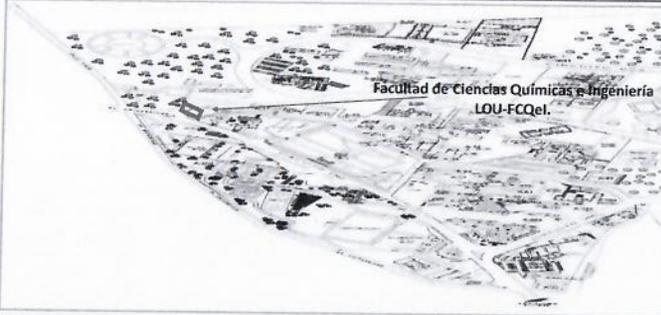

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO


Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa,  
Cuernavaca, Mor. C.P.62209.



Escuela de la universidad  
Porcentaje de avance

0.00%

FOTOS (ANTES)

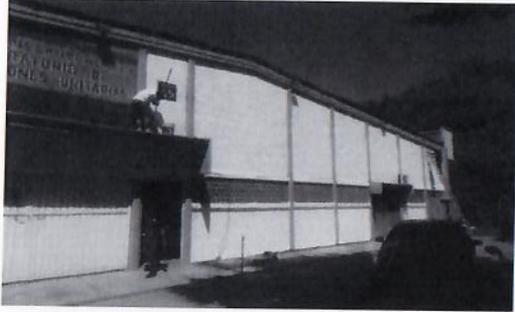

F1: Fachada Principal



F2: Adecuación a la salida de emergencia suministrando barra antipánico que funcionen y rehabilitando las puertas.

Comentarios de los trabajos realizados:

De acuerdo al oficio SE/0275/2020 signado por el Lic. Luis Arturo Cornejo Alatorre Secretario de Educación del Estado de Morelos y dirigido al L. C. José Alejandro Villareal Gazca, Secretario de Hacienda, en el cual se solicita atentamente ministrar los recursos a la institución conforme al anexo 1 "propuesta para ministración de recursos FAM 2020", conforme al oficio R/165/2020. Una vez aprobada la propuesta, la institución recibió las ministraciones conforme a lo siguiente: 4 de agosto del presente se recibieron los recursos correspondientes a los meses de mayo y junio por un monto de \$12,892,084.50 (doce millones ochocientos noventa y dos mil ochenta y cuatro pesos 50/100 M.N.), el 25 de agosto de 2020 se recibió la ministración correspondiente al mes de julio por un monto de \$2,148,680.75 (dos millones ciento cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta pesos 75/100 M.N.), el 29 de agosto del presente recibió la ministración correspondiente al mes de agosto por un monto de \$2,148,680.75 (dos millones ciento cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta pesos 75/100 M.N.), el 29 de septiembre del presente recibió la ministración correspondiente al mes de septiembre por un monto de \$2,148,680.75 (dos millones ciento cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta pesos 75/100 M.N.).


En este mismo sentido, mediante oficio INEIM/01yAL/404/2020 se entregan de manera física tres tantos en original del Convenio de Colaboración y Ejecución del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraestructura Física Educativa de Nivel Superior 2020 y el programa de ejecución de obras debidamente firmados por el Rector del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM) con la finalidad de recabar la firma del rector.

Mediante oficio COPA/334/2020 signado por el Dr. Alvaro Zamudio Lara Coordinador General de Planeación y Administración se hace entrega al Lic. José Evaristo Silva Bandrés Director General del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM) un ejemplar en original debidamente firmado y rubricado del Convenio de Colaboración y Ejecución del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraestructura Física Educativa de Nivel Superior 2020 y su programa de ejecución de obras.


Mediante oficio DOP/238/2020 dirigido al Dr. Isaias Elzarraraz Acoraz, Director de Fortalecimiento Institucional de la DGESUI, se adjunta copia simple en versión electrónica y en PDF del Convenio de Colaboración y Ejecución del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraestructura Física Educativa de Nivel Superior 2020 y su programa de ejecución de obras, celebrado Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM) y la Institución.



F3: Adecuación a la salida de emergencia suministrando barra antipánico que funcionen y rehabilitando las puertas.

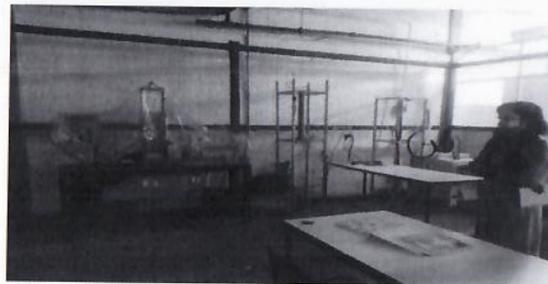

F4: Adecuación sanitaria para mesa de laboratorio.

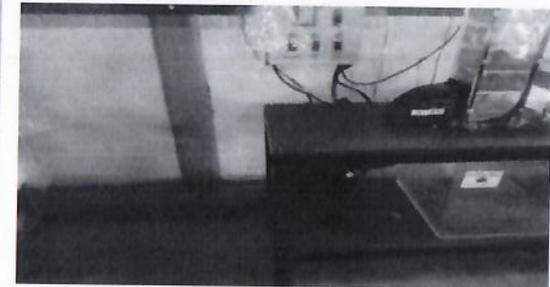

F5: Adecuación sanitaria para mesa de laboratorio.

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



F7: Adecuación sanitaria para mesa de laboratorio.

A rectangular box containing a handwritten signature in blue ink, which appears to be "G. Urquiza".

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán  
Rector



F8: Parte posterior de LOU, Adecuación sanitaria para mesa de laboratorio.

A rectangular box containing a handwritten signature in blue ink, which appears to be "Oscar Gabriel Lastra".

Amp. Óscar Gabriel Lastra Fernández  
Director General de Infraestructura

2020

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
3er Trimestre  
(Jul-Sep)  
FECHA DE CORTE: 30/09/2020

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Declaro de la universidad

Porcentaje de avance

0%


PRIMORDIA

4

Nombre de la obra:

Adecuación y mejoras del Campus Norte (Facultad de Diseño)

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

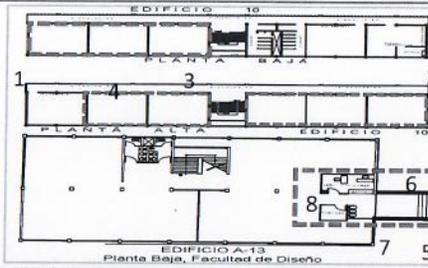

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa,  
Cuernavaca, Mor. C.P.62209.

FOTOS (ANTES)



1.- Fachada Norte



2.- Fachada Posterior, Sismismo y colocación de protecciones de herrería.



F3: Planta baja se suministrara y colocara en vanos de ventanas protecciones de herrería.



F4:Azifa tipo, en area de ventana de alumnio se colocara proteccion de herrería.

Comentarios de los trabajos realizados:

De acuerdo al oficio SE/0275/2020 signado por el Lic. Luis Arturo Cornejo Alatorre Secretario de Educación del Estado de Morelos y dirigido al L.C. José Alejandro Villareal Gazca, Secretario de Hacienda, en el cual se solicita atentamente suministrar los recursos a la institución, conforme al anexo 1 "propuesta para ministración de recursos FAM 2020", conforme al oficio RH/65/2020.

Una vez aprobada la propuesta, la institución recibió las ministraciones conforme a lo siguiente: 4 de agosto del presente se recibieron los recursos correspondientes a los meses de mayo y junio por un monto de \$12,881,084.50 (doce millones ochocientos noventa y dos mil ochenta y cuatro pesos 50/100 M.N.), el 25 de agosto de 2020 se recibió la ministración correspondiente al mes de julio por un monto de \$2,141,600.75 (dos millones ciento cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta pesos 75/100 M.N.), el 29 de agosto del presente recibió la ministración correspondiente al mes de agosto por un monto de \$2,148,680.75 (dos millones ciento cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta pesos 75/100 M.N.), el 29 de septiembre del presente recibió la ministración correspondiente al mes de septiembre por un monto de \$2,148,680.75 (dos millones ciento cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta pesos 75/100 M.N.).

En este mismo sentido, mediante oficio INE/EM/01/A/04/2020 se entregan de manera física tres ejemplares en original del Convenio de Colaboración y Ejecución del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraestructura Física Educativa de Nivel Superior 2020 y el programa de ejecución de obras, debidamente firmados por el Titular del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM) con la finalidad de recabar la firma del rector.

Mediante oficio CG/PA/03/04/2020 signado por el Dr. Alvaro Zamudio Lara, Coordinador General de Planeación y Administración se hace entrega al Lic. José Everardo Silva Bandala, Director General del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM) un ejemplar en original debidamente firmado y rubricado del Convenio de Colaboración y Ejecución del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraestructura Física Educativa de Nivel Superior 2020 y su programa de ejecución de obras.

Mediante oficio D3P/23/02/2020 dirigido al Dr. Ileana Elizarraraz Alcaraz, Directora de Fortalecimiento Institucional de la DGESUJ, se adjunta copia simple en versión electrónica y en PDF del Convenio de Colaboración y Ejecución del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraestructura Física Educativa de Nivel Superior 2020 y su programa de ejecución de obras, celebrado Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM) y la Institución.




F5: Fachada Oeste Edificio A-13

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



F6: Área de adecuación de acceso a Dirección de la Facultad de Diseño



Dr. Gustavo Urquiza Beltrán  
Rector



F7: Se realizaran trabajos de demolición de muro, desmantelamiento de ventana, colocación de cancel de herrería, muro de Tablaroca, pintura, reubicación de instalación eléctrica y voz datos.



F8: Área interior, se colocaran muros de Tablaroca, mostrador de madera, ventana de aluminio, pintura y reubicación de salidas de voz datos y eléctrica.



Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández  
Director General de Infraestructura

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2020

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL, DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
3er Trimestre  
(Jul-Sep)  
FECHA DE CORTE: 30/09/2020

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL




Estado de la universidad  
Porcentaje de avance

0%

PRIMORDIAL 4

Nombre de la obra: **Adecuación y mejoras del Campus Norte (Facultad de Estudios Sociales Temixco)**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

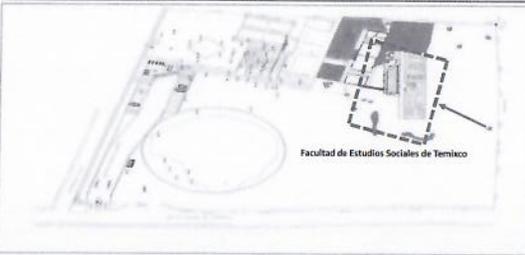

Facultad de Estudios Sociales de Temixco

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Priv. Xochicalco s/n, Col. Azteca, Temixco, Morelos.


FOTOS (ANTES)




F1: Fachada Principal.



F2: Se colocará perlas en vanos de ventanas de aulas y cubierta tipo velaria en área de adoquín.



F3: Aula tipo donde se colocaran perlas en vanos de ventanas.



F4: Área de convivencia donde se suministrará y colocará cubierta tipo velaria.

Comentarios de los trabajos realizados:

De acuerdo al oficio SE/0275/2020 signado por el Lic. Luis Arturo Cornejo Alatorre Secretario de Educación del Estado de Morelos y dirigido al Lic. José Alejandro Villalón Guaca Secretario de Hacienda, en el cual se solicita formalmente mostrar los recursos a la institución conforme al anexo 1 "propuesta para ministración de recursos FAM 2020", conforme al oficio R/195/2020. Una vez aprobada la propuesta, la institución recibió las ministraciones conforme a lo siguiente: 4 de agosto del presente recibió los recursos correspondientes a los meses de mayo y junio por un monto de \$12,862,064.50 (doce millones ochocientos sesenta y dos mil ochenta y cuatro pesos 50/100 M.N.), el 25 de agosto de 2020 se recibió la ministración correspondiente al mes de julio por un monto de \$2,148,060.75 (dos millones ciento cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta pesos 75/100 M.N.), el 29 de agosto del presente recibió la ministración correspondiente al mes de agosto por un monto de \$2,148,960.75 (dos millones ciento cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta pesos 75/100 M.N.), el 28 de septiembre del presente recibió la ministración correspondiente al mes de septiembre por un monto de \$2,148,060.75 (dos millones ciento cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta pesos 75/100 M.N.). En este mismo sentido, mediante oficio INE/EM/IV/A/424/2020 se entregan de manera física tres setos en original del Convenio de Colaboración y Ejecución del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraestructura Física Educativa de Nivel Superior 2020, y el programa de ejecución de obras, debidamente firmados por el Titular del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEEM) con la finalidad de recabar la firma del recto. Mediante oficio CG/PA/1334/2020 signado por el Dr. Álvaro Zamudio Lara Coordinador General de Planeación y Administración se hace entrega al Lic. José Ernesto Silva Bandala Director General del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEEM) un ejemplar en original debidamente firmado y rubricado del Convenio de Colaboración y Ejecución del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraestructura Física Educativa de Nivel Superior 2020 y su programa de ejecución de obras.

Mediante oficio DGF/236/2020 dirigido al Dr. Iván Elizarraraz Alvaraz, Director de Fortalecimiento Institucional de la DGE/EA, se adjunta copia simple, en versión electrónica y en PDF, del Convenio de Colaboración y Ejecución del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraestructura Física Educativa de Nivel Superior 2020 y su programa de ejecución de obras, rubricado Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEEM) y la institución.

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán  
Rector

Arq. Oscar Gabriel Lostra Fernández  
Director General de Infraestructura

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2020

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

3er Trimestre  
(Jul-Sep)

FECHA DE CORTE: 30/09/2020

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PROYECTO

4

Nombre de la obra:

Adecuación y mejoras del Campus Norte (Centro de Investigaciones Biológicas)




UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Estado de la universidad

Porcentaje de avance

0.00%

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

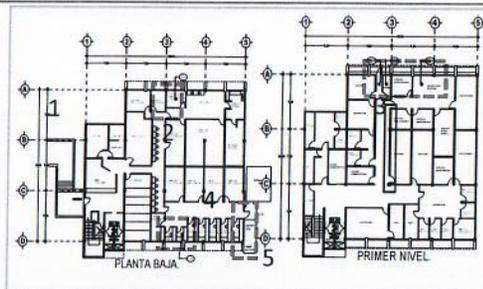

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Centro de Investigaciones Biológicas  
Av. Universidad No. 1001 Col. Chamipa, Cuernavaca, Mor. C.P.62209.

FOTOS (ANTES)



F1: Fachada Principal



F2: Áreas donde se sustituirán las lámparas existentes por luminarias ahorradoras de energía

Comentarios de los trabajos realizados:

De acuerdo al oficio SE0275/2020 signado por el Lic. Luis Arturo Cornejo Alzate Secretario de Educación del Estado de Morelos y dirigido al Lic. José Alejandro Villarreal Cacias Secretario de Hacienda, en el cual se solicita adelantamente minimizar los recursos a la institución conforme al anexo 1 "peticiones para ministración de recursos FAM 2020", conforme al oficio 01162/2020. Una vez aprobada la propuesta, la institución recibió las ministraciones conforme a lo siguiente: 4 de agosto del presente recibieron los recursos correspondientes a los meses de mayo y junio por un monto de \$12,892,884.50 (doce millones ochocientos noventa y dos mil ochenta y cuatro pesos 50/100 M.N.); el 25 de agosto de 2020 se recibió la ministración correspondiente al mes de julio por un monto de \$2,148,680.75 (dos millones ciento cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta pesos 75/100 M.N.); el 29 de agosto del presente recibió la ministración correspondiente al mes de agosto por un monto de \$2,148,680.75 (dos millones ciento cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta pesos 75/100 M.N.); el 29 de septiembre del presente recibió la ministración correspondiente al mes de setiembre por un monto de \$2,148,680.75 (dos millones ciento cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta pesos 75/100 M.N.). En este mismo sentido, mediante oficio INEEMCV/AL/04/2020 se entregan de manera física tres tantos en original del Convenio de Colaboración y Ejecución del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraestructura Física Educativa de Nivel Superior 2020 y el programa de ejecución de obras, debidamente firmados por el Titular del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEEM) con la finalidad de rescatar la firma del rector. Mediante oficio CGP/A/03/2020 signado por el Dr. Alvaro Zamudio Lara Coordinador General de Planeación y Administración se hace entrega al Lic. José Evaristo Silva Bandala Director General del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEEM) un ejemplar en original debidamente firmado y rubricado del Convenio de Colaboración y Ejecución del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraestructura Física Educativa de Nivel Superior 2020 y su programa de ejecución de obras.

Mediante oficio DGP/238/2020 dirigido al Dr. Isaias Elizarraraz Alcaraz, Director de Fortalecimiento Institucional de la DGE/SU, se solicita copia simple en versión electrónica y en PCF del Convenio de Colaboración y Ejecución del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraestructura Física Educativa de Nivel Superior 2020 y su programa de ejecución de obras, celebrado Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEEM) y la Institución.



F3: Lámparas a sustituir por luminarias ahorradoras de energía



F4: Pasillo principal hacia salida de emergencia



F5: Área exterior del edificio donde se realizarán los trabajos de adecuación de salida de emergencia

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán  
Rector

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández  
Director General de Infraestructura

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2020

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
3er Trimestre  
(Jul-Sep)

FECHA DE CORTE: 30/09/2020

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD

4



Nombre de la obra: **Adecuación y mejoras del Campus Norte (Centro de Investigaciones Biológicas) Volcanes**



Escudo de la universidad  
Porcentaje de avance

0.00%

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

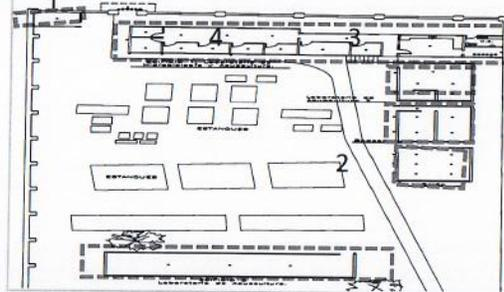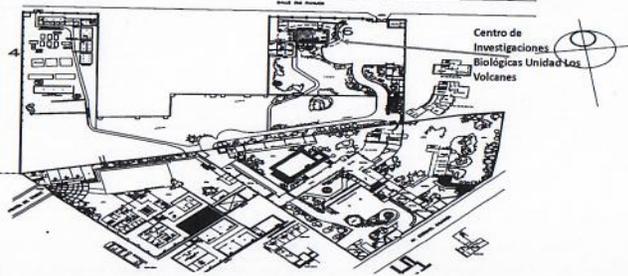

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Río Panuco 41, Vista Hermosa, 62290, Cuernavaca, Morelos.

FOTOS (ANTES)



F1: Fachada Principal



F2: Fachada Lateral



F3: Sustitución de lámparas existentes por luminarias ahorradoras de energía



F4: Sustitución de lámparas existentes por luminarias ahorradoras de energía

Comentarios de los trabajos realizados:

De acuerdo al oficio SE/0275/2020 signado por el Lic. Luis Ariuro Corrajo Alatorre Secretario de Educación del Estado de Morelos y dirigido al L.C. José Alejandro Villareal Gaxoa, Secretario de Hacienda, en el cual se solicita atentamente ministrar los recursos a la institución conforme al anexo 1 "propuesta para ministración de recursos FAM 2020", conforme al oficio R/165/2020. Una vez aprobada la propuesta, la institución recibió las ministraciones conforme a lo siguiente: 4 de agosto del presente recibieron los recursos correspondientes a los meses de mayo y junio por un monto de \$12,892,084.50 (doce millones ochocientos noventa y dos mil ochocientos y cuatro pesos 50/100 M.N.), el 25 de agosto de 2020 se recibió la ministración correspondiente al mes de julio por un monto de \$2,148,680.75 (dos millones ciento cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta pesos 75/100 M.N.), el 29 de agosto del presente recibió la ministración correspondiente al mes de agosto por un monto de \$2,148,680.75 (dos millones ciento cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta pesos 75/100 M.N.), el 29 de septiembre del presente recibió la ministración correspondiente al mes de septiembre por un monto de \$2,148,680.75 (dos millones ciento cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta pesos 75/100 M.N.). En este mismo sentido, mediante oficio INEIEMDyAL/404/2020 se entregan de manera física tres tantos en original del Convenio de Colaboración y Ejecución del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraestructura Física Educativa de Nivel Superior 2020 y el programa de ejecución de obras debidamente firmados por el Titular del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM) con la finalidad de recabar la firma del rector. Mediante oficio CGP/A/334/2020 signado por el Dr. Alvaro Zamudio Lara Coordinador General de Planeación y Administración se hace entrega al Lic. José Everisto Silva Bandala Director General del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM) un ejemplar en original debidamente firmado y rubricado del Convenio de Colaboración y Ejecución del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraestructura Física Educativa de Nivel Superior 2020 y su programa de ejecución de obras. Mediante oficio DGP/238/2020 dirigido al Dr. Iván Elizamanz Alcaraz, Director de Fortalecimiento Institucional de la DGESU, se adjunta copia simple en versión electrónica y en PDF del Convenio de Colaboración y Ejecución del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraestructura Física Educativa de Nivel Superior 2020 y su programa de ejecución de obras, celebrado Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM) y la Institución.

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán  
Rector

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández  
Director General de Infraestructura

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2020

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
3er Trimestre  
(Jul-Sep)

FECHA DE CORTE: 30/09/2020

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD 4

Nombre de la obra

Adecuación y mejoras del Campus Norte (Centro de Investigación Transdisciplinar en Psicología)




UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Estado de la universidad

Porcentaje de avance

0.00%

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

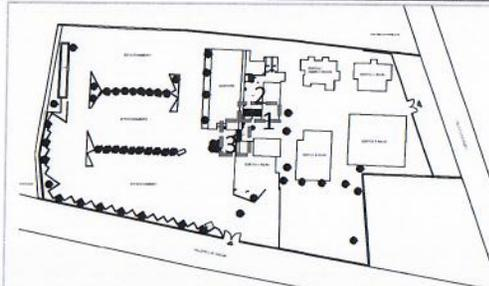

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Calle Pico de Orizaba No. 1, Col. Volcanes, Cuernavaca, Morelos, C.P. 62350

FOTOS (ANTES)



F1: Fachada Principal de acceso Auditorio - Área de fabricación de primer rampa de concreto



F2: Vestíbulo de acceso -Intercomunicación con rampa hacia auditorio



F3: Área de construcción de segunda rampa de acceso a vestibulo de auditorio.

Comentarios de los trabajos realizados:

De acuerdo al oficio SE/0275/2020 signado por el Lic. Luis Arturo Correo Alatorre Secretario de Educación del Estado de Morelos y dirigido al L.C. José Alejandro Villarreal Gazca, Secretario de Hacienda, en el cual se solicita atentamente ministrar los recursos a la institución conforme al anexo 1 "propuesta para ministración de recursos FAM 2020", conforme al oficio R/165/2020. Una vez aprobada la propuesta, la institución recibió las ministraciones conforme a lo siguiente: 4 de agosto del presente se recibieron los recursos correspondientes a los meses de mayo y junio por un monto de \$12,892,084.50 (doce millones ochocientos noventa y dos mil ochenta y cuatro pesos 50/100 M.N.), el 25 de agosto de 2020 se recibió la ministración correspondiente al mes de julio por un monto de \$2,148,680.75 (dos millones ciento cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta pesos 75/100 M.N.), el 29 de agosto del presente recibió la ministración correspondiente al mes de agosto por un monto de \$2,148,680.75 (dos millones ciento cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta pesos 75/100 M.N.), el 29 de septiembre del presente recibió la ministración correspondiente al mes de septiembre por un monto de \$2,148,680.75 (dos millones ciento cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta pesos 75/100 M.N.). En este mismo sentido, mediante oficio INEEM/DV/AL/404/2020 se entregan de manera física tres tantos en original del Convenio de Colaboración y Ejecución del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraestructura Física Educativa de Nivel Superior 2020 y el programa de ejecución de obras, debidamente firmados por el Titular del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEEM) con la finalidad de recabar la firma del rector. Mediante oficio CIG/VA/334/2020 signado por el Dr. Alvaro Zamudio Lara Coordinador General de Planeación y Administración se hace entrega al Lic. José Evaristo Silva Bandala Director General del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEEM) un ejemplar en original debidamente firmado y rubricado del Convenio de Colaboración y Ejecución del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraestructura Física Educativa de Nivel Superior 2020 y su programa de ejecución de obras, celebrado Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEEM) y la institución. Mediante oficio DGPI/238/2020 dirigido al Dr. Isaias Elizarraraz Alcaraz, Director de Fortalecimiento Institucional de la DQESUL se adjunta copia simple en versión electrónica y en PDF del Convenio de Colaboración y Ejecución del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraestructura Física Educativa de Nivel Superior 2020 y su programa de ejecución de obras, celebrado Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEEM) y la institución.

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán  
Rector

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández  
Director General de Infraestructura

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2020

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

3er Trimestre  
(Jul-Sep)

FECHA DE CORTE: 30/09/2020

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



PRIMORDIAL

4

Nombre de la obra

Adecuación y mejoras del Campus Norte (Biblioteca Central Universitaria)

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

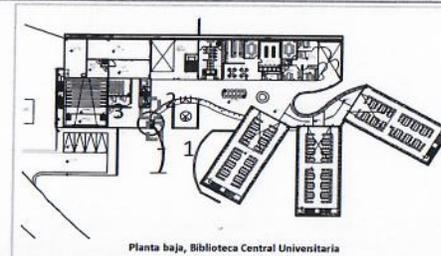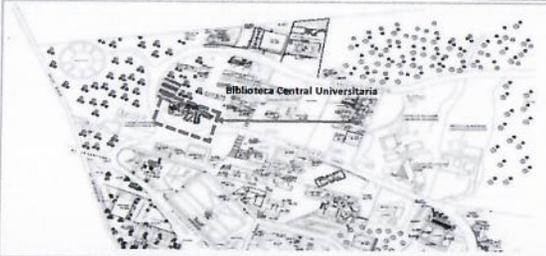

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa,  
Cuernavaca, Mor., C.P.62209.



Estado de la universidad

Porcentaje de avance

0.00%


FOTOS (ANTES)



F1: Fachada Principal. Se colocará rejilla pluvial en el acceso, se instalará la puerta de acceso y se hará muro de mampostería.



F2: Se colocará puerta plegable de aluminio.

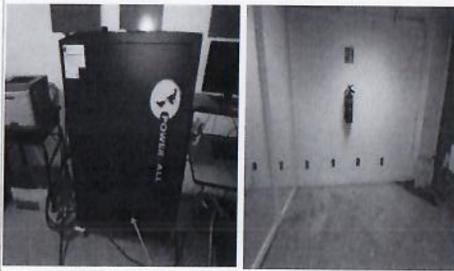

F3: Puesto en marcha de UPS, cambio de baterías.

Comentarios de los trabajos realizados:

De acuerdo al oficio 66/276/2020 signedo por el Lic. Luis Arturo Conejo Abrego, Secretario de Educación del Estado de Morelos y dirigido al Lic. José Algodón Villanar García, Secretario de Hacienda, en el cual se solicita adelantamente mostrar los recursos a la institución conforme al anexo 1 "propuesta para ministración de recursos FAM 2020" conforme al oficio 04/153/2020. Una vez aprobada la propuesta, la institución recibió las ministraciones conforme a la siguiente: 4 de agosto del presente recibieron los recursos correspondientes a los meses de mayo y junio por un monto de \$12,652,084.50 (doce millones ochocientos sesenta y dos mil ochenta y cuatro pesos 50/100 M.N.), el 25 de agosto de 2020 se recibió la ministración correspondiente al mes de julio por un monto de \$2,148,690.75 (dos millones seiscientos cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta pesos 75/100 M.N.), el 29 de agosto del presente recibió la ministración correspondiente al mes de agosto por un monto de \$2,148,690.75 (dos millones seiscientos cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta pesos 75/100 M.N.), el 30 de septiembre del presente recibió la ministración correspondiente al mes de septiembre por un monto de \$2,148,690.75 (dos millones seiscientos cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta pesos 75/100 M.N.). En este mismo sentido, mediante oficio INEEM/04/14/24/2020 se entregan de manera física tres tantos en original del Convenio de Colaboración y Ejecución del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraestructura Física Educativa de Nivel Superior 2020 y el programa de ejecución de obras, debidamente firmados por el Titular del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEEM) con la finalidad de recabar la firma del sector. Mediante oficio CGP/A/34/2020 signedo por el Dr. Álvaro Zamudio Lara, Coordinador General de Planeación y Administración se hace entrega al Lic. José Evaristo Silva Bernalde, Director General del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEEM) en su componente de Infraestructura Física Educativa de Nivel Superior 2020 y su programa de ejecución de obras.

Mediante oficio DGP/236/2020 signedo al Dr. Isaías Elizarraraz Albaraz, Director de Fortalecimiento Institucional de la DGE/SU, se adjunta copia simple en versión electrónica y en PDF del Convenio de Colaboración y Ejecución del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraestructura Física Educativa de Nivel Superior 2020 y su programa de ejecución de obras, celebrado Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEEM) y la institución.

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán  
Rector

Arq. César Gabriel Lastra Fernández  
Director General de Infraestructura

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

**2020**  
AÑO

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA



Mes reportado  
**3er Trimestre**  
**(Jul-Sep)**  
FECHA DE CORTE: 30/09/2020

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



**0.00%**

PRIORIDAD **4** Nombre de la obra: **Adecuación y mejoras del Campus Norte (Biblioteca Central Universitaria)**

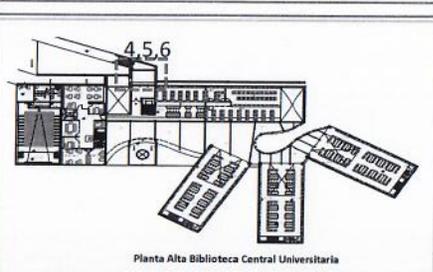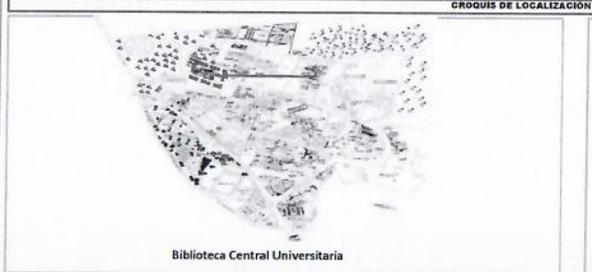


FOTOS (ANTES)



1.- Fachada Principal



4.- En el acceso norte [acceso a segunda planta por estacionamiento] se sustituirá cancel existente

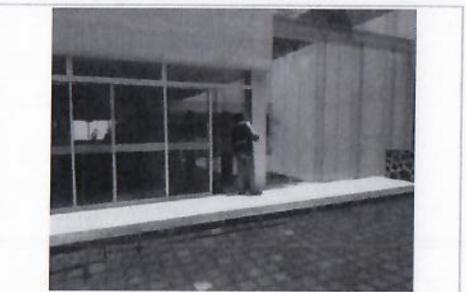

5.- En el acceso norte [acceso a segunda planta por estacionamiento] se colocará rejilla plástica, se sustituirá cancel existente y se construirá rampa de acceso.



6.- Retiro de cancel existente en acceso norte.

**Comentarios de los trabajos realizados:**  
De acuerdo al oficio SE/07/9/2020 seguido por el Lic. Luis Arturo Cornejo Alonso Secretario de Educación del Estado de Morelos y dirigido al Lic. José Alejandro Villarreal Cabza Secretario de Hacienda, en el cual se solicita abundantemente mostrar los recursos a la institución conforme al anexo 1 "propuesta para renovación de recursos FAM 2020" conforme al oficio R/19/5/2020. Una vez agendada la propuesta, la institución recibió las ministraciones conforme a la siguiente: 4 de agosto del presente se recibieron las ministraciones correspondientes a los meses de mayo y junio por un monto de \$12,932,004.50 (doce millones ochocientos noventa y dos mil ochocientos cuatro pesos 00/100 M.N.), el 25 de agosto de 2020 se recibió la ministración correspondiente al mes de julio por un monto de \$2,148,680.75 (dos millones ciento cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta pesos 75/100 M.N.), el 29 de agosto del presente recibió la ministración correspondiente al mes de agosto por un monto de \$2,148,680.75 (dos millones ciento cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta pesos 75/100 M.N.), el 29 de septiembre del presente recibió la ministración correspondiente al mes de septiembre por un monto de \$2,148,680.75 (dos millones ciento cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta pesos 75/100 M.N.). En este mismo sentido, mediante oficio INEEM/DYAL/AG/02/20 se entregan de manera física tres tantos en original del Convenio de Colaboración y Ejecución del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraestructura Física Educativa de Nivel Superior 2020 y el programa de ejecución de obras, debidamente firmados por el Titular del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEEM) con la finalidad de recibir la firma del rector. Mediante oficio C2P/AM/3/02/20 seguido por el Dr. Alvaro Zamudio Lara Coordinador General de Planeación y Administración se hace entrega al Lic. José Evaristo Silva Bantala Director General del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEEM) un escrito en original debidamente firmado y rubricado del Convenio de Colaboración y Ejecución del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraestructura Física Educativa de Nivel Superior 2020 y su programa de ejecución de obras. Mediante oficio DGR/238/2020 dirigido al Dr. Isaias Ekzamaraz Alcaraz, Director de Fortalecimiento Institucional de la DGBSU, se adjunta copia simple en versión electrónica y en PDF del Convenio de Colaboración y Ejecución del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraestructura Física Educativa de Nivel Superior 2020 y su programa de ejecución de obras, celebrado Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEEM) y la Institución.

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán  
Rector

Arg. Oscar Gabriel Lastra Fernández  
Director General de Infraestructura

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2020

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**3er Trimestre  
(Jul-Sep)**  
FECHA DE CORTE: 30/09/2020

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIOIDAD

5

Nombre de la obra: **Adecuación y mejoras Zona Oriente (Escuela de Estudios Superiores de Axochiapan)**



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Escudo de la universidad


Porcentaje de avance

0.00%

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



Escuela de Estudios Superiores de Axochiapan

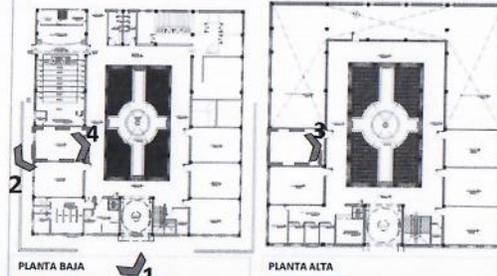

PLANTA BAJA

PLANTA ALTA


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Libramiento San Pablo S/N, municipio de Axochiapan, Estado de Morelos. C.P. 62954.


FOTOS (ANTES)



F1: Escuela de Estudios Superiores de Axochiapan.

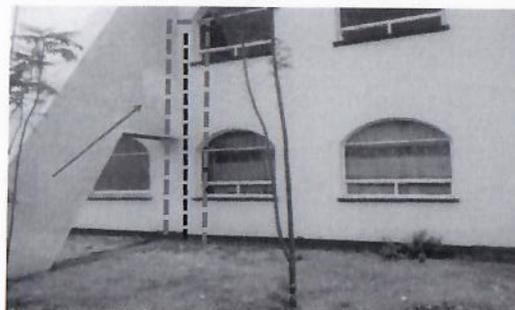

F2: Bajadas y línea de Instalaciones Hidrosanitarias.

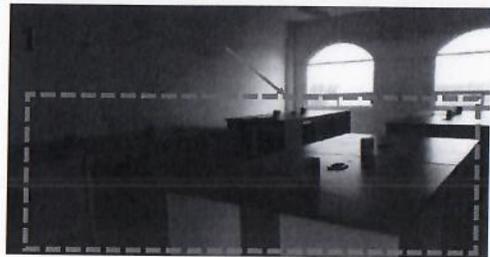

F3: Movimiento de Mesas de laboratorio para colocación de instalaciones hidrosanitarias y eléctricas.



F4: Se interviene planta baja para colocación de Instalaciones Hidrosanitarias.

Comentarios de los trabajos realizados:

De acuerdo al oficio SE/0275/2020 signado por el Lic. Luis Arturo Cornejo Alatorre Secretario de Educación del Estado de Morelos y dirigido al L.C. José Alejandro Villarreal Glezca, Secretario de Hacienda, en el cual se solicita atentamente ministrar los recursos a la institución conforme al anexo 1 "propuesta para ministración de recursos FAM 2020", conforme al oficio R/165/2020. Una vez aprobada la propuesta, la institución recibió las ministraciones conforme a lo siguiente: 4 de agosto del presente recibieron los recursos correspondientes a los meses de mayo y junio por un monto de \$12,892,084.50 (doce millones ochocientos noventa y dos mil ochenta y cuatro pesos 50/100 M.N.), el 25 de agosto de 2020 se recibió la ministración correspondiente al mes de julio por un monto de \$2,148,680.75 (dos millones ciento cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta pesos 75/100 M.N.), el 29 de agosto del presente recibió la ministración correspondiente al mes de agosto por un monto de \$2,148,680.75 (dos millones ciento cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta pesos 75/100 M.N.), el 29 de septiembre del presente recibió la ministración correspondiente al mes de septiembre por un monto de \$2,148,680.75 (dos millones ciento cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta pesos 75/100 M.N.). En este mismo sentido, mediante oficio INEIEI/DV/AL/404/2020 se entregan de manera física tres tantos en original del Convenio de Colaboración y Ejecución del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraestructura Física Educativa de Nivel Superior 2020 y el programa de ejecución de obras debidamente firmados por el Titular del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM) con la finalidad de recibir la firma del rector; Mediante oficio CGPyA/334/2020 signado por el Dr. Akaro Zamudio Lara Coordinador General de Planeación y Administración se hace entrega al Lic. José Evaristo Silva Bandala Director General del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM) un ejemplar en original debidamente firmado y rubricado del Convenio de Colaboración y Ejecución del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraestructura Física Educativa de Nivel Superior 2020 y su programa de ejecución de obras.

Mediante oficio DGPI/238/2020 dirigido al Dr. Isaias Elizarraraz Alcaraz, Director de Fortalecimiento Institucional de la DGESUII se adjunta copia simple en versión electrónica y en PDF del Convenio de Colaboración y Ejecución del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraestructura Física Educativa de Nivel Superior 2020 y su programa de ejecución de obras, celebrado Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM) y la institución.

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán  
Rector

Dr. Oscar Gabriel Lastra Fernández  
Director General de Infraestructura

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2020

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
3er Trimestre  
(Jul-Sep)  
FECHA DE CORTE: 30/09/2020

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD

5

Nombre de la obra: **Adecuación y mejoras Zona Oriente (Estudios Superiores de Tétela del Volcán)**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN




Escudo de la universidad  
Porcentaje de avance

0.00%



Escuela de Estudios Superiores de Tétela del Volcán.




UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Estudios Superiores de Tétela del Volcán.

Calle 24 de febrero No. 7, Barrio Santiago, C.P. 62520,  
Tétela del Volcán, Morelos.


FOTOS (ANTES)

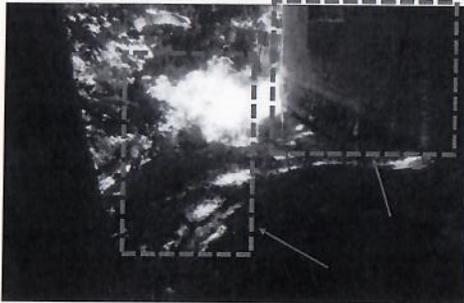


F1: Elaboración de muro de contención y demolición de muros de tabique



F2: Elaboración de muro de contención y suministro y colocación de protecciones de herrería.

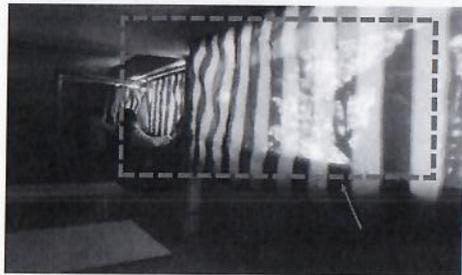

F3: suministro y colocación de protecciones de herrería.

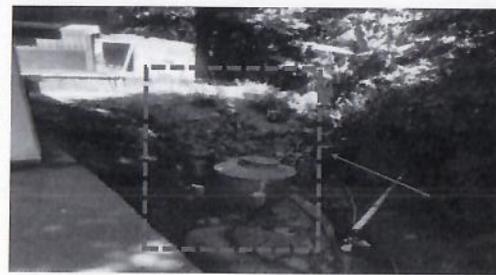

F4: -Fabricación de muro de contención.

Comentarios de los trabajos realizados:

De acuerdo al oficio SEIG/75/2020 signado por el Lic. Luis Arturo Camejo Alarcón Secretario de Educación del Estado de Morelos y dirigido al Lic. José Alejandro Villareal Castro, Secretario de Hacienda, en el cual se solicita abundantemente ministrar los recursos a la institución conforme al anexo 1 propuesta para ministración de recursos FAM 2020, conforme al oficio R/165/2020. Una vez periclitada la propuesta, la institución recibió las ministraciones conforme a lo siguiente: 4 de agosto del presente se recibieron los recursos correspondientes a los meses de mayo y junio por un monto de \$12,892,084.50 (doce millones ochocientos noventa y dos mil ochenta y cuatro pesos 50/100 M.N.); el 22 de agosto de 2020 se recibió la ministración correspondiente al mes de julio por un monto de \$2,148,660.75 (dos millones ciento cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta pesos 75/100 M.N.); el 29 de agosto del presente recibió la ministración correspondiente al mes de agosto por un monto de \$2,148,660.75 (dos millones ciento cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta pesos 75/100 M.N.); el 28 de septiembre del presente recibió la ministración correspondiente al mes de septiembre por un monto de \$2,148,660.75 (dos millones ciento cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta pesos 75/100 M.N.). En este mismo sentido, mediante oficio INEIE/MDV/AL/404/2020 se entregó de manera física tres tantos en original del Convenio de Colaboración y Ejecución del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraestructura Física Educativa de Nivel Superior (2020) y el programa de ejecución de obras decididamente firmados por el Titular del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM) con la finalidad de recabar la firma del rector. Mediante oficio CGP/A/234/02/20 signado por el Dr. Alvaro Zamudio Lara Coordinador General de Planeación y Administración se hace entrega al Lic. José Evaristo Silva Baranda Director General del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM) un ejemplar en original debidamente firmado y rubricado del Convenio de Colaboración y Ejecución del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraestructura Física Educativa de Nivel Superior 2020 y su programa de ejecución de obras.

Mediante oficio DGF/2/38/02/20 dirigido al Dr. Ismael Elizarraraz Albaraz, Director de Fortalecimiento Institucional de la DDES/US, se adjunta copia simple en versión electrónica y en PDF, del Convenio de Colaboración y Ejecución del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraestructura Física Educativa de Nivel Superior 2020 y su programa de ejecución de obras, celebrado Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM) y la Institución.

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán  
Rector

Arq. Óscar Gabriel Lastra Fernández  
Director General de Infraestructura

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2020

FAM

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
3er Trimestre  
(Jul-Sep)  
FECHA DE CORTE: 30/09/2020

AÑO

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRORIDAD

5

Nombre de la obra: **Adecuación y mejoras Zona Oriente (Escuela de Estudios Superiores de Tototapan)**



Escuela de la universidad


Porcentaje de avance

0.00%

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN




ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TOTOTAPAN

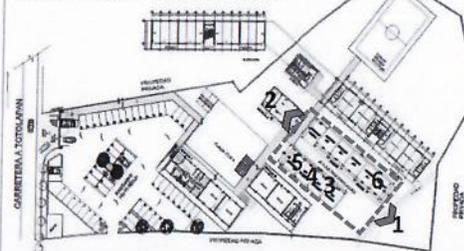

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Avenida Miguel Hidalgo S/N, Colonia Ahuatlán en el Municipio de Tototapan Morelos, C.P. 62834.

FOTOS (ANTES)

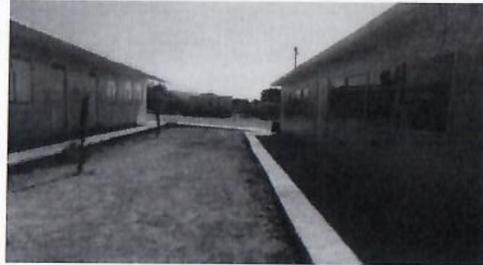

F1: Fachadas de edificios donde se realizaran los trabajos - Escuela de Estudios Superiores de Tototapan.



F2: Fachada este de edificio donde se realizaran los trabajos - Escuela de Estudios Superiores de Tototapan.

Comentarios de los trabajos realizados:

De acuerdo al oficio SE0275/2020 signado por el Lic. Luis Antre Cornejo Alatorre Secretario de Educación del Estado de Morelos y dirigido al L.C. José Alejandro Villareal Gazca, Secretario de Hacienda, en el cual se solicita atentamente ministrar los recursos a la institución conforme al anexo 1 "propuesta para ministración de recursos FAM 2020", conforme al oficio R/105/2020. Una vez aprobada la propuesta, la institución recibió las ministraciones conforme a lo siguiente: A 26 de agosto del presente recibieron los recursos correspondientes a los meses de mayo y junio por un monto de \$12,892,084.50 (doce millones ochocientos noventa y dos mil ochenta y cuatro pesos 50/100 M.N.), el 25 de agosto de 2020 se recibió la ministración correspondiente al mes de julio por un monto de \$2,148,680.75 (dos millones ciento cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta pesos 75/100 M.N.), el 23 de agosto del presente recibió la ministración correspondiente al mes de agosto por un monto de \$2,148,680.75 (dos millones ciento cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta pesos 75/100 M.N.), el 29 de septiembre del presente recibió la ministración correspondiente al mes de septiembre por un monto de \$2,148,680.75 (dos millones ciento cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta pesos 75/100 M.N.). En este mismo sentido, mediante oficio INEEM/DV/AL/44/2020 se entregan de manera física tres tantos en original del Convenio de Colaboración y Ejecución del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraestructura Física Educativa de Nivel Superior 2020 y el programa de ejecución de obras debidamente firmados por el Titular del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEEM) con la finalidad de recabar la firma del rector. Mediante oficio CGPyA/034/2020 signado por el Dr. Alvaro Zamudio Lara Coordinador General de Planeación y Administración se hace entrega al Lic. José Everardo Silva Bandala Director General del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEEM) un ejemplar en original debidamente firmado y rubricado del Convenio de Colaboración y Ejecución del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraestructura Física Educativa de Nivel Superior 2020 y su programa de ejecución de obras, celebrado Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEEM) y la institución.



F3: Nivelación y colocación de piso de loseta cerámica esmaltado.



F4: Nivelación y colocación de piso de loseta cerámica esmaltado.

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán  
Rector

Dr. Oscar Gabriel Lastra Fernández  
Director General de Infraestructura

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2020

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
3er Trimestre  
(Jul-Sep)  
FECHA DE CORTE: 30/09/2020

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD 5

Nombre de la obra: **Adecuación y mejoras Zona Oriente (Escuela de Estudios Superiores de Yecapixtla)**



Escudo de la universidad

Porcentaje de avance

0.00%

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Avenida Félix Arias, quinta de los Amates,  
Municipio de Yecapixtla, en el Estado de Morelos.

FOTOS (ANTES)



NOTA: Actualmente el área es utilizada como bodega.

F1: Adecuación de modulo de sanitarios.



F2: Elaboración de Cisterna con capacidad de 20m3.



NOTA: Actualmente el área es utilizada como bodega.

F3: Adecuación de modulo de sanitarios.



F4: Elaboración de Cisterna con capacidad de 20m3.

Comentarios de los trabajos realizados:

De acuerdo al oficio SE-0275/2020 signado por el Lic. Luis Arturo Comejo Alvarado Secretario de Educación del Estado de Morelos y dirigido al L.C. José Alejandro Villareal Gazca, Secretario de Hacienda, en el cual se solicita atentamente ministrar los recursos a la institución conforme al anexo 1 "propuesta para ministración de recursos FAM 2020", conforme al oficio R/165/2020. Una vez aprobada la propuesta, la institución recibió las ministraciones conforme a lo siguiente: 4 de agosto del presente recibieron los recursos correspondientes a los meses de mayo y junio por un monto de \$13,692,694.50 (trece millones ochocientos noventa y dos mil ochenta y cuatro pesos 50/100 M.N.), el 25 de agosto de 2020 se recibió la ministración correspondiente al mes de julio por un monto de \$2,148,680.75 (dos millones ciento cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta pesos 75/100 M.N.), el 29 de agosto del presente recibió la ministración correspondiente al mes de agosto por un monto de \$2,148,680.75 (dos millones ciento cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta pesos 75/100 M.N.), el 29 de septiembre del presente recibió la ministración correspondiente al mes de septiembre por un monto de \$2,148,680.75 (dos millones ciento cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta pesos 75/100 M.N.).

En este mismo sentido, mediante oficio INEIAM/DIYAL/404/2020 se entregan de manera física tres tantos en original del Convenio de Colaboración y Ejecución del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraestructura Física Educativa de Nivel Superior 2020 y el programa de ejecución de obras debidamente firmados por el Titular del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM) con la finalidad de recabar la firma del rector.

Mediante oficio COPYA/334/2020 signado por el Dr. Alvaro Zamudio Lara Coordinador General de Planeación y Administración se hace entrega al Lic. José Everisto Sáez Bandala Director General del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM) un ejemplar en original debidamente firmado y rubricado del Convenio de Colaboración y Ejecución del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraestructura Física Educativa de Nivel Superior 2020 y su programa de ejecución de obras.

Mediante oficio DGPI/238/2020 dirigido al Dr. Isaias Ekzamarán Alcaraz, Director de Fortalecimiento Institucional de la DGESE, se adjunta copia simple en versión electrónica y en PDF del Convenio de Colaboración y Ejecución del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraestructura Física Educativa de Nivel Superior 2020 y su programa de ejecución de obras, celebrado Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM) y la Institución.

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán  
Rector

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández  
Director General de Infraestructura

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2020

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**3er Trimestre**  
**(Jul-Sep)**  
FECHA DE CORTE: 30/09/2020

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL


PRORIDAD

6

Nombre de la obra:

**Mantenimiento del Campus Sur/Poniente (Escuela de Estudios Superiores de Miacatlán)**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

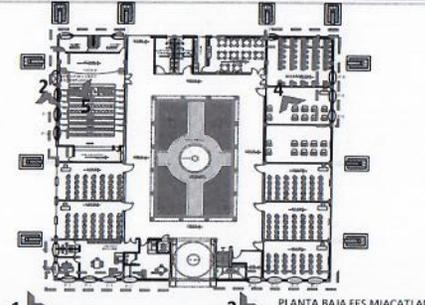

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Alpuyeca - Grutas S/N Col. La Toma,  
Miacatlán, Morelos. C.P. 62605.



Escuela de la universidad

Porcentaje de avance

0.00%

FOTOS (ANTES)



1.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES DE HERRERÍA.



2.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES DE HERRERÍA.

Comentarios de los trabajos realizados:

De acuerdo al oficio SE/0275/2020 signado por el Lic. Luis Arturo Comejo Alatorre Secretario de Educación del Estado de Morelos y dirigido al L.C. José Alejandro Vilarreal Gazca, Secretario de Hacienda, en el cual se solicita atentamente ministrar los recursos a la institución conforme al anexo 1 "propuesta para ministración de recursos FAM 2020", conforme al oficio R/165/2020. Una vez aprobada la propuesta, la institución recibió las ministraciones conforme a lo siguiente: 4 de agosto del presente se recibieron los recursos correspondientes a los meses de mayo y junio por un monto de \$12,892,064.50 (doce millones ochocientos noventa y dos mil ochenta y cuatro pesos 50/100 M.N.), el 25 de agosto de 2020 se recibió la ministración correspondiente al mes de julio por un monto de \$2,148,680.75 (dos millones ciento cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta pesos 75/100 M.N.), el 28 de agosto del presente recibió la ministración correspondiente al mes de agosto por un monto de \$2,148,680.75 (dos millones ciento cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta pesos 75/100 M.N.), el 29 de septiembre del presente recibió la ministración correspondiente al mes de septiembre por un monto de \$2,148,680.75 (dos millones ciento cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta pesos 75/100 M.N.).


En este mismo sentido, mediante oficio INEIE/IDYAL/404/2020 se entregó de manera física tres tantos en original del Convenio de Colaboración y Ejecución del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraestructura Física Educativa de Nivel Superior 2020 y el programa de ejecución de obras debidamente firmados por el Titular del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM) con la finalidad de recabar la firma del rector.

Mediante oficio CGPyA/334/2020 signado por el Dr. Alvaro Zamudio Lara Coordinador General de Planeación y Administración se hace entrega al Lic. José Evaristo Silva Bernaldo Director General del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM) un ejemplar en original debidamente firmado y rubricado del Convenio de Colaboración y Ejecución del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraestructura Física Educativa de Nivel Superior 2020 y su programa de ejecución de obras.

Mediante oficio DGP/238/2020 dirigido al Dr. Isaias Elizarraraz Alcaraz, Director de Fortalecimiento Institucional de la DGE/SUI, se adjunta copia simple en versión electrónica y en PDF del Convenio de Colaboración y Ejecución del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraestructura Física Educativa de Nivel Superior 2020 y su programa de ejecución de obras, celebrado Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM) y la Institución.



3.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES DE HERRERÍA EN VANOS DE FACHADAS P.B.

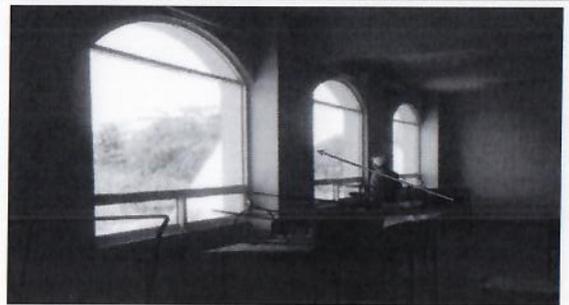

4.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES DE HERRERÍA.



5.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES DE HERRERÍA Y PUERTA DE EMERGENCIA

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán  
Rector

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández  
Director General de Infraestructura

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2020

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
3er Trimestre  
(Jul-Sep)

FECHA DE CORTE: 30/09/2020

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRICRIDAD

6

Nombre de la obra:

Mantenimiento del Campus Sur/Poniente ( Escuela de Estudios Superiores de Tetecala)

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TETECALA



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Av. Lazaro Cardenas, Esquina con Altamirano S/N, colonia centro C.P. 62620 en el Municipio de Tetecala, Morelos.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Estado de la universidad

Porcentaje de avance

0.00%

FOTOS (ANTES)



F1: Colocación de Protecciones de herreria en ventanas, Fachada Principal.



F2: Colocación de Protecciones de herreria en ventanas, Fachada Lateral.



F3: Mantenimiento a puertas existentes, Planta Baja.



F4: Mantenimiento a puertas existentes, Planta Baja.



F5: Mantenimiento a puertas existentes, Planta Alta.

Comentarios de los trabajos realizados:

De acuerdo al oficio SEIG/275/2020 signado por el Lic. Luis Arturo Comego Alatorre Secretario de Educación del Estado de Morelos y dirigido al L.C. José Alejandro Viterod Gaxca, Secretario de Hacienda, en el cual se solicita atentamente ministrar los recursos a la institución conforme al anexo 1 "propuesta para ministración de recursos FAM 2020" conforme al oficio R/195/2020. Una vez aprobada la propuesta, la institución recibió las ministraciones conforme a lo siguiente: 4 de agosto del presente, recibieron los recursos correspondientes a los meses de mayo y junio, por un monto de \$12,802,084.50 (doce millones ochocientos noventa y dos mil ochenta y cuatro pesos 50700 M.N.), el 25 de agosto de 2020 se recibió la ministración correspondiente al mes de julio por un monto de \$2,148,680.75 (dos millones ciento cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta pesos 75100 M.N.), el 29 de agosto del presente recibió la ministración correspondiente al mes de septiembre por un monto de \$2,148,680.75 (dos millones ciento cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta pesos 75100 M.N.). En este mismo sentido, mediante oficio INEEM/CM/ALM/4/2020 se entregaron de manera física tres tantos en original del Convenio de Colaboración y Ejecución del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraestructura Física Educativa de Nivel Superior 2020 y el programa de ejecución de obras debidamente firmados por el Titular del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEEM) con la finalidad de recibir la firma del rector. Mediante oficio CGPA/234/2020 signado por el Dr. Alvaro Zamudio Lara Coordinador General de Planeación y Administración se hace entrega al Lic. José Everardo Silva Sánchez Director General del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEEM) un ejemplar en original debidamente firmado y rubricado del Convenio de Colaboración y Ejecución del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraestructura Física Educativa de Nivel Superior 2020 y su programa de ejecución de obras, celebrado Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEEM) y la Institución. Mediante oficio DGPI/238/2020 dirigido al Dr. Isaias Elizarraraz Albaraz, Director de Fortalecimiento Institucional de la DGERUJ, se adjunta copia simple, en versión electrónica y en PDF, del Convenio de Colaboración y Ejecución del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraestructura Física Educativa de Nivel Superior 2020 y su programa de ejecución de obras, celebrado Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEEM) y la Institución.

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán  
Rector

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández  
Director General de Infraestructura

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2020

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
3er Trimestre  
(Jul-Sep)

FECHA DE CORTE: 30/09/2020

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL




UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Escudo de la universidad  
Porcentaje de avance

0.00%

Nombre de la obra: **Mantenimiento del Campus Sur/Poniente (Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec)**

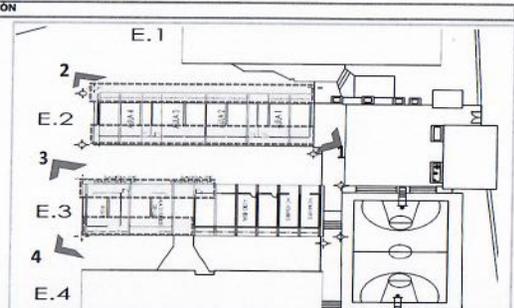

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO  
Subida al Calvario S/N, Col. Justo Sierra, Mazatepec, Morelos.

FOTOS (ANTES)



F1: Desmontaje de ventanas, suministro y colocación de cancelería de aluminio, desmontaje de puertas, suministro, armado y colocación de multy-puerta. Edificio 2



F2: Desmontaje de ventanas, suministro y colocación de cancelería de aluminio. Edificio 2



F3: Desmontaje de ventanas, suministro y colocación de cancelería de aluminio, desmontaje de puertas, suministro, armado y colocación de multy-puerta y puerta de emergencia en sala de juicios orales y auditorio. Edificio 3



F4: Desmontaje de ventanas, suministro y colocación de cancelería de aluminio. Edificio 3

Comentarios de los trabajos realizados:

De acuerdo al oficio SE/0275/2020 signado por el Lic. Luis Arturo Conejo Alatorre Secretario de Educación del Estado de Morelos y dirigido al Lic. José Alejandro Villarreal García, Secretario de Hacienda, en el cual se solicita atentamente ministrar los recursos a la institución, conforme al anexo 1 "propuesta para ministración de recursos FAM 2020", conforme al oficio R/195/2020. Una vez aprobada la propuesta, la institución recibió las ministraciones conforme a lo siguiente: 4 de agosto del presente recibieron los recursos correspondientes a los meses de mayo y junio por un monto de \$12,892,084.50 (doce millones ochocientos noventa y dos mil ochenta y cuatro pesos 50/100 M.N.); el 25 de agosto de 2020 se recibió la ministración correspondiente al mes de julio por un monto de \$2,148,680.75 (dos millones ciento cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta pesos 75/100 M.N.); el 29 de agosto del presente recibió la ministración correspondiente al mes de agosto por un monto de \$2,148,680.75 (dos millones ciento cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta pesos 75/100 M.N.); el 29 de septiembre del presente recibió la ministración correspondiente al mes de septiembre por un monto de \$2,148,680.75 (dos millones ciento cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta pesos 75/100 M.N.). En este mismo sentido, mediante oficio INEEM/DVYA/404/2020 se entregan de manera física tres ejemplares en original del Convenio de Colaboración y Ejecución del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraestructura Física Educativa de Nivel Superior 2020 y el programa de ejecución de obras debidamente firmados por el Titular del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM) con la finalidad de recabar la firma del rector. Mediante oficio CGPyA/334/2020 signado por el Dr. Alvaro Zamudio Lara Coordinador General de Planeación y Administración se hace entrega al Lic. José Evaristo Silva Bandala Director General del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM) un ejemplar en original debidamente firmado y rubricado del Convenio de Colaboración y Ejecución del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraestructura Física Educativa de Nivel Superior 2020 y su programa de ejecución de obras.

Mediante oficio DGP/238/2020 dirigido al Dr. Justo Elzamaraz Alcaraz, Director de Fortalecimiento Institucional de la DGE/SUR, se adjunta copia simple en versión electrónica y en PDF del Convenio de Colaboración y Ejecución del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraestructura Física Educativa de Nivel Superior 2020 y su programa de ejecución de obras, celebrado Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM) y la Institución.

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán  
Rector

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández  
Director General de Infraestructura

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2020

AÑO

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**3er Trimestre**  
**(Jul-Sep)**  
FECHA DE CORTE: 30/09/2020

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Escudo de la universidad  
Porcentaje de avance

**0.00%**

PRORIDAD

6


Nombre de la obra

**Mantenimiento del Campus Sur/Poniente (Escuela de Estudios Superiores de Jojutla)**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN




UBICACIÓN ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE JOJUTLA

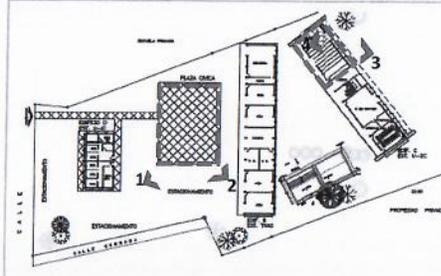


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Av. 18 de Marzo 617, Centro, 62900 Jojutla de Juárez, Mor.

FOTOS (ANTES)

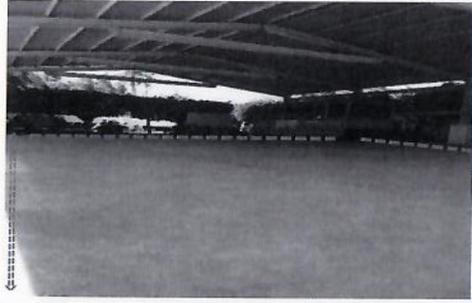

F1: Fabricación de firme de concreto, Plaza Cívica

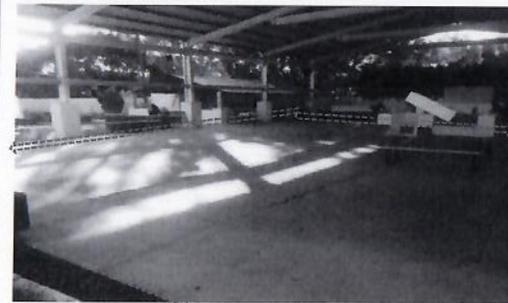

F2: Trazo, plicoteo de concreto, Fabricación de firme de concreto, corte con disco y calafateo, Plaza Cívica.



F3: Excavación, impermeabilización de cimentación, relleno de material inerte Auditorio.



F4: Demolición de concreto, desmontaje y montaje de butacas, excavación, suministro y colocación de material inerte, membrana plástica, firme, Auditorio.




Comentarios de los trabajos realizados:

De acuerdo al oficio SEP/075/2020 signado por el Lic. Luis Arturo Cornejo Alatorre Secretario de Educación del Estado de Morelos y dirigido al Lic. José Alejandro Villareal Gasca, Secretario de Hacienda, en el cual se solicita urgentemente ministrar los recursos a la institución conforme al anexo 1 (propuesta para ministración de recursos FAM 2020), conforme al oficio R/165/2020. Una vez aprobada la propuesta, la institución recibió las ministraciones conforme a lo siguiente: 4 de agosto del presente recibieron los recursos correspondientes a los meses de mayo y junio por un monto de \$12,892,064.50 (doce millones ochocientos noventa y dos mil ochenta y cuatro pesos 50/100 M.N.), el 25 de agosto de 2020 se recibió la ministración correspondiente al mes de julio por un monto de \$2,148,680.75 (dos millones ciento cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta pesos 75/100 M.N.), el 29 de agosto del presente recibió la ministración correspondiente al mes de agosto por un monto de \$2,148,680.75 (dos millones ciento cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta pesos 75/100 M.N.), el 29 de septiembre por un monto de \$2,148,680.75 (dos millones ciento cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta pesos 75/100 M.N.). En este mismo sentido, mediante oficio INEIE/MDV/A/04/2020 se entregan de manera física tres tantos en original del Convenio de Colaboración y Ejecución del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraestructura Física Educativa de Nivel Superior 2020, y el programa de ejecución de obras, debidamente firmados por el Titular del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM) con la finalidad de recabar la firma del rector. Mediante oficio CGP/A/334/2020 signado por el Dr. Alvaro Zamudio Lara, Coordinador General de Planeación y Administración se hace entrega al Lic. José Fernando Rivas Baniola Director General del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM) un ejemplar en original debidamente firmado y rubricado del Convenio de Colaboración y Ejecución del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraestructura Física Educativa de Nivel Superior 2020 y su programa de ejecución de obras. Mediante oficio DGF/0238/2020 dirigido al Dr. Isaias Elizarraraz Alcaraz, Director de Fortalecimiento Institucional de la DGE/SU, se adjunta copia simple en versión electrónica y en PDF del Convenio de Colaboración y Ejecución del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraestructura Física Educativa de Nivel Superior 2020 y su programa de ejecución de obras, celebrado Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos, (INEIEM) y la Institución.

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán  
Rector

Dr. Óscar Gabriel Lastra Fernández  
Director General de Infraestructura

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

<b>2020</b> <small>AÑO</small>	<h1 style="margin: 0;">FAM</h1> <small>FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES</small>	<small>DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA          DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL          SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA</small>	<small>Más reportado</small> <b>3er Trimestre</b> <small>(Jul-Sep)</small> <small>FECHA DEORTE: 30/09/2020</small>
<b>REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL</b>			
 <small>Universidad Autónoma del Estado de Morelos</small> <small>Unidad de la institución</small> <small>Porcentaje de avance</small> <h2 style="margin: 0;">0.00%</h2>	<small>PROYECTO</small> <b>6</b> <small>Nombre de la obra</small> <b>Mantenimiento del Campus Sur/Poniente (Escuela de Estudios Superiores del Jicarero)</b>	<small>CROQUIS DE LOCALIZACIÓN</small> 	
		<small>UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO</small> <b>Carretera Galeana- Tequesquitengo s/n, Comunidad El Jicarero, Jojutla, Morelos.</b>	
<b>FOTOS (ANTES)</b>			
 <b>F1:</b> Fachada principal de EES del Jicarero - suministro, colocación y colocación de laminas tras las, mantenimiento a puertas de aluminio.	 <b>F2:</b> Mantenimiento de puertas Edificio 01 con aluminio.	<small>Comentarios de los trabajos realizados:</small> <p>De acuerdo al oficio 86/2020/2020 agotado por el Lic. Luis Arturo Consejo Alatorre Secretario de Educación del Estado de Morelos y dirigido al Lic. José Agustín Villareal Cobos, Secretario de Hacienda, en el cual se solicita atentamente remitir los recursos a la institución, conforme al oficio 17/2020 para cancelación de recursos FAM 2020, conforme al oficio 81/16/2020. Una vez aprobado lo propuesto, la institución recibió las ministraciones conforme a lo siguiente: 4 de agosto del presente recibieron los recursos correspondientes a los meses de mayo y junio por un monto de \$17,800,000.00 (diecisiete millones ochocientos noventa y dos mil ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.). el 25 de agosto de 2020 se recibió la ministración correspondiente al mes de julio por un monto de \$2,148,580.75 (dos millones ciento cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta y cinco pesos 75/100 M.N.). el 29 de agosto del presente recibió la ministración correspondiente al mes de agosto por un monto de \$2,148,580.75 (dos millones ciento cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta y cinco pesos 75/100 M.N.).</p> <p>En este mismo sentido, mediante oficio 0001/2020/2020 se entregó de manera física tres (tres) en original del Convenio de Colaboración y Ejecución del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraestructura Física Educativa de Nivel Superior 2020, y el programa de ejecución de obras, debidamente firmados por el Titular del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM) con la finalidad de recibir la firma del rector.</p> <p>Mediante oficio 010/2020/2020 agotado por el Dr. Álvaro Zamudio Lara Coordinador General de Planeación y Administración se le ha entregado al Lic. José Eduardo Silva Rendón Director General del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM) un expediente original debidamente firmado y rubricado del Convenio de Colaboración y Ejecución del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraestructura Física Educativa de Nivel Superior 2020 y su programa de ejecución de obras.</p> <p>Mediante oficio 001/2020/2020 dirigido al Dr. Ismael Escobar Alatorre, Director de Fortalecimiento Institucional de la DGESE, se adjunta copia simple en versión electrónica y en PDF del Convenio de Colaboración y Ejecución del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraestructura Física Educativa de Nivel Superior 2020 y su programa de ejecución de obras, celebrado Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM) y la Institución.</p>	
 <b>F3:</b> Mantenimiento de puertas de aluminio Edificio 01.	 <b>F4:</b> Mantenimiento preventivo a unidades de refrigeración Edificio 06.	 <b>F5:</b> Techo de teja, chaffane e impermeabilizante en losa, suministro y colocación de impermeabilizante, teja, fabricación de chaffan, Edificio 06.	

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



F6: Retiro de teja, chaffanes e impermeabilizante en kosa, suministro y colocación de impermeabilizante, teja, fabricación de chaffán. Edificio 08.



F7: Suministro y colocación de muro de tabla roca, puerta de aluminio y tapas ciegas. Edificio 08.



F8: Suministro, colocación y conexión de luminarias exteriores.



F9: Suministro, colocación y conexión de luminarias exteriores.

Dr. Gustavo Uquiza Behrán  
Rector

Abel Oscar Gabriel Lasso Fernández  
Director General de Infraestructura

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.  
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial: se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.
