



COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Cuernavaca, Morelos, 05 de julio de 2021.
CGPyA/321/2021.

DR. ISAIÁS ELIZARRARAZ ALCARAZ
DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
PRESENTE


En el marco del **Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)** hago llegar a Usted de manera electrónica los informes de avance de obra e informes descriptivos correspondientes al **segundo trimestre (abril, mayo y junio) 2021**, en formato PDF y debidamente firmados:

- **Informe FAM 2015.**
- **Informe FAM 2016** y así como documentación respectiva.
- **Reporte descriptivo FAM 2019**, se anexa copia del comprobante de reintegro a la Tesorería de la Federación (TESOFE).
- **Reporte descriptivo de avance y reporte fotográfico FAM 2020**, se anexa copia del comprobante de reintegro a la Tesorería de la Federación (TESOFE) así como documentación.
- **Reporte descriptivo de avance y reporte fotográfico FAM 2021**, se adjunta documentación respectiva.

Dichos informes se han enviado a las cuentas de correo electrónico:
isaias.elizarraz@nube.sep.gob.mx, rocioc@nube.sep.gob.mx y
cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo cordial.

Atentamente
Por una humanidad culta


DR. ALVARO ZAMUDIO LARA
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINSTRACIÓN

C.c.p. Dra. Carmen Rodríguez Armenta- Directora General de Educación Superior Universitaria e Intercultural. Para su conocimiento.

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán. Rector de la UAEM. Mismo fin.

Dr. Pedro Antonio Márquez Aguilar. Director General de Planeación Institucional de la UAEM. Mismo fin.

Archivo.

AZL/PAMA/ANPM/ngpb

Av. Universidad 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca Morelos, México, 62209, 2° Piso Torre de Rectoría,
Tel. (777) 329 70 33, 329 70, 00, Ext. 7033 / azamudio@uaem.mx



				GLOBAL DEL PROYECTO			
	CENTRO DE INVESTIGACIONES DÚNICAS (CIDI)						
	PUNTAJUA						
	CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS COOPERATIVAS (CICO)						
	PUNTAJOTA						
	FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS						
4	Mantenimiento del Campus Norte	X	\$ 2,089,426.05	\$ -	\$ 2,089,426.05	0%	15/05/21 31/12/21
	FERRIFRUTO ORIENTE DEL CAMPO EXPERIMENTAL						
	CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS						
	PUNTAJUA Y PUNTAJUA						
	CENTRO DE INVESTIGACIÓN TRANSDISCIPLINAR EN PSICOLOGÍA (CITPP)						
	PUNTAJUA						
	AUDITORIO						
	TOTAL			7.00	1754.00		
5	Mantenimiento del Campus Oriente	X	\$ 500,000.00	\$ -	\$ 500,000.00	0%	16/06/2021 31/12/2021
	ESUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TEPICOLINGO						
	PUNTAJOTA						
	FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUATLA						
	PUNTAJOTA						
	TOTAL			2	1487.96		
			\$20,544,896.05	\$0.00	\$20,544,896.05		


Dr. Gustavo Urquiza Betrán
Rector


Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

1 Se capturarán los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexionar tantas fotos como sea necesario.
2 En esta sección se redactará de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

2021

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado:
2do Trimestre
(abril-junio)
FECHA DE CUERPO: 28/04/2021

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Porcentaje de avances

0.00%


PRIMORDIA

1

Nombre de la obra:

Construcción de la segunda etapa para la ampliación de laboratorios, cubículos de investigación y oficinas académicas para el Centro de Investigaciones Biológicas antes CEIB (etapa final)

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

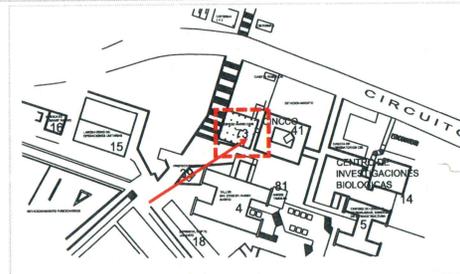


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Centro de Investigaciones Biológicas CIB.
Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa,
Cuernavaca, Mor. C.P.62209.

FOTOS (ANTES)



1.- Fachada Norte y Oeste - Construcción de la segunda etapa para la ampliación de laboratorios, cubículos de investigación, y oficinas académicas para el Centro de Investigaciones Biológicas antes CEIB (etapa final).



2.- Fachada Oeste - Construcción de la segunda etapa para la ampliación de laboratorios, cubículos de investigación, y oficinas académicas para el Centro de Investigaciones Biológicas antes CEIB (etapa final).




3.- Planta Baja - Se desarrollarán trabajos de construcción de codena perimetral y firme de concreto, colocación de loseta de cerámica, muros divisorios de labiároca, colocación de plafón, instalaciones, cancelería.



4.- Colocación de instalación hidrosanitaria en módulo de baños y laboratorio, rellenas y compactación, firme de concreto, colocación de loseta, fabricación de muros de tabique y vintex, cancelería, colocación de plafón, muebles sanitarios.

Comentarios de los trabajos realizados:
VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.



5.- Conclusión de escalera principal construyendo losa de ducto de elevador, muros perimetrales, colocación de domo, barandaf y pasamanos, pintura, instalación eléctrica.

Dr. Gustavo Uruzuza Beltrán
Rector

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2021



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
2do. Trimestre 2021
Abril-Junio
FECHA DE DEPTE. 30/06/2021

FND
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Porcentaje de avance

0%

PRIMORDIAL 2

Nombre de la obra: Equipamiento de Espacios Académicos del Campus Sur y del Campus Poniente (Escuela de Estudios Superiores de Jojutla)

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN




- 1 Administración
- 2 Cafetería
- 3 Espacios de usos múltiples
- 4 Biblioteca
- 5 Construcción Multidisciplinaria
- 6 Salón 1
- 7 Pasadizo
- 8 Salón 2
- 9 CFSA
- 10 Tótem
- 11 Servicios
- 12 Salón 3
- 13 Atrio
- 14 Atrio
- 15 Construcción de deportes
- 16 Centro de cómputo
- 17 Servicios
- 18 Salón 4
- 19 Salón 5
- 20 Salón 6
- 21 Salón 7
- 22 Salón 8
- 23 Sala de juntas Ovales
- 24 Salón 9
- 25 Salón 10
- 26 Salones Auditorio
- 27 Área Deportiva
- 28 Estacionamiento
- 29 Salón 11
- 30 Salón 12
- 31 Área deportiva
- 32 Salón 13
- 33 Salón 14
- 34 Área deportiva
- A1 Almacén 1
- A2 Almacén 2
- A3 Construcción personal administrativo Terminal
- A4 Construcción personal administrativo Módulos
- A5 Archivo de Servicios Escolares
- C Construcción
- CE Casos de vigilancia



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Av. 18 de marzo # 617, Col. Emiliano Zapata C.P. 62900 en el Municipio de Jojutla de Juárez Morelos.

FOTOS (ANTES)



F1: Fachada Principal.



F2: 4 Pizarrón Interactivo se ubicarán en el Aula 1, 2, 3 y 4 del Edificio B.



F3: 2 Pizarrón Interactivo se ubicarán en el Centro de Computo del Edificio C Planta Baja. 1 Pizarrón Interactivo se ubicará en el Aula 11 del Modulo 1 de Aulas móviles.




F4: 6 Pizarrón Interactivo se ubicarán en el Aula 5, 6, 7, 8, 9 y 10 del Edificio C Planta Alta.



Comentarios de los trabajos realizados:

El 15 de junio de 2021, se llevó a cabo el acto de presentación y apertura de proposiciones al Procedimiento de Licitación Pública Nacional LP12/2021 para la "Adquisición de mobiliario, herramientas y aire acondicionado para la Universidad Autónoma del Estado de Morelos", en este mismo mes con fecha 25 de junio se realizó el acta de fallo de estos rubros y se realizó la Licitación Pública Nacional LP13/2021 "Adquisición de materiales, licencias, equipo de cómputo y laboratorios para la Universidad Autónoma del Estado de Morelos", el 10 de junio se llevó a cabo el acto de presentación y apertura de proposiciones, contando con el acta de fallo en este rubro el 25 de junio del 2021. Lo anteriormente señalado se encuentra disponible en la dirección electrónica <https://www.uaem.mx/difusion-y-medios/informacion-oficial/licitaciones/direccion-de-recursos-materiales-2021/>

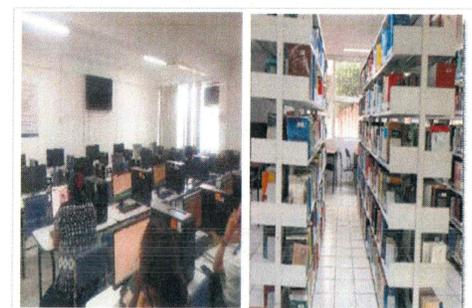


F5: 60 Sillas con Tela se ubicarán en el Centro de Computo del Edificio C Planta Baja. 27 Sillas con Telas se ubicarán en la Biblioteca del Edificio B.

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



F6: 93 Butacas se ubicarán en el Auditorio del Edificio C Planta Baja.

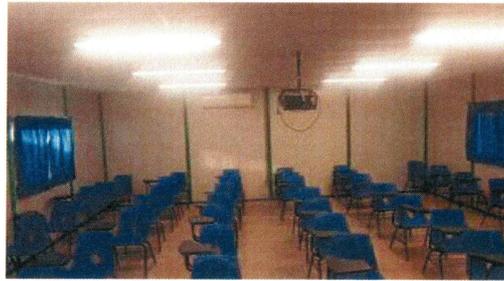

F7: 42 Butacas se ubicará en el Aula 11 del Módulo 1 de Aulas móviles.



F8: 2 Sistemas de Aire Acondicionado de 3 Toneladas se ubicarán en el Auditorio del Edificio C Planta Baja. 2 Sistemas de Aire Acondicionado de 2 Toneladas se ubicarán en el Centro de Computo del Edificio C Planta Baja.




F9: 161 Sillas de polipropileno se ubicarán en la sala de Usos Múltiples de la Explanada.



F10: 1 Sistema de movimientos para telones se ubicará en el Auditorio del Edificio C Planta Baja.



F11: 50 Mesas color blanco se ubicarán en el Centro de Computo del Edificio C Planta Baja y 12 Mesas color maple se ubicarán en la Biblioteca del Edificio B.

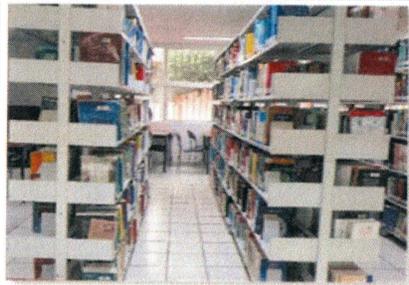

F12: 6 Estantes con 14 entrepaños y 6 Estantes con 7 entrepaños se ubicarán en la Biblioteca del Edificio B.



F13: 30 Locker de 4 puertas se ubicarán en el pasillo del Edificio B.



F14: 1 Proyector inalámbrico se ubicará en el Aula 11 del Módulo 1 de Aulas móviles.

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector

Dr. Alvaro Zamudio Lara
Coordinador General de Planeación y Administración

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2021



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
2do. Trimestre 2021
Abril-Junio
FECHA DE CORTE: 30/06/2021

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD **2** Nombre de la obra: **Equipamiento de Espacios Académicos del Campus Sur y del Campus Poniente (Escuela de Estudios Superiores de Jicarero)**



Porcentaje de avance

0%

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Galeana-Tequesquitengo S/N Col. El Jicarero
C.P. 62909 en el Municipio de Jojutta, Morelos.

FOTOS (ANTES)




F1: Fachada principal



F2: Distribución Edificio 6 Y 7 Aire acondicionado.

Comentarios de los trabajos realizados:

El 15 de junio de 2021, se llevó a cabo el acto de presentación y apertura de proposiciones al Procedimiento de Licitación Pública Nacional LP12/2021 para la "Adquisición de mobiliario, herramientas y aire acondicionado para la Universidad Autónoma del Estado de Morelos", en este mismo mes con fecha 25 de junio se realizó el acto de fallo de estos rubros y se realizó la Licitación Pública Nacional LP13/2021 "Adquisición de materiales, licencias, equipo de cómputo y laboratorios para la Universidad Autónoma del Estado de Morelos", el 10 de junio se llevó a cabo el acto de presentación y apertura de proposiciones, contando con el acto de fallo en este rubro el 25 de junio del 2021. Lo anteriormente señalado se encuentra disponible en la dirección electrónica <https://www.usern.mx/difusion-y-medios/informacion-oficial/licitaciones/direccion-de-recursos-materiales-2021/>



F3: (1) AIRE ACOND. AULA 1 DEL EDIF 06



F4: (1) AIRE ACOND. AULA 2 DEL EDIF 06




F5: (1) AIRE ACOND. CENTRO DE COMPUTO DEL EDIF 06

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL




F6: (1) AIRE ACOND. AULA 3 DEL EDIF 07



F7: (1) AIRE ACOND. AULA 4 DEL EDIF 07



F8: (1) AIRE ACOND. AULA 5 DEL EDIF 07

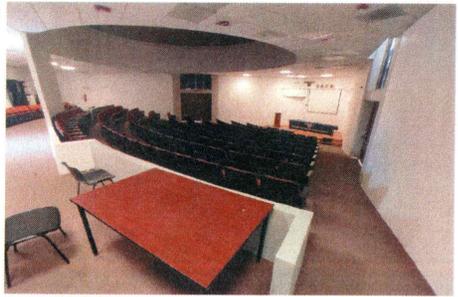

F9: 2 PROYECTORES DE TIRO LARGO EN AUDITORIO EDIF. 03



F10: 2 MESAS EN LAB DE ALIMENTOS EDIF. 12




F11: 3 MESAS CON ZOCLO EN LAB DE ENFERMERIA AREA GEYE EDIF 15



F12: 1 PIEZA MESA MAYO EN LAB DE ENFERMERIA EDIF 15



F13 1 PIEZA MESA MAYO EN LAB DE ENFERMERIA AREA QUIROFANO EDIF 15

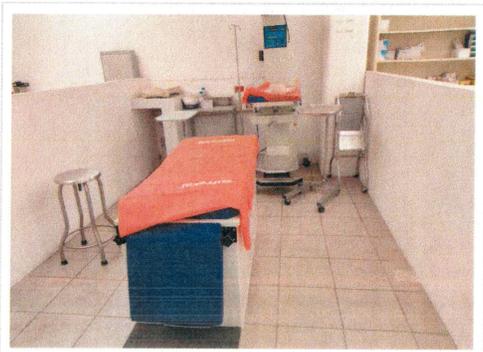

F14: 2 PIEZAS MESA MAYO EN LAB DE ENFERMERIA AREA EXPULSION EDIF 15



F15: 1 PIEZA MESA PASTEUR EN LAB DE ENFERMERIA EDIF 15



F16: 1 PIEZA MESA PASTEUR EN LAB DE ENFERMERIA AREA (-) EDIF 15



F17: 1 PIEZA MESA PASTEUR EN LAB DE ENFERMERIA AREA HOSPITALIZACION EDIF 15



F18: 1 PIEZA MESA PASTEUR EN LAB DE ENFERMERIA AREA ACCESO EDIF 15



F19: 2 PIEZAS MESA AUXILIAR EN LAB DE ENFERMERIA EDIF 15.




F20: 2 PIEZAS MESA AUXILIAR EN LAB DE ENFERMERIA AREA QUIRURGICA EDIF 15



F21: 10 ARCHIVEROS EN BIBLIOTECA EDIF 02



F22: 5 ARCHIVEROS EN SALA DE JUNTAS EDIF 01

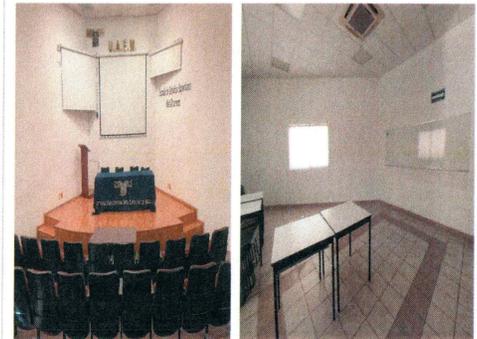

F23: (1) PIZARRON INTERACTIVO EN AUDITORIO EDIF 03 Y EN EN BIBLIOTECA EDIF 02.

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector

Alvaro Zamudio Lara
Coordinador General de Planeación y Administración

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra




Porcentaje de avance

0%

PRIORIDAD 2 Nombre de la obra: **Equipamiento de Espacios Académicos del Campus Sur y del Campus Poniente (Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec)**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

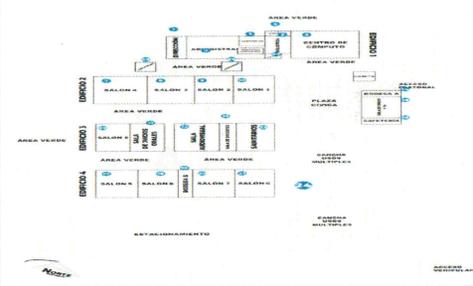

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Subida al Calvario S/N, Col. Justo Sierra, Mazatepec, Morelos.

FOTOS (ANTES)



F1: Fachada principal EESMazatepec



F2: 4 Aires Acondicionados de 2 tr se colocaran en Aula 1, 2, 3 y 4 de la EESMazatepec




Comentarios de los trabajos realizados:

El 15 de junio de 2021, se llevó a cabo el acto de presentación y apertura de proposiciones al Procedimiento de Licitación Pública Nacional LP12/2021 para la "Adquisición de mobiliario, herramientas y aire acondicionado para la Universidad Autónoma del Estado de Morelos", en este mismo mes con fecha 25 de junio se realizó el acto de fallo de estos rubros y se realizó la Licitación Pública Nacional LP13/2021 "Adquisición de materiales, licencias, equipo de cómputo y laboratorios para la Universidad Autónoma del Estado de Morelos", el 10 de junio se llevó a cabo el acto de presentación y apertura de proposiciones, contando con el acto de fallo en este rubro el 25 de junio del 2021. Lo anteriormente señalado se encuentra disponible en la dirección electrónica <https://www.uaem.mx/difusion-y-medios/informacion-oficial/licitaciones/direccion-de-recursos-materiales-2021/>



F3: 6 Aires Acondicionados de 2 tr se colocaran en Aula 5, 6, 7, 8, 9 y Biblioteca de la EESMazatepec



F4: 3 Aires Acondicionados de 1.5 tr en Sala de Asesorías, Modulo de PTC 1 y 2 de la EESMazatepec



F5: 5 Mesas de trabajo se colocaran en sala de Radio y Televisión de la EESMazatepec


REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



F6: 4 sillas de Visita Bond se colocaran en Sala de Radio y Television de la EESMazatepec



F7: 8 libreros para la Biblioteca de la EESMazatepec

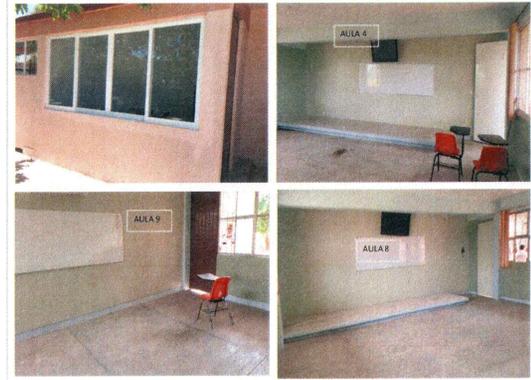

F8: 10 Escritorios para las aulas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y sala de asesorías

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector

Dr. Alvaro Zamudio Lara
Coodinador General de Planeación y Administración

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra

2021



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
2do. Trimestre 2021
Abril-Junio
FECHA DE CORTE: 30/06/2021

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS


Porcentaje de avance

0%

PROYECTO 2 Nombre de la obra:

Equipamiento de Espacios Académicos del Campus Sur y del Campus Poniente (Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec Subsede Miacatlán)


CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

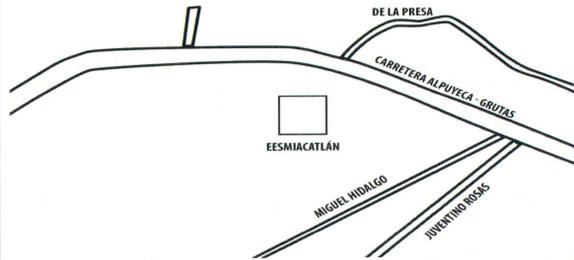

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Alpuyeca - Grutas S/N Col. La Toma, Miacatlán, Morelos. C.P. 62605

FOTOS (ANTES)

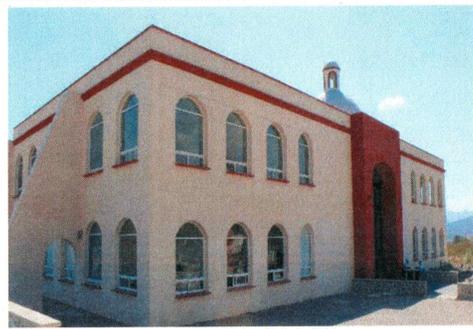

F1: Fachada principal de la EESMazatepec Subsede Miacatlán.



Biblioteca



Biblioteca



Centro de Cómputo

Comentarios de los trabajos realizados:

El 15 de junio de 2021, se llevó a cabo el acto de presentación y apertura de proposiciones al Procedimiento de Licitación Pública Nacional LP12/2021 para la "Adquisición de mobiliario, herramientas y aire acondicionado para la Universidad Autónoma del Estado de Morelos", en este mismo mes con fecha 25 de junio se realizó el acto de fallo de estos rubros y se realizó la Licitación Pública Nacional LP13/2021 "Adquisición de materiales, licencias, equipo de cómputo y laboratorios para la Universidad Autónoma del Estado de Morelos", el 10 de junio se llevó a cabo el acto de presentación y apertura de proposiciones, contando con el acto de fallo en este rubro el 25 de junio de 2021. Lo anteriormente señalado se encuentra disponible en la dirección electrónica <https://www.uaem.mx/difusion-y-medios/informacion-oficial/licitaciones/direccion-de-recursos-materiales-2021/>

F2: Se ubicarán 12 mesas de trabajo en el Centro de Cómputo y 4 en la Biblioteca de la EESMazatepec Subsede Miacatlán.




Centro de Cómputo



Biblioteca



Centro de



Atención Psicológica



Cámara gesell



Cámara gesell



Cámara gesell



Módulo de Prácticas

Auditorio

F3: Se ubicarán 20 Sillas de visita en la Cámara de Gesell y 10 Sillas de Visita en el Centro de Cómputo de la EESMazatepec Subsede Miacatlán.

F4: Se ubicarán 2 Aires Acondicionados de 2 TR. en la Cámara de Gesell, 2 Aires Acondicionados en la Biblioteca y 1 Aire Acondicionado en el Centro de Cómputo de la EESMazatepec Subsede Miacatlán.

F5: Se ubicará Aires Acondicionados de 1.5 Tr. en ; 1 Aire Acondicionado en el Módulo de Tutorías, 1 Aire Acondicionado en el Módulo de Prácticas, 1 Aire Acondicionado en el Módulo de Atención Psicológica y 1 Aire Acondicionado en el Módulo de Psicopedagogía y 1 Aire Acondicionado en el Auditorio de la EESMazatepec Subsede Miacatlán.

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



F6: 1 Podium se ubicará en el Auditorio de la EESMazatepec Subsede Miacatlán.



F7: Se ubicarán 2 libreros en la Biblioteca, 1 librero en Módulo de tutoría, 1 librero en el Módulo de Prácticas, 1 librero en atención Psicológica y 1 librero en el Módulo de Psicopedagógica de la EESMazatepec Subsede Miacatlán.



F8: Se ubicará un escritorio por aula del Aula 1 al 10 de la EESMazatepec Subsede Miacatlán.



F9: Se ubicarán 3 libreros con puerta en la Biblioteca de la EESMazatepec Subsede Miacatlán.

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector

Dr. Alvaro Zamudio Lara
Cordinador General de Planeación y Administración

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra

2021

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
2do. Trimestre 2021
Abril-Junio
FECHA DE CORTE: 30/06/2021

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

0%


PRIORIDAD

2

Nombre de la obra:

Equipamiento de Espacios Académicos del Campus Sur y del Campus Poniente (Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec Subsede Tetecala)

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

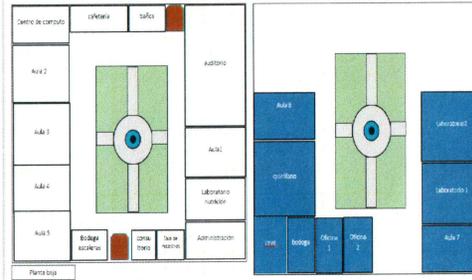

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Av. Lázaro Cardenas, Esquina con Altamirano S/N, colonia centro C.P. 62620 en el Municipio de Tetecala, Morelos.

FOTOS (ANTES)



F1: Fachada principal de la EES Mazatepec subsede Tetecala.



F2: Se ubicaran 4 aires acondicionados de 1.5 t.r en los laboratorios de enfermería 1 y 2 de la EES Mazatepec subsede Tetecala.




F3: Se ubicaran 5 aires acondicionados de 2 tr. en la AULA 1(1 pieza), AULA 2(2 piezas), AULA 3 (1 pieza) y AULA 4 (1 Pieza) de la EES Mazatepec Subsede Tetecala.



F4: Se ubicaran 1 escritorio en el consultorio medico de la EES Mazatepec subsede Tetecala.

Comentarios de los trabajos realizados:

El 15 de junio de 2021, se llevó a cabo el acto de presentación y apertura de proposiciones al Procedimiento de Licitación Pública Nacional LP12/2021 para la "Adquisición de mobiliario, herramientas y aire acondicionado para la Universidad Autónoma del Estado de Morelos", en este mismo mes con fecha 25 de junio se realizó el acta de fallo de estos rubros y se realizó la Licitación Pública Nacional LP13/2021 "Adquisición de materiales, licencias, equipo de cómputo y laboratorios para la Universidad Autónoma del Estado de Morelos", el 10 de junio se llevó a cabo el acto de presentación y apertura de proposiciones, contando con el acta de fallo en este rubro el 25 de junio del 2021. Lo anteriormente señalado se encuentra disponible en la dirección electrónica <https://www.uaem.mx/difusion-y-medios/informacion-oficial/licitaciones/direccion-de-recursos-materiales-2021/>

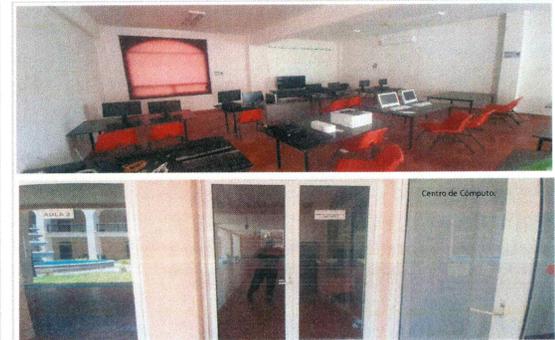

F5: Se ubicaran 11 mesas en el Centro de Cómputo de la EES Mazatepec subsede Tetecala.

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



F6: Se ubicaran 3 aires acondicionados de 2 tr. en la AULA 5, AULA 6 y AULA 7 de la EES Mazatepec subsede Tetecala.



F7: Se ubicaran 1 aire acondicionado de 2 tr. en el quirófano de la EES Mazatepec Subsede Tetecala.

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector

Dr. Álvaro Zamudio Lara
Coordinador General de Planeación y Administración

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la **misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.**

2021



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
2do Trimestre
(abril-junio)
FECHA DE DÓNDE: 10/06/2021

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL




UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

0.00%

PRORIDAD 3 Nombre de la obra: **Adecuación y mejoras del Campus Sur (Escuela de Estudios Superiores de Jojutla)**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

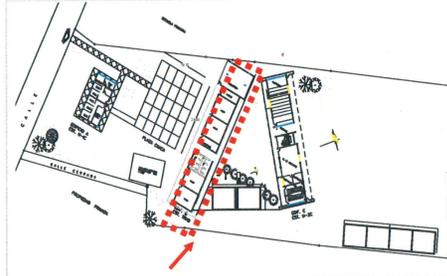

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Escuela de Estudios Superiores de Jojutla
Av. 18 de Marzo No. 617, Col. Emiliano Zapata,
Jojutla Morelos.

FOTOS (ANTES)




1.- Fachada principal de la EES de Jojutla.




2.- Edificios interiores de la EES de Jojutla

Comentarios de los trabajos realizados:
VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.



3.- Nivel azotea donde se colocaran los módulos fotovoltaicos.
Edificio B



4.- Proyecto general de conjunto para la Instalación de Paneles Solares Edificio.



5.- Área de conexión general del sistema de paneles solares.

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector

Mr. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra

2021

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
2do Trimestre
(abril-junio)
FECHA DE COPIE: 16/04/2021

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD

3

Nombre de la obra: **Adecuación y mejoras del Campus Sur (Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec)**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avances

0.00%

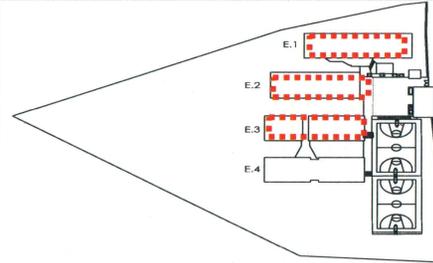

Croquis de localización.
Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec
Av. subida al Calvario s/n Col. Justo Sierra
62636 Mazatepec, Mor.

FOTOS (ANTES)



1.- Fachada principal E.E.S. Mazatepec




2.- Fachada Edificios interiores de aulas donde se realizarán los trabajos.

Comentarios de los trabajos realizados:

VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.



3.- Interior de Aula tipo - Se realizarán trabajos de colocación de loseta.



2.- Simulador Sala de Juicios Orales donde se coloca loseta.



3.- Salón donde se colocará loseta.

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán

Rector

Arq. Óscar Gabriel Lastra Fernández

Director General de Infraestructura

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra

2021

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
2do Trimestre
(abril-junio)
FECHA DE CORTE: 30/06/2021

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL


PRIORIDAD

3

Nombre de la obra:

Adecuación y mejoras del Campus Sur (Escuela de Estudios Superiores del Jicarero)

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

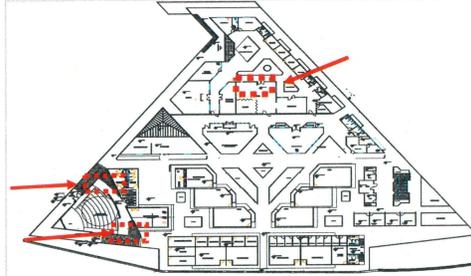

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Escuela de Estudios Superiores del Jicarero
Carretera Galeana- Tequesquitengo s/n,
Comunidad El Jicarero, Jojutla, Morelos.





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

0.00%

FOTOS (ANTES)

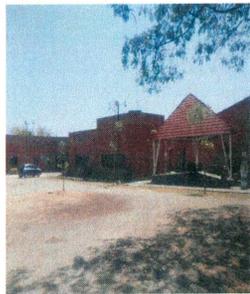


1- Fachada y acceso Principal del plantel, Entrada a Auditorio de la EES del Jicarero




2- Fachadas Interiores de edificios de la EES del Jicarero


Comentarios de los trabajos realizados:
VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.

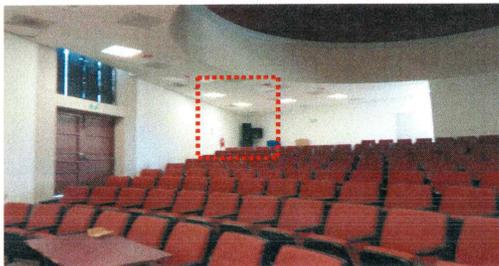


3- Área Interior de Auditorio donde se construirá cubículo para vestuario y bodega.



4- Espacio Interior de Auditorio donde se adecuara cubículo de para audio y control.



5- Bodega que se adecuara cerrando perímetro con cancelería de aluminio.



F5: Colocación de duela de madera.



F6: Muro a base de placa de cemento durock.



F7: Colocación de cancelería interior y exterior de aluminio así como suministro y colocación de puerta de aluminio.

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la **misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.**

2021

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado:
2do Trimestre
(abril-junio)
FECHA DE COPIE: 20/06/2021

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Porcentaje de avance

0.00%


PRORIDAD

4

Nombre de la obra:

Mantenimiento del Campus Norte, Centro de Investigaciones Químicas (CIQ).

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

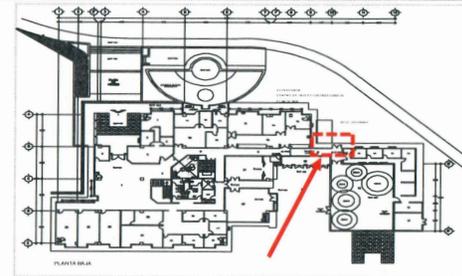

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Centro de Investigaciones Químicas (CIQ)
Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa,
Cuernavaca, Mor. C.P.62209.

FOTOS (ANTES)



1.- Fachada Principal CIQ-ICBA. Puerta de emergencia.



2.- Fachada lateral CIQ. Puerta de emergencia.

Comentarios de los trabajos realizados:

VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.



3.- Suministro y colocación de puerta de aluminio, barra antipánico y rampa de concreto



4.- espacio interior hacia salida de emergencia



5.- Demolición de firme y construcción de rampa de concreto en salida de emergencia

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2021

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
2do Trimestre
(abril-junio)
Fecha de corte: 30/6/2021

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

0.00%

PRIMORDIA

4

Nombre de la obra: **Mantenimiento del Campus Norte, Centro de Investigación en Ciencias Cognitivas (CINCCO).**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Centro de Investigación en Ciencias Cognitivas (CINCCO) edificio 41.
Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca, Mor. C.P.62209.

FOTOS (ANTES)



1.- Fachada principal del Centro de Investigación en Ciencias Cognitivas




2.- Fachada lateral Este del CINCCO.

Comentarios de los trabajos realizados:


VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.



3.- Mantenimiento general correctivo a domo de policarbonato en losa de azotea de edificio del CINCCO.



4.- Limpieza y sellado de perfil canaleta, refuerzo en sujeción de tramos longitudinales de placas de policarbonato



5.- Remates perimetrales de perfil de aluminio, sujeción del perfil de aluminio con monten base y placas de remate de policarbonato.

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra

2021

ARC

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado:
2do Trimestre
(abril-junio)
FECHA DE CORTA: 19/05/2021

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS


Porcentaje de avance

0.00%

PRIMORDIAL 4 Nombre de la obra:

Mantenimiento del Campus Norte (Facultad de Ciencias Agropecuarias).

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

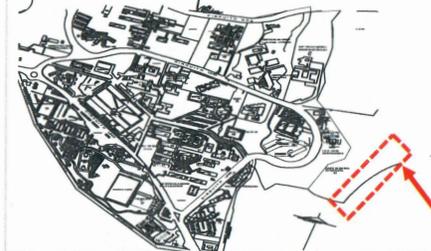

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS
Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa,
Cuernavaca, Mor. C.P.62209

FOTOS (ANTES)



1.- Fachada principal de la Facultad de Ciencias Agropecuarias-Campo experimental



2.- Fachada Este, Mantenimiento en cerca perimetral con Autopista México-Cuernavaca.



3.- Vista interior rea perimetral: retiro de malla existente deteriorada, deshierbe y limpieza del área, excavación y construcción de rodapié de mampostería de piedra, colocación de malla ciclónica con postes metálicos.



4.- Extremo sur de Mantenimiento de áreas: perimetrales: retiro de malla existente deteriorada, deshierbe y limpieza del área, excavación y construcción de rodapié de mampostería de piedra, colocación de malla ciclónica con postes metálicos.

Comentarios de los trabajos realizados:

VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.



5.- En área perimetral se construirá salida pluvial hacia canal ya existente exterior

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector

Arq. Óscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2021

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado:
2do Trimestre
(abril-junio)
FECHA DE CORTE: 30/06/2021

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL




Porcentaje de avance

0.00%

PRIMARÍA 4 Nombre de la obra: **Mantenimiento del Campus Norte, Centro de Investigaciones Biológicas (CIB)**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

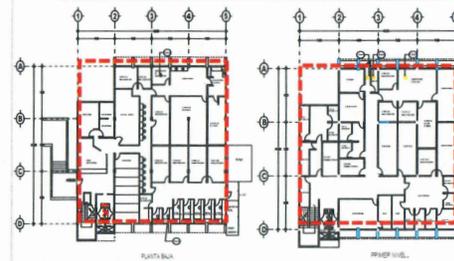

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Centro de Investigaciones Biológicas CIB.
Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa,
Cuernavaca, Mor. C.P.62209.

FOTOS (ANTES)




1.- Fachada principal del CIB.



2.- Fachada Norte del Edificio donde se realizarán los trabajos.

Comentarios de los trabajos realizados:

VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.



3.- Mantenimiento a red eléctrica considerando tableros principales y secundarios.



4.- Mantenimiento a red eléctrica: incluyendo colocación de luminarias y separación de circuitos



5.- Rehabilitación de plafones, apagadores y luminarias.

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector

Arg. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2021

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
2do Trimestre
(abril-junio)
FECHA DE CORTE: 30/06/2021

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD

4

Nombre de la obra: **Mantenimiento del campus Norte, (Centro de Investigación Transdisciplinar en Psicología (CITPsi sede Volcanes)).**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

0.00%

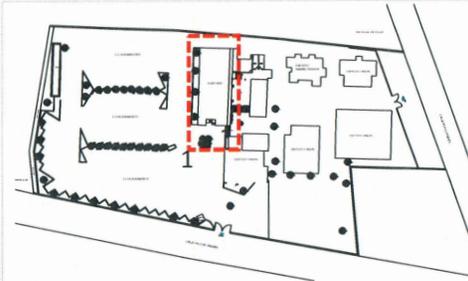

Centro de Investigación Transdisciplinar en Psicología (CITPsi),
Calle Pico de Orizaba No. 1, Col. Volcanes,
Cuernavaca, Morelos. C.P. 62350

FOTOS (ANTES)



F1.- Fachada Principal del CITPsi



F2.- Fachada lateral del edificio con auditorio donde se realizaran los trabajos.

Comentarios de los trabajos realizados:

VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.



F3: Se realizará rampa en en Interior de auditorio.



F4: Edificación de rampa en el vestíbulo de acceso a Auditorio del CITPsi, Unidad Los Volcanes.



F5: Edificación de rampa en el vestíbulo de acceso a Auditorio del CITPsi, Unidad Los Volcanes.

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



F6.-Vista superior de techumbre metálica y canalón perimetral que se sustituirán.

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector



F7.- Interior de auditorio donde se realizaran trabajos de rehabilitación de plafón, cambio de butacas deterioradas, rehabilitación de duela y cambio en un área de alfombra.

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2021

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES


DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
2do Trimestre
(abril-junio)
FECHA DE CORTE: 30/06/2021

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRECEDENCIA: 5 Nombre de la obra: **Mantenimiento del Campus Oriente, Facultad de Estudios Superiores de Cuautla (FESC).**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

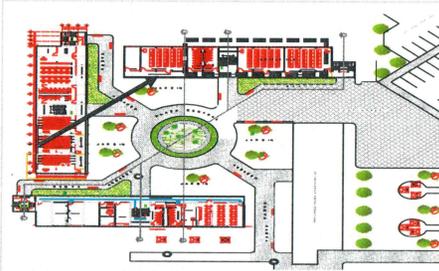

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Facultad de Estudios Superiores de Cuautla (FESC),
Carretera México - Oaxaca No. 218 Colonia Plan de Ayala, Cuautla Morelos, C.P. 62743



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

0.00%

FOTOS (ANTES)



1.- Fachada principal de edificios de la Facultad de estudios superiores de Cuautla.




2.- Fachada lateral de edificio donde se realizarán los trabajos


Comentarios de los trabajos realizados:
VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.



1.- Mantenimiento al impermeabilizante del Edificio de la Unidad Académica.



4.- Extremo Este de losa de azotea donde se realizarán los trabajos de mantenimiento al Impermeabilizante existente.



5.- Detalle de junta constructiva entre losa de edificio y losa de escalera de emergencia.

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2021

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
2do Trimestre
(abril-junio)
FECHA DE PGAR: 30/06/2021

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Porcentaje de avance

0.00%


PRORIDAD

5

Nombre de la obra:

Mantenimiento del Campus Oriente (Escuela de Estudios Superiores de Tepalcingo)

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

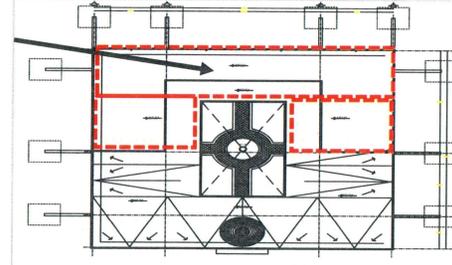

PLANTA DE TECHOS

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Escuela de Estudios Superiores de Tepalcingo
PASEO RIVERENO SIN NÚMERO CAMPO DE
TEPALCINGO C.P.62920 TEPALCINGO MORELOS

FOTOS (ANTES)



1.- Fachada principal de la E.E.S. de Tepalcingo



2.- Fachada principal de la E.E.S. de Tepalcingo


Comentarios de los trabajos realizados:
VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.



1.- Impermeabilización de Azotea.



1.- Impermeabilización de Azotea y cupula



1.- Impermeabilización de Azotea y reparación de cojaderas

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra
