



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

2017-2023

UAEM

12 SEP. 2019

RECIBIDO

RECIBIÓ: *Arce* HORA: 10:38

S.E.P. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
RECIBIDO
11 SEP 2019
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

RECTORÍA

ACUSE

"1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata"

Cuernavaca, Morelos, 06 septiembre de 2019.

R/311/2019

DR. ISAÍAS ELIZARRARAZ ALCARAZ
DIRECTOR
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

PRESENTE

S.E.P. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
RECIBIDO
12 SEP 2019
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

En el marco del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) hago llegar a Usted lo siguiente:

FAM 2015

- Informes correspondientes al mes de agosto de 2019, mismos que se envían de manera impresa con su respectiva firma.
- Copia simple del Reintegro a la TESOFE de la obra "Construcción de sala de cómputo, auditorio, oficinas administrativas y cubículos de investigadores para el edificio complementario de la facultad de humanidades para la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) Chamilpa, Cuernavaca".

FAM 2016

- Informes correspondientes al mes de agosto de 2019, mismos que se envían de manera impresa con su respectiva firma.

FAM 2018

- Informes correspondientes al mes de agosto de 2019 debidamente firmados y en formato PDF. Dichos informes contienen la documentación respectiva.

FAM 2019

- Informes correspondientes al mes de agosto de 2019 debidamente firmados y en formato PDF. Dichos informes contienen la documentación respectiva

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS
Emirah 10:30
12 SEP 2019 UAEM
RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS
10:21 Karina
12 SET. 2019 I.A.E.M.
RECIBIDO
COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Av. Universidad 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca Morelos, México, 62209, Piso 7° Torre de Rectoría Tel. (777) 329 7001, 329 7002/ rectoria@uaem.mx

Chamilpa, Cuernavaca Morelos, México, 62209, Piso 7° Torre de Rectoría Tel. (777) 329 7001, 329 7002

UAEM



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

RECTORÍA

Finalmente, le comento que los informes han sido enviados en los tiempos establecidos, a las cuentas de correo electrónico isafas.elizarraraz@nube.sep.gob.mx , rocio@nube.sep.gob.mx , cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx para su revisión.

Sin más por el momento aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

U A E M

RECTORÍA DR. GUSTAVO URQUIZA BELTRÁN
RECTOR

Atentamente
Por una humanidad culta

C.c.p. Dra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta- Directora General de Educación Superior Universitaria. Para su conocimiento
Dr. Alvaro Zamudio Lara. - Coordinador General de Planeación y Administración. Mismo fin
Dr. Pedro Antonio Márquez Aguilar-Director General de Planeación Institucional. Mismo fin
✓ Archivo.

GUB/AZL/PAMA/ANPM/


Av. Universidad 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca Morelos, México, 62209, Piso 7° Torre de Rectoría Tel. (777) 329 7001, 329 7002/ rectoria@uaem.mx

UA
EM


Una universidad de excelencia

RECTORÍA
2017-2023

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

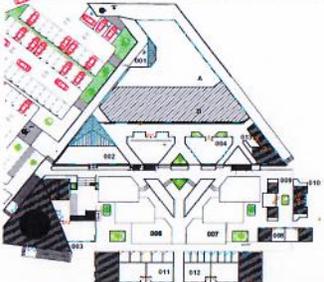 <p>Escudo de la universidad</p> <p>Porcentaje de avance</p>	<p>1 Nombre de la obra: Equipamiento de Espacios Académicos del campus Sur/poniente (Jicarero)</p> <p>CROQUIS DE LOCALIZACIÓN</p> 	<p>UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO</p> <p>Carretera Galeana-Tequesquitengo S/N Col. El Jicarero C.P. 62909 en el Municipio de Jotulla, Morelos.</p>
<p>0%</p>		

FOTOS (ANTES)

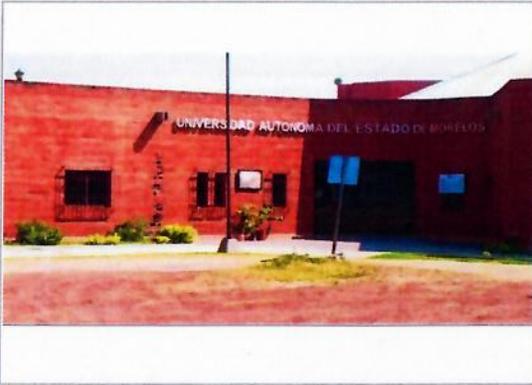

F1: Fachada principal



F2: Interior

Comentarios de los trabajos realizados:

Conforme a oficio 511-3/2019-1273 la Dirección de Fortalecimiento Institucional (DFI) aprobó la rectificación del proyecto denominado, "Segunda Etapa de la Escuela de Estudios Superiores de Atlihucan (EESAT)", en el cual se considera la Construcción de dos aulas en la segunda planta, un módulo sanitario para hombres y mujeres en la segunda planta, tres cubículos en la segunda planta y Construcción de estructura (diez contrafuertes), es importante mencionar que la obra conserva el monto autorizado, no cambia la sede y permanece el nombre del proyecto. Por otra parte, una vez que la Institución ha cumplido con la captura de los proyectos en el Sistema Integral de Gestión Financiera (SIGEF) y al no contar con el estatus de los proyectos, el Coordinador General de Planeación y Administración, Dr. Alvaro Zamudio Lara solicitó mediante oficio CGPyA/712/2019 a la Directora General de Presupuesto y Gasto Público de Gobierno del Estado, C.P. Yaniré Quiroz Salgado, respuesta al estatus que guardan los proyectos, con la finalidad de proceder a la elaboración de la Solicitud de Liberación de Recursos (LSR).



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula



Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector



Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL





Escudo de la universidad

Porcentaje de avance

0%

PRECEDENCIA: **1** Nombre de la obra: **Equipamiento de Espacios Académicos del campus Surponiente (Jojutta)**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

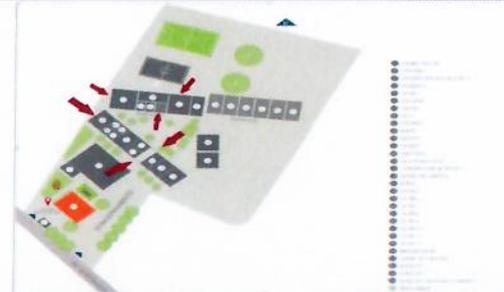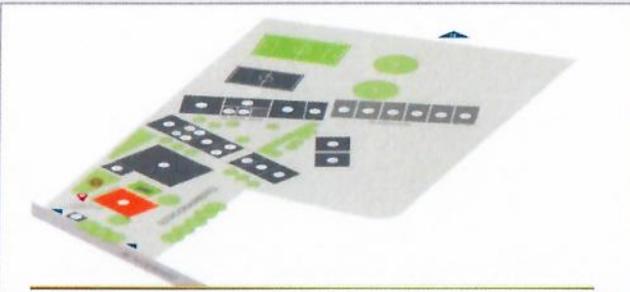

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Av. 18 de marzo # 617, Col. Emiliano Zapata C.P. 62900 Municipio de Jojutla de Juárez, Morelos.

FOTOS (ANTES)



F1: Fachada principal



F2: lateral

Comentarios de los trabajos realizados:

Conforme a oficio 511-3/2019-1273 la Dirección de Fortalecimiento Institucional (DFI) aprobó la rectificación del proyecto denominado, "Segunda Etapa de la Escuela de Estudios Superiores de Atlihucan (EESAI)", en el cual se considera la Construcción de dos aulas en la segunda planta, un módulo sanitario para hombres y mujeres en la segunda planta, tres cubículos en la segunda planta y Construcción de estructura (diez contrafuertes), es importante mencionar que la obra conserva el monto autorizado, no cambia la sede y permanece el nombre del proyecto. Por otra parte, una vez que la Institución ha cumplido con la captura de los proyectos en el Sistema Integral de Gestión Financiera (SIGEF) y al no contar con el estatus de los proyectos, el Coordinador General de Planeación y Administración, Dr. Alvaro Zamudio Lara solicitó mediante oficio CGPyA/712/2019 a la Directora General de Presupuesto y Gasto Público de Gobierno del Estado, C.P. Yaniré Quiroz Salgado, respuesta al estatus que guardan los proyectos, con la finalidad de proceder a la elaboración de la Solicitud de Liberación de Recursos (LSR).



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial: se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

2019

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Agosto_2019

FECHA DE CORTE: 31/08/2019

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PROYECTO

1

Nombre de la obra:



Equipamiento de Espacios Académicos del campus Sur/poniente (Mazatepec)



Escudo de la universidad
Porcentaje de avance

0%


CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

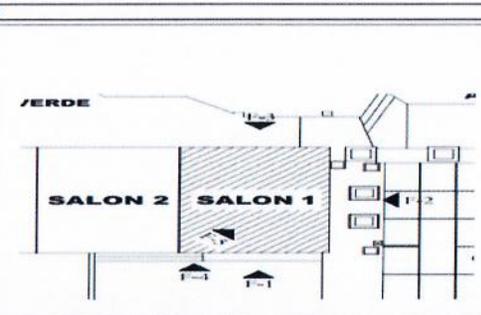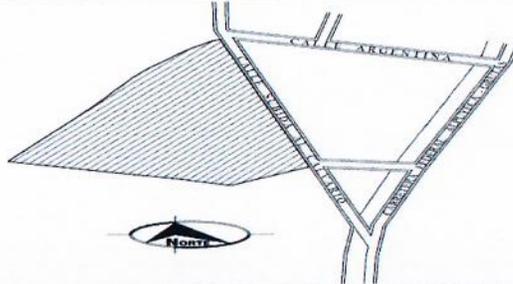

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Subida al Calvario
S/N, Col. Justo Sierra, Mazatepec, Morelos.

FOTOS (ANTES)

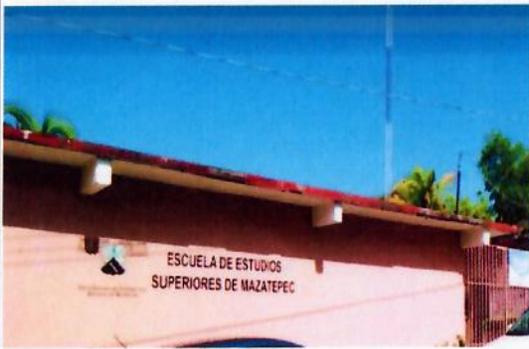


F1: Fachada principal



F2: lateral

Comentarios de los trabajos realizados:

Conforme a oficio 511-3/2019-1273 la Dirección de Fortalecimiento Institucional (DFI) aprobó la rectificación del proyecto denominado, "Segunda Etapa de la Escuela de Estudios Superiores de Atitlahucan (EESAT)", en el cual se considera la Construcción de dos aulas en la segunda planta, un módulo sanitario para hombres y mujeres en la segunda planta, tres cubículos en la segunda planta y Construcción de estructura (diez contrafuertes), es importante mencionar que la obra conserva el monto autorizado, no cambia la sede y permanece el nombre del proyecto. Por otra parte, una vez que la institución ha cumplido con la captura de los proyectos en el Sistema Integral de Gestión Financiera (SIGEF) y al no contar con el estatus de los proyectos, el Coordinador General de Planeación y Administración, Dr. Alvaro Zamudio Lara solicitó mediante oficio CGPyA/712/2019 a la Directora General de Presupuesto y Gasto Público de Gobierno del Estado, C.P. Yaniré Quiroz Salgado, respuesta al estatus que guardan los proyectos, con la finalidad de proceder a la elaboración de la Solicitud de Liberación de Recursos (LSR).



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIMORDIAL

1

Nombre de la obra:

Equipamiento de Espacios Académicos del campus Sur/poniente (Miacatlán)




UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Escudo de la universidad

Porcentaje de avance

0%

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

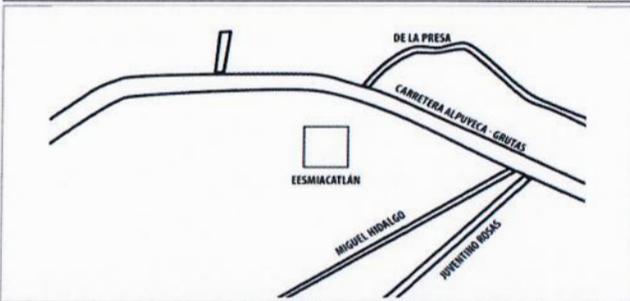

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Alpuyeca-Grutas S/N Col. La Toma, Miacatlán, Morelos. C.P. 62605

FOTOS (ANTES)




F1: Fachada principal




F2: lateral

Comentarios de los trabajos realizados:

Conforme a oficio 511-3/2019-1273 la Dirección de Fortalecimiento Institucional (DFI) aprobó la rectificación del proyecto denominado, "Segunda Etapa de la Escuela de Estudios Superiores de Atlixahucan (EESAII)", en el cual se considera la Construcción de dos aulas en la segunda planta, un módulo sanitario para hombres y mujeres en la segunda planta, tres cubículos en la segunda planta y Construcción de estructura (diez contrafuertes), es importante mencionar que la obra conserva el monto autorizado, no cambia la sede y permanece el nombre del proyecto. Por otra parte, una vez que la Institución ha cumplido con la captura de los proyectos en el Sistema Integral de Gestión Financiera (SIGEF) y al no contar con el estatus de los proyectos, el Coordinador General de Planeación y Administración, Dr. Alvaro Zamudio Lara solicitó mediante oficio CGPyA/712/2019 a la Directora General de Presupuesto y Gasto Público de Gobierno del Estado, C.P. Yaniré Quiroz Salgado, respuesta al estatus que guardan los proyectos, con la finalidad de proceder a la elaboración de la Solicitud de Liberación de Recursos (LSR).

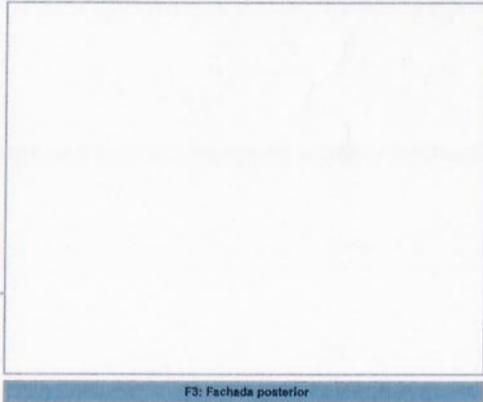

F3: Fachada posterior

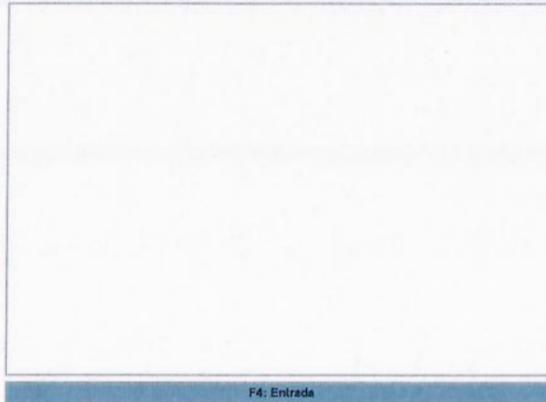

F4: Entrada



F5: Interior de aula

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Agosto 2019

FECHA DE CORTE: 31/08/2019

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRECEDENCIA

1

Nombre de la obra:

Equipamiento de Espacios Académicos del campus Surponiente (Tetecala)



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Facultad de la universidad

Porcentaje de avance

0%

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Av. Lazaro Cardenas, Esquina con Altamirano S/N, colonia centro C.P. 62620 en el Municipio de Tetecala, Morelos.

FOTOS (ANTES)



F1: Fachada principal



F2: lateral

Comentarios de los trabajos realizados:

Conforme a oficio 511-3/2019-1273 la Dirección de Fortalecimiento Institucional (DFI) aprobó la rectificación del proyecto denominado, "Segunda Etapa de la Escuela de Estudios Superiores de Atlixahucan (EESAII)", en el cual se considera la Construcción de dos aulas en la segunda planta, un módulo sanitario para hombres y mujeres en la segunda planta, tres cubículos en la segunda planta y Construcción de estructura (diez contrafuertes), es importante mencionar que la obra conserva el monto autorizado, no cambia la sede y permanece el nombre del proyecto. Por otra parte, una vez que la Institución ha cumplido con la captura de los proyectos en el Sistema Integral de Gestión Financiera (SIGEF) y al no contar con el estatus de los proyectos, el Coordinador General de Planeación y Administración, Dr. Alvaro Zamudio Lara solicitó mediante oficio CGPyA/712/2019 a la Directora General de Presupuesto y Gasto Público de Gobierno del Estado, C.P. Yaniré Quiroz Salgado, respuesta al estatus que guardan los proyectos, con la finalidad de proceder a la elaboración de la Solicitud de Liberación de Recursos (LSR).



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL


PRIORIDAD

2

Nombre de la obra:

Segunda Etapa de la Escuela de Estudios Superiores de Atlatlauhacán

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

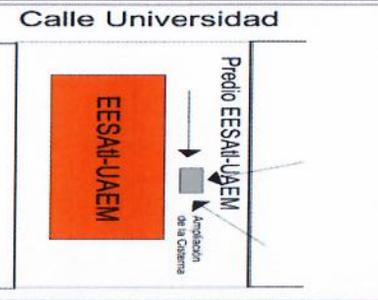

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Calle Universidad S/N Barrio San Antonio
Atlatlauhacán, Morelos C.P. 62840



Estado de la universidad

Porcentaje de avance

0%

FOTOS (ANTES)



F1: Fachada principal




F2: Interior

Comentarios de los trabajos realizados:

Conforme a oficio 511-3/2019-1273 la Dirección de Fortalecimiento Institucional (DFI) aprobó la rectificación del proyecto denominado, "Segunda Etapa de la Escuela de Estudios Superiores de Atlatlauhacán (EESAUJ)", en el cual se considera la Construcción de dos aulas en la segunda planta, un módulo sanitario para hombres y mujeres en la segunda planta, tres cubículos en la segunda planta y Construcción de estructura (diez contrafuertes), es importante mencionar que la obra conserva el monto autorizado, no cambia la sede y permanece el nombre del proyecto. Por otra parte, una vez que la Institución ha cumplido con la captura de los proyectos en el Sistema Integral de Gestión Financiera (SIGEF) y al no contar con el estatus de los proyectos, el Coordinador General de Planeación y Administración, Dr. Alvaro Zamudio Lara solicitó mediante oficio CGPyA/712/2019 a la Directora General de Presupuesto y Gasto Público de Gobierno del Estado, C.P. Yaniré Quiroz Salgado, respuesta al estatus que guardan los proyectos, con la finalidad de proceder a la elaboración de la Solicitud de Liberación de Recursos (LSR).



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial: se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Agosto 2019



FECHA DE CORTE: 31/08/2019

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRINCIPAL 3

Nombre de la obra: Segunda etapa planta alta para laboratorios en la Escuela de Estudios Superiores de Xalostoc

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Av. Nicolás Bravo SIN Parque Industrial Cuautla
C.P. 62715



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Escuela de la comunidad

Porcentaje de avance

0%

FOTOS (ANTES)




F1: Fachada principal




F2: lateral

Comentarios de los trabajos realizados:


Conforme a oficio 511-3/2019-1273 la Dirección de Fortalecimiento Institucional (DFI) aprobó la rectificación del proyecto denominado, "Segunda Etapa de la Escuela de Estudios Superiores de Atlahuacan (EESATII)", en el cual se considera la Construcción de dos aulas en la segunda planta, un módulo sanitario para hombres y mujeres en la segunda planta, tres cubículos en la segunda planta y Construcción de estructura (diez contrafuertes), es importante mencionar que la obra conserva el monto autorizado, no cambia la sede y permanece el nombre del proyecto. Por otra parte, una vez que la Institución ha cumplido con la captura de los proyectos en el Sistema Integral de Gestión Financiera (SIGEF) y al no contar con el estatus de los proyectos, el Coordinador General de Planeación y Administración, Dr. Alvaro Zamudio Lara solicitó mediante oficio CGSPyA/712/2019 a la Directora General de Presupuesto y Gasto Público de Gobierno del Estado, C.P. Yaniré Quiroz Salgado, respuesta al estatus que guardan los proyectos, con la finalidad de proceder a la elaboración de la Solicitud de Liberación de Recursos (LSR).



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F6: Interior de aula


Dr. Gustavo Uruza Estrán
Rector


Arq. Oscar Enrique Lastra Ferrández
Director General de Infraestructura

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra
