



RECTORÍA

ACUSE



"1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata"

Cuernavaca, Morelos, 9 de julio de 2019
R/246/2019

13:43 Lorena

DR. ISAÍAS ELIZARRARAZ ALCARAZ
DIRECTOR
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

PRESENTE

En el marco del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), hago llegar a Usted lo siguiente:

- Informes FAM 2015 y 2016 correspondiente al mes de junio de 2019, mismos que se envían de manera impresa con su respectiva firma.
- Informes FAM 2018 (mantenimientos y adecuaciones de espacios) correspondientes al mes de junio de 2019 debidamente firmados y en formato PDF. En respuesta al oficio No. 511-3/2019-0966, la fecha para la conclusión de las obras conforme a Convenio Modificatorio celebrado con el Instituto Estatal de Infraestructura Educativa del Estado de Morelos (INEIEM) es al 30 de septiembre de 2019.
- Informes FAM 2019 correspondiente al mes de junio de 2019 debidamente firmados y en formato PDF. Conforme a oficio No. 511-3/2019-0966, se adjunta copia de oficio No. CGPyA/469/2019.

Finalmente, le comento que los informes anteriormente referidos han sido enviados en los tiempos establecidos, a las cuentas de correo electrónico isaías.elizarraz@nube.sep.gob.mx, rocio@nube.sep.gob.mx, cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx para su revisión.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.



RECTORÍA

Atentamente
Por una humanidad culta

DR. GUSTAVO URQUIZA BELTRÁN
RECTOR



C.c.p. Dra. Carmen Enequina Rodríguez Armenta -Directora General de Educación Superior Universitaria. Para su conocimiento.
Dr. Álvaro Zamudio Lara- Coordinador General de Planeación y Administración. Mismo fin.
Dr. Pedro Antonio Márquez Aguilar- Director General de Planeación Institucional. Mismo fin.
✓ Archivo.
GUB/AZL/PAMA/ANPM/iir

Av. Universidad 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca Morelos, México, 62209. Piso 7º. Piso Torre de Rectoría Tel. (777) 329 7001, 329 70 02/ rectoria@uaem.mx



Una universidad de excelencia

RECTORÍA
2017-2023

2019



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado: Junio 2019
FECHA DE CORTE: 30/06/2019

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Entidad federativa: Morelos

Clave Inst: 911: 17MSU001/P



Nombre: Álvaro Zamudio Lara
Cargo: Coordinador General de Planeación y Administración
Teléfono: (777) 3 29 76 00 Ext. 7033 y 4312
Correo electrónico: azamudio@uaem.mx

Nombre: Oscar Gabriel Lázaro Fernández
Cargo: Director General de Infraestructura
Teléfono: (777) 3 29 79 00 Ext. 3136
Correo electrónico: oscar.lazaro@uaem.mx

RESPONSABLES

Planeación

Obras y Mantenimiento

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Table with columns: Prioridad, Nombre del proyecto, Tipo de proyecto, Monto autorizado, Monto ejercido, Remanente, Avance del proyecto, Acciones que sustentan el avance, Acciones por realizar, % de avance, Fechas, Observaciones, ¿Es susceptible de ser inaugurada?, Si ya fue inaugurada, Cuenta con Acta.

Signature of Dr. Gustavo Urquiza Balcázar

Dr. Gustavo Urquiza Balcázar
Rector

Signature of Arq. Oscar Gabriel Lázaro Fernández

Arq. Oscar Gabriel Lázaro Fernández
Director General de Infraestructura

- 1 Se capturan los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tantas fotos como sean necesario.
2 En esta sección se redactará de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

2019

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Junio 2019
FECHA DE CORTE: 30/06/2019

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL




Estado de Morelos

Porcentaje de avance

0%

Nombre de la obra: **Equipamiento de Espacios Académicos del campus Sur/poniente (Jicarero)**


CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

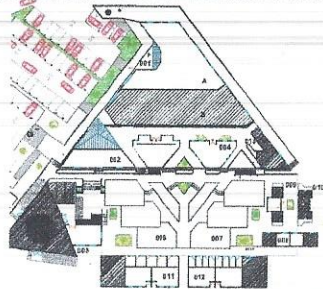

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Galeana-Tequesquitengo S/N
Col. El Jicarero
C.P. 62909 en el Municipio de Jojutla, Morelos.

FOTOS

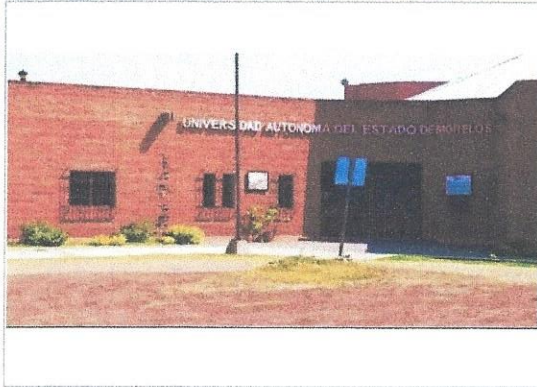


F1: Fachada principal




F2: lateral

Comentarios de los trabajos realizados:


En respuesta al oficio CCPyA/489/2019 (se adjunta) de fecha 9 de mayo del 2019, la Subprocuradora de Recursos Administrativos Consultas y Contencioso Estatal de la Secretaría de Hacienda, dio a conocer mediante oficio PFE/E/IN/1714/2019 las observaciones y sugerencias para realizar los ajustes correspondientes al convenio denominado "Convenio para la Transferencia y Ejecución de Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraestructura Educativa de Nivel Superior". En seguimiento al oficio citado con anterioridad la Coordinación de Programación y Presupuesto de la Dirección General de Coordinación de Programas Federales remitió oficio SH/CPFD/DCFP/09880/JG/2019 de fecha 13 de junio del 2019, dirigido al Rector de la institución, Gustavo Urquiza Boltrán, en éste oficio se solicita recibir su firma y así estar en condiciones de continuar con las gestiones necesarias ante las instancias estatales correspondientes para recabar las firmas correspondientes. En respuesta la institución mediante oficio CCPyA/603/2019 de fecha 17 de junio de 2019, envió a la Coordinación de Programación y Presupuesto en versión impresa (dos tintos) en original del convenio debidamente firmado por el Rector, para finalmente recabar la firma del Secretario de Hacienda, L.C. José Alejandro Jesús Villareal Gasca, y llevar a cabo la ministración de los recursos.

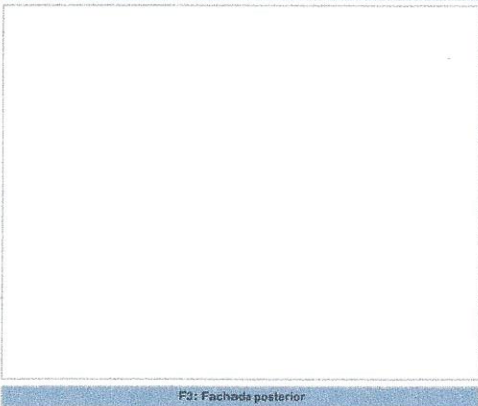

F3: Fachada posterior

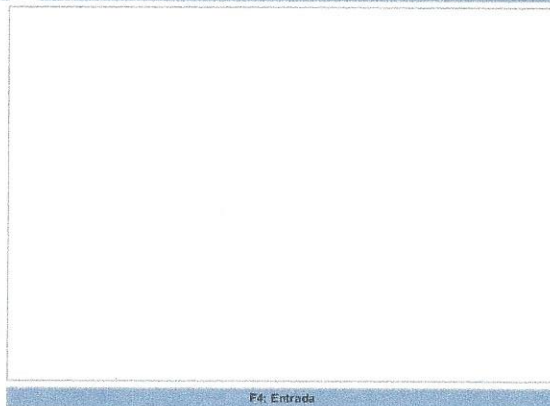

F4: Entrada

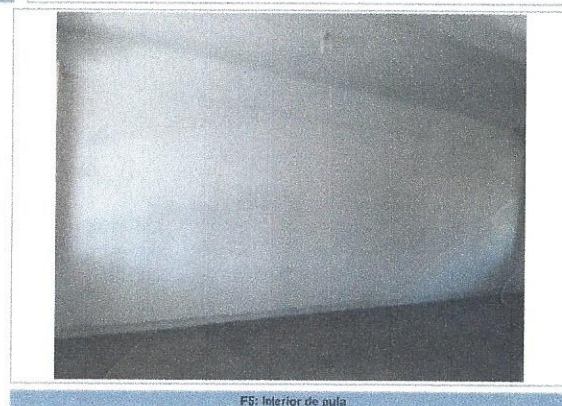

F5: Interior de aula

Dr. Gustavo Urquiza Boltrán
Rector

Aracelis Gabriel Laguna Fernández
Director General de Infraestructura

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Junio 2019

FECHA DE CURTE: 30/06/2019

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PROYECTO

1

Nombre de la obra:

Equipamiento de Espacios Académicos del campus Sur/poniente (Jojutla)




UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Escuela de Ingeniería

Porcentaje de avance

0%


CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

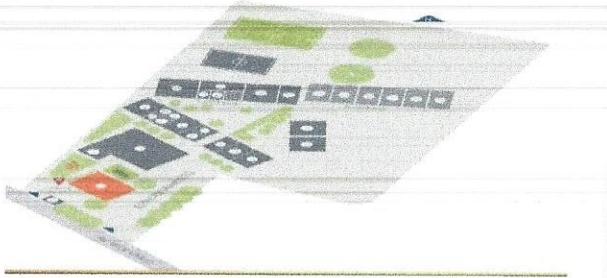


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Av. 18 de marzo # 617, Col. Emiliano Zapata C.P. 62900 Municipio de Jojutla de Juárez, Morelos.

FOTOS

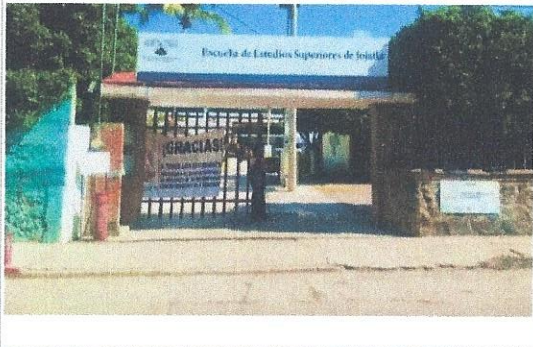


F1: Fachada principal




F2: lateral

Comentarios de los trabajos realizados:

En respuesta al oficio CQP/VA/68/2019 (se adjunta) de fecha 9 de mayo del 2019, la Subprocuradora de Recursos Administrativos Consultas y Contencioso Estatal de la Secretaría de Hacienda, dio a conocer mediante oficio PFE/EM/1714/2019 las observaciones y sugerencias para realizar los ajustes correspondientes al convenio denominado "Convenio para la Transferencia y Ejecución de Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraestructura Educativa de Nivel Superior". En seguimiento al oficio citado con anterioridad la Coordinación de Programación y Presupuesto de la Dirección General de Coordinación de Programas Federales remitió oficio SH/CP/DC/CP/PROB/UG/2019 de fecha 13 de junio del 2019, dirigido al Rector de la institución, Gustavo Urquiza Bellrán, en este oficio se solicita recibir su firma y estar en condiciones de continuar con las gestiones necesarias ante las instancias estatales correspondientes para recabar las firmas correspondientes. En respuesta la Institución mediante oficio CQP/VA/69/2019 de fecha 17 de junio de 2019, envió a la Coordinación de Programación y Presupuesto en versión impresa (dos ejemplares) en original del convenio debidamente firmado por el Rector, para finalmente recabar la firma del Secretario de Hacienda, L.C. José Alejandro Jesús Villarreal Gascá, y llevar a cabo la ministración de los recursos.



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula

Dr. Gustavo Urquiza Bellrán
Rector

Arq. Oscar Gabriel Losira Fernández
Director General de Infraestructura

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Junio_2019
FECHA DE CURTIR: JUNIO 20 19

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL




Estado de Morelos
Porcentaje de avance


0%

<p>PROYECTO 1 Nombre de la obra: Equipamiento de Espacios Académicos del campus Sur/poniente (Miacatlán)</p>	<p>CROQUIS DE LOCALIZACIÓN</p>		<p>UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO</p> <p>Carretera Alpuyecá -Grutas S/N Col. La Torna, Miacatlán, Morelos. C.P. 62605</p>
---	--------------------------------	--	--

FOTOS

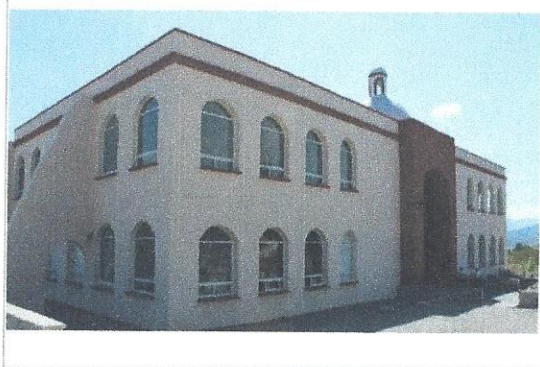


F1: Fachada principal




F2: lateral

Comentarios de los trabajos realizados:

En respuesta al oficio CGPyA/488/2019 (se adjunta de fecha 9 de mayo del 2019, la Subprocuradora de Recursos Administrativos Consultas y Contencioso Estatal de la Secretaría de Hacienda, dio a conocer mediante oficio PFE/SE/1714/2019 las observaciones y sugerencias para realizar los ajustes correspondientes al convenio denominado "Convenio para la Transferencia y Ejecución de Recursos del Fondo de Aportaciones Ilíquidas en su componente de Infraestructura Educativa de Nivel Superior". En seguimiento al oficio citado con anterioridad la Coordinación de Programación y Presupuesto de la Dirección General de Coordinación de Programas Federales remitió oficio SHCP/PRODIGC/PF/660/JG/2019 de fecha 13 de junio del 2019, dirigido al Rector de la institución, Gustavo Urquiza Beltrán, en éste oficio se solicita recibir su firma y así estar en condiciones de continuar con las gestiones necesarias ante las instancias estatales correspondientes para recabar las firmas correspondientes. En respuesta la institución mediante oficio CGPyA/503/2019 de fecha 17 de junio de 2019, envió a la Coordinación de Programación y Presupuesto en versión impresa (dos tintas) en original del convenio debidamente firmado por el Rector, para finalmente recabar la firma del Secretario de Hacienda, L.C. José Alejandro Jesús Vilareal Gasca, y llevar a cabo la ministración de los recursos.



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector

Arq. Oscar Gabriel Lasra Fernández
Director General de Infraestructura

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

AVG

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportando

Junio 2019

FECHA DE CORTES: 30/06/2019

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL


PROYECTO

1

Nombre de la obra:

Equipamiento de Espacios Académicos del campus Sur/poniente (Mazatepec)

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

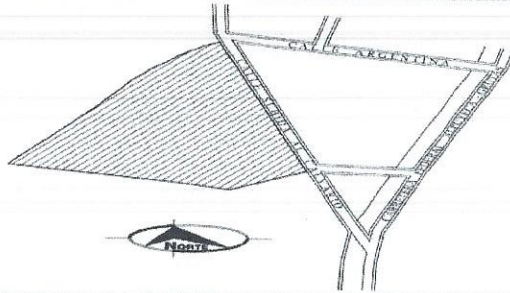

UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO

Subida al Calvario
S/N, Col. Justo Sierra, Mazatepec, Morelos.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Estado de Morelos


Porcentaje de avance

0%

FOTOS




F1: Fachada principal

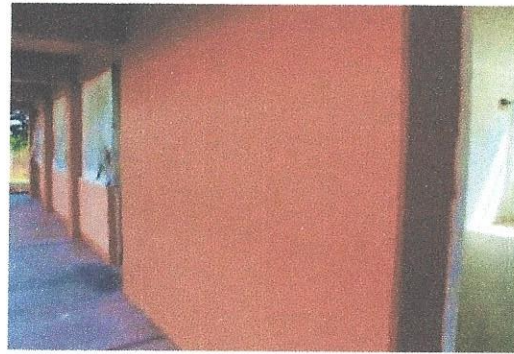


F2: lateral

Comentarios de los trabajos realizados:

En respuesta al oficio CGPyA/469/2019 (se adjunta) de fecha 9 de mayo del 2019, la Subprocuradora de Recursos Administrativos Consultas y Contencioso Estable de la Secretaría de Hacienda, dio a conocer mediante oficio PRE/EN/174/2019 las observaciones y sugerencias para realizar los ajustes correspondientes al convenio denominado "Convenio para la Transferencia y Ejecución de Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraestructura Educativa de Nivel Superior". En seguimiento al oficio citado con anterioridad la Coordinación de Programación y Presupuesto de la Dirección General de Coordinación de Programas Federales remitió oficio SIV/CP/DGCF/0880/LC/2019 de fecha 13 de junio del 2019, dirigido al Rector de la Institución, Gustavo Urquiza Beltrán, en este oficio se solicita recibir su firma y estar en condiciones de continuar con las gestiones necesarias; toda las instancias estatales correspondientes para recabar las firmas correspondientes. En respuesta la institución mediante oficio CGPyA/603/2019 de fecha 17 de junio de 2019, envío a la Coordinación de Programación y Presupuesto en versión impresa (dos tomos) en original del convenio debidamente firmado por el Rector, para finalmente recabar la firma del Secretario de Hacienda, L.C. José Alejandro Jesús Vitaroff Gasca, y llevar a cabo la ministración de los recursos.



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector

Arq. Oscar Gabriel Lostra Fernández
Director General de Infraestructura

* Es muy importante que se anexe reporta fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Junio_2019

FECHA DE CUERTE: 06/06/2019

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PROYECTO

2

Nombre de la obra:

Segunda Etapa de la Escuela de Estudios Superiores de Atlahuchacán




UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Estado de la universidad


Porcentaje de avance

0%

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

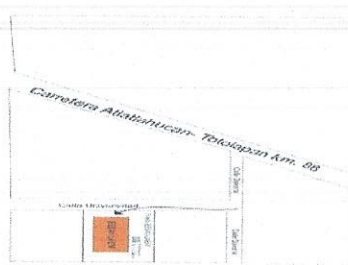

Calle Universidad

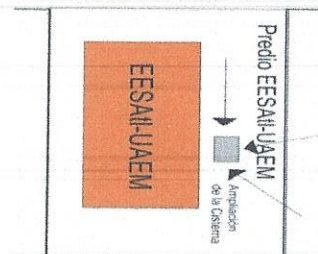

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Calle Universidad S/N Barrio San Antonio
Atlahuchacán, Morelos C.P. 62840

FOTOS




F1: Fachada principal




F2: lateral



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula

Comentarios de los trabajos realizados:

En respuesta al oficio CGPYA/468/2019 (se adjunta) de fecha 9 de mayo del 2019, la Subprocuradora de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Estatales de la Secretaría de Hacienda, dio a conocer mediante oficio PFE/EN/1714/2019 las observaciones y sugerencias para realizar los ajustes correspondientes al convenio denominado "Convenio para la Transferencia y Ejecución de Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraestructura Educativa de Nivel Superior". En seguimiento al oficio citado con anterioridad la Coordinación de Programación y Presupuesto de la Dirección General de Coordinación de Programas Federales remitió oficio SH/CCP/DGCF/0980/JG/2019 de fecha 13 de junio del 2019, al Rector de la Institución, Gustavo Urquiza Bellán, en éste oficio se solicita recibir su firma y así estar en condiciones de continuar con las gestiones necesarias ante las instancias estatales correspondientes, para recabar las firmas correspondientes. En respuesta la institución mediante oficio CGPYA/503/2019 de fecha 17 de junio de 2019, envió a la Coordinación de Programación y Presupuesto en versión impresa (dos tentos) en original del convenio debidamente firmado por el Rector, para finalmente recabar la firma del Secretario de Hacienda, L.C. José Alejandro Jesús Villarreal Gasca, y llevar a cabo la ministración de los recursos.

Dr. Gustavo Urquiza Bellán
Rector

Arq. Oscar Gabriel Luján Fernández
Director General de Infraestructura

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Junio 2019
FECHA DE CORTE: 30/06/2019

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Estado de Morelos

Porcentaje de avance

0%

PROYECTO

1

Nombre de la obra:


Equipamiento de Espacios Académicos del campus Sur/poniente (Tetecala)

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Av. Lazaro Cardenas, Esquina con Altamirano
S/N, colonia
centro C.P. 62620 en el Municipio de Tetecala,
Morelos.


FOTOS

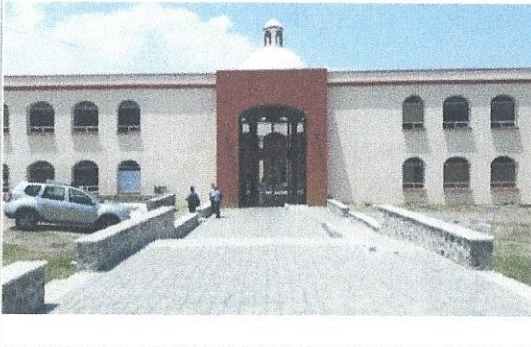

F1: Fachada principal



F2: lateral



F3: Fachada posterior



F4: Entrada

Comentarios de los trabajos realizados:

En respuesta al oficio CGPyA/469/2019 (se adjunta) de fecha 9 de mayo del 2019, la Subprocuradora de Recursos Administrativos Consultas y Contencioso Estatal de la Secretaría de Hacienda, dio a conocer mediante oficio PFE/EM/1714/2019 las observaciones y sugerencias para realizar los ajustes correspondientes al convenio suscritado "Convenio para la Transferencia y Ejecución de Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraestructura Educativa de Nivel Superior". En seguimiento al oficio citado con anterioridad la Coordinación de Programación y Presupuesto de la Dirección General de Coordinación de Programas Federales remitió oficio SH/CP/DOC/F/0804/2019 de fecha 13 de junio del 2019, dirigido al Rector de la institución, Gustavo Urquiza Boltrán, en este oficio se solicita recibir su firma y así estar en condiciones de continuar con las gestiones necesarias entre las instancias estatales correspondientes para recabar las firmas correspondientes. En respuesta la institución mediante oficio CGPyA/603/2019 de fecha 17 de junio de 2019, envió a la Coordinación de Programación y Presupuesto en versión impresa (dos tomos) en original del convenio debidamente firmado por el Rector, para finalmente recabar la firma del Secretario de Hacienda, L.C. José Alejandro Jesús Villarreal Gasca, y llevar a cabo la ministración de los recursos.



F5: Interior de aula

Dr. Gustavo Urquiza Boltrán
Rector

Arq. Oscar Gabriel Lostra Fernández
Director General de Infraestructura

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Junio 2019

FECHA DE CORTE: 30/06/2019

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS


Porcentaje de avance

0%

PRORIDAD **3**

Nombre de la obra: **Segunda etapa planta alta para laboratorios en la Escuela de Estudios Superiores de Xalostoc**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

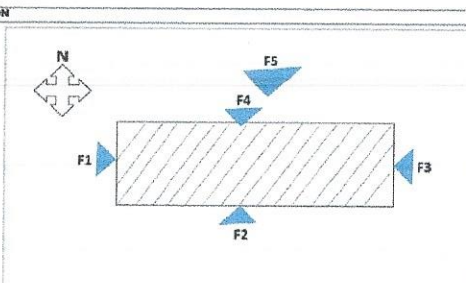

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Av. Nicolas Bravo S/N Parque Industrial Cuartilla
C.P. 62715

FOTOS




F1: Fachada principal




F2: lateral

Comentarios de los trabajos realizados:


En respuesta al oficio CGPyA469/2019 (se adjunta) de fecha 9 de mayo del 2019, la Subprocuradora de Recursos Administrativos Consultas y Contencioso Estatal de la Secretaría de Hacienda, dio a conocer mediante oficio PFE/EA/17/14/2019 las observaciones y sugerencias para realizar los ajustes correspondientes al convenio denominado "Convenio para la Transferencia y Ejecución de Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraestructura Educativa de Nivel Superior". En seguimiento al oficio citado con anterioridad la Coordinación de Programación y Presupuesto de la Dirección General de Coordinación de Programas Federales remitió oficio SH/CP/DGCP/A080/JG/2019 de fecha 13 de junio del 2019, dirigido al Rector de la institución, Gustavo Urquiza Beltrán, en este oficio se solicita recibir su firma y así estar en condiciones de continuar con las gestiones necesarias ante las instancias estatales correspondientes para recibir las firmas correspondientes. En respuesta la institución mediante oficio CGPyA463/2019 de fecha 17 de junio de 2019, envió a la Coordinación de Programación y Presupuesto en versión impresa (dos lotos) en original del convenio debidamente firmado por el Rector, para finalmente recibir la firma del Secretario de Hacienda, L.C. José Alejandro Jesús Villareal Gasca, y llevar a cabo la ministración de los recursos.



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.
