

ACUSE

11:40 Laura



RECTORÍA

Copia

2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar"

Cuernavaca, Morelos, 11 de noviembre de 2019.  
R/440/2019.

DR. ISAÍAS ELIZARRAZ ALCARAZ  
DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
PRESENTE




En el marco del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), hago llegar a Usted lo siguiente:



- Informe FAM 2015, correspondiente al mes de octubre de 2019, impreso y firmado, así como la documentación respectiva.
- Informe FAM 2016, correspondiente al mes de octubre de 2019, impreso y firmado.
- Informe FAM 2019, correspondiente al mes de octubre de 2019, debidamente firmado en formato PDF.

Así mismo, informo a usted que dicha información se ha remitido a los correos electrónicos [isaías.elizarraz@nube.sep.gob.mx](mailto:isaías.elizarraz@nube.sep.gob.mx) , [rocio@nube.sep.gob.mx](mailto:rocio@nube.sep.gob.mx) y [cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx](mailto:cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx) para su revisión.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo cordial.



Atentamente  
Por una humanidad culta



RECTORÍA DR. GUSTAVO URQUIZA BELTRÁN  
RECTOR



- C.c.p. Dra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta. - Directora General de Educación Superior Universitaria. Para su conocimiento.  
Dr. Alvaro Zamudio Lara. - Coordinador General de Planeación y Administración. Mismo fin.  
Dr. Pedro Antonio Márquez Aguilar. - Director de Planeación Institucional. Mismo fin.  
✓ Archivo.

GUB/AZL/PAMA/ANPM/ngpb



**REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL**

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: **Universidad Autónoma del Estado de Morelos**

Entidad federativa: **Morelos**

Clave Inst 911: **17MSU0017P**



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Nombre: **Alvaro Zamudio Lara**  
Cargo: **Coordinador General de Planeación y Administración**  
Teléfono: **(777) 3 29 70 00 Ext. 7033 y 4312**  
Correo electrónico: **azamudio@uaem.mx**

**RESPONSABLES**

Planeación

Obras y Mantenimiento

Nombre: **Oscar Gabriel Lastra Fernández**  
Cargo: **Director General de Infraestructura**  
Teléfono: **(777) 3 29 70 00 Ext. 3138**  
Correo electrónico: **oscar.lastra@uaem.mx**

**DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO**

**OBRA CONCLUIDA**

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Avance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto <sup>1</sup>			Acciones que se han realizado <sup>2</sup>	Acciones por realizar	% de avance	Fecha <sup>3</sup>		Observaciones	¿Es inauguración de ser inaugurada? (Cuentas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas		
		Obras de construcción y rehabilitación	Rehabilitación	Ampliación y renovación	Equipamiento				Proyecto sustanciable	Disponibilidad	condición				metros cuadrados	Inicio			Término	¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quien y cuándo inauguró?	Entrega-Recapitulado (Acta Recapitulado)	Acta Administrativa de Entrega-Recapitulado
<b>GLOBAL DEL PROYECTO</b>																							
1	Equipamiento de Espacios Académicos del campus Sur/poniente	X				\$ 3,564,676.94	\$ 3,564,676.94										La Dirección de Recursos Materiales realizó el proceso de Licitación Pública de acuerdo a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público						
<b>GLOBAL DEL PROYECTO</b>																							
2	Segunda Etapa de la Escuela de Estudios Superiores de Atlatlahucán	X				\$ 10,000,000.00	\$ 10,000,000.00		2 Aulas 3 cubículos 1 módulo sanitario para hombres y mujeres y estructura (10 contrafuertes)	7	241.16		1) Construcción de 2 Aulas, 3 Cubículos y 1 Módulo Sanitario para Hombres y Mujeres que incluye las partidas de: Se inician trabajos estructura, terracería y en la estructura del cancelería, instalación edificio para la hidromasera, construcción de los instalaciones eléctricas, contrafuertes en la instalación de voz y partida de trabajos datos, infraestructura preliminar para suministro y telecomunicaciones habilitado de acero para incorporar a la trazo y red LAEM, y excavaciones escaleras. 2) Estructura (10 Contrafuertes) que incluye las partidas de trabajos preliminares y cimentación	3%	15/12/19	31/12/20	El comité de Infraestructura de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, adjudicó el contrato por excepción al procedimiento de Licitación Pública según acuerdo número 01/01a-C/30-09-2019, tomado en la tercera sesión ordinaria del referido Órgano Colegiado celebrada en fecha 30 de septiembre de 2019.						
<b>GLOBAL DEL PROYECTO</b>																							
3	Segunda etapa planta alta para laboratorios en la Escuela de Estudios Superiores de Xalostoc	X				\$ 7,553,236.96	\$ 7,553,236.96		4 laboratorios (incluye cubículo y almacén de reactivos), pasillo, escaleras, sítio y áreas exteriores estacionamiento.	6	374.60		Construcción de 4 laboratorios (incluye cubículo y almacén de reactivos, pasillo y escaleras, sítio y estacionamiento) que incluye las partidas de: Se inician trabajos preliminares, estructura albañilería, instalación eléctrica, demolición de área acondicionado, concreto sobre que instalación techumbre al acero de columnas. Sistema externo de protección contra tormentas eléctricas, iluminación exterior, obra civil voz y datos, infraestructura para telecomunicaciones para incorporar a la red LAEM, terracería y cancelería	3%	15/12/19	31/12/20	El comité de Infraestructura de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, adjudicó el contrato por excepción al procedimiento de Licitación Pública según acuerdo número 02/01a-C/30-09-2019, tomado en la tercera sesión ordinaria del referido Órgano Colegiado celebrada en fecha 30 de septiembre de 2019.						
<b>GLOBAL DEL PROYECTO</b>																							
						\$21,117,916.90	\$0.00	\$21,117,915.90															

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán  
Rector

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández  
Director General de Infraestructura

1 Se capturan los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta filas como sea necesario.  
2 En esta sección se redactará de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.  
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

2019



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**Octubre\_2019**  
FOLIO DE CONTINENTE



REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRORIDAD

1

Nombre de la obra: **Equipamiento de Espacios Académicos del campus Sur/poniente (Jicarero)**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

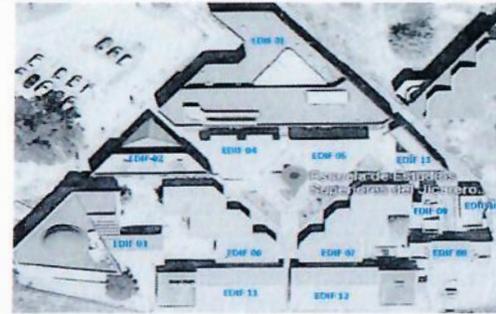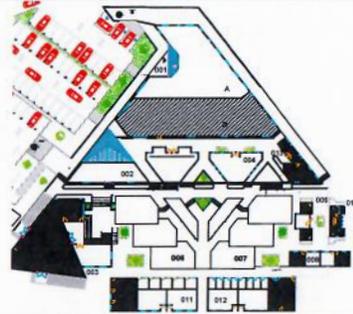

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Galeana-Tequesquitengo S/N Col. El Jicarero  
C.P. 62909 en el Municipio de Jojutla, Morelos.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

0%

FOTOS (ANTES)



F1: Fachada principal



F2: lateral

Comentarios de los trabajos realizados:

La Dirección de Recursos Materiales realizó el proceso de Licitación Pública de acuerdo a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: interior de aula


REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



F6: Se colocaran anaqueles en Laboratorio de estudios del lago.



F7: Se colocaran Butacas para auditorio distribuidas en el lado izquierdo y derecho del mismo.

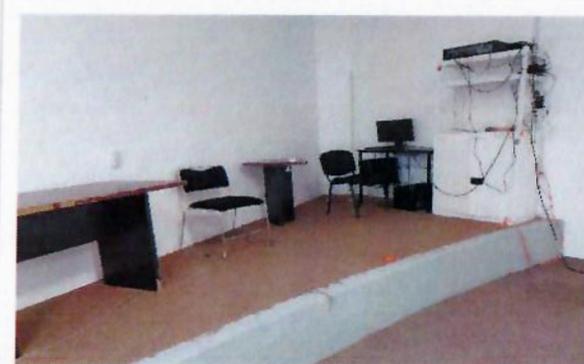

F8: Se conectará un amplificador en el auditorio.



F9: Se colocarán extintores en los laboratorios de Biología y cocina bioterio.



F10: Se colocarán extintores en Edificio 12 y 13.



F11: Se colocarán extintores en Edificio 6 y Camara de Geselle.



F12: Se colocarán persianas en Los laboratorios




F13: Se colocaran 4 persianas en cada aula movil, son 5 aulas .



F14: Se colocaran 56 persianas en las aulas de los edificios 6 ,12 y 13.

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

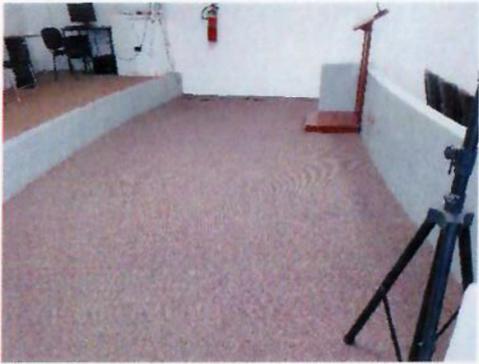

F15: Se colocaran bañe en el auditorio .



F16: Las mesas de laboratorio estarán ubicadas en Laboratorio de estudios del lago.



F17: Los Lockers serán colocados en un costado del laboratorio de Biología.



F18: Se colocaran pizarron en laboratorio de Bacteriología y estudios de lago.



F19: Se colocará sillas para alumnos y sillas para maestros en el Laboratorio de estudios del Lago.

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán  
Rector

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández  
Director General de Infraestructura

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Porcentaje de avance

0%

PRECEDENCIA **1** Nombre de la obra: **Equipamiento de Espacios Académicos del campus Surponiente (Jojutla)**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Av. 18 de marzo # 617, Col. Emiliano Zapata C.P. 62900 Municipio de Jojutla de Juárez, Morelos.

FOTOS (ANTES)



F1: Fachada principal



F2: lateral

Comentarios de los trabajos realizados:

La Dirección de Recursos Materiales realizó el proceso de Licitación Pública de acuerdo a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula



F6: Se colocarán 32 butacas para auditorio en la sala de juicios orales .




F7: Se colocará 1 Pantallas de proyección en el salón 5 y 1 en salón 2.



F8: Se ciocarán 2 Pantallas de proyección en Salón 12 y 15 y 1 en Salón 13.



F9: Se colocarán 4 microfones y 6 sillones ejecutivos para los escritorios que conforman la sala de juicios orales

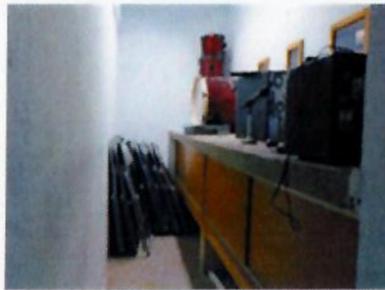

F10: Se colocará Amplificador en Auditorio, cabina.



F11: Se colocarán 2 Baffles parte frontal del Auditorio, con triple.



F12: Se colocaran 2 extintores en el pasillo del edificio 2



F13: Se colocaran 2 extintores en el pasillo de la planta alta del edificio 3



F14: Se colocará 1 extintor en el salón 12 y en el salón 13



F15: Se colocará 1 extintor en el salón 14 y en el salón 15.



F16: Se colocarán 3 aires acondicionados en el Auditorio.



F17: Se colocarán 2 aires acondicionados en el salón 12 y en el salón 13.



F18: Se colocarán 2 aires acondicionados en el salón 14 y en el salón 15.



F19: Se colocará persiana enrollable en Biblioteca



F20: Se colocará en Auditorio, parte de atrás.



F21: Se colocará Podium en Auditorio, parte de enfrente.



F22: Se colocará estación de trabajo en Biblioteca



F23: Se colocará sillas en salón 4

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán  
Rector

Arq. Óscar Gabriel Lastra Fernández  
Director General de Infraestructura

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019




DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**Octubre\_2019**  
FECHA DE CORTE: 21/10/2019

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD **1** Nombre de la obra: **Equipamiento de Espacios Académicos del campus Surponiente (Miacatlán)**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

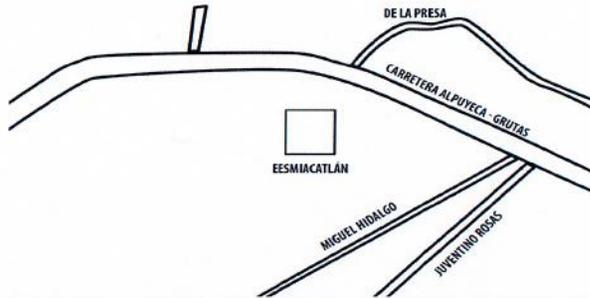

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Alpuyeca -Grutas S/N Col. La Toma,  
Miacatlán, Morelos. C.P. 62605



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

0%

FOTOS (ANTES)




F1: Fachada principal



F2: Interior

Comentarios de los trabajos realizados:

La Dirección de Recursos Materiales realizó el proceso de Licitación Pública de acuerdo a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F6: Interior de aula



F6: Se colocarán butacas en la Plataforma del auditorio.



F7: Mesas para alumnos están ubicadas en la biblioteca



F8: Las mesas para maestros estarán ubicadas en la Biblioteca.



F9: Colocación de Persianas en Auditorio , laboratorio y Biblioteca.



F10: Colocación de Persianas en todas las Aulas de Planta Baja y Planta Alta.



F11: Se instalarán 2 aires acondicionados en Biblioteca, Laboratorio y Auditorio.



F12: Se Instalará un Proyector de tiro largo en el Auditorio.



F13: Se colocarán Sillas para maestro en todas las Aulas de Planta Baja y Planta Alta.

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán  
Rector


Arq. Óscar Gabriel Lastra Fernández  
Director General de Infraestructura

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRORIDAD **1**

Nombre de la obra: **Equipamiento de Espacios Académicos del campus Sur/poniente (Mazatepec)**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

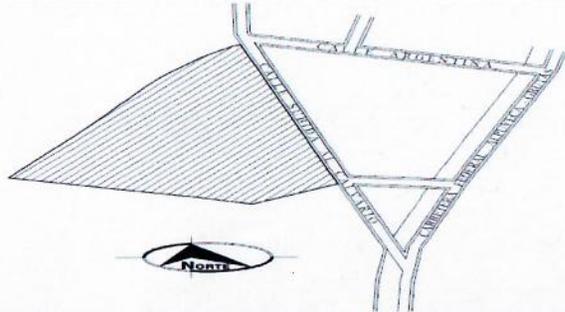

EDIFICIO 1



EDIFICIO 2



EDIFICIO 3



EDIFICIO 4



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Subida al Calvario  
S/N, Col. Justo Sierra, Mazatepec, Morelos.




UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

**0%**

FOTOS (ANTES)

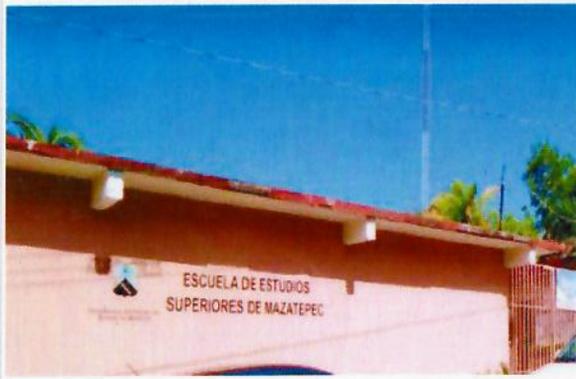

F1: Fachada principal



F2: lateral

Comentarios de los trabajos realizados:

La Dirección de Recursos Materiales realizó el proceso de Licitación Pública de acuerdo a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula



F6: Se colocaran lockers en Aula 1 y Aula 2



F7: Se colocaran Lockers en Pasillo edificio 3



F8: Se colocaran sillas de visita , escritorio Select ,microfonos y sillones ejecutivos en Sala de Juicios Orales



F9: Se colocaran sillas de visita, escritorio select y aire acondicionado en Módulo de asesoría.



F10: Colocación de extintores afuera de Bodega 1 y en caseta de vigilancia



F11: Colocación de extintores afuera de pasillo edificio 1, pasillo de edificio 3 y pasillo de edificio 2.



F12: Colocación de extintores afuera de Módulo de servicios escolares y Centro de Computo.



F13: Se colocará aire acondicionado y bafe en Sala de Radio y Television.



F14: Instalación de Bafe en Sala audiovisual y Centro de Computo.

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



F15: Se usará los baldes para las canchas de usos múltiples.



F16: Se colocarán bocinas en Sala de Juicios Orales



F17: Instalación de Pizarrones en Aulas, sala de reuniones y Biblioteca.



F18: Colocación de Butacas en diferentes Aulas.

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán  
Rector

Arq. Óscar Gabriel Lastra Fernández  
Director General de Infraestructura

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PROYECTO

1

Nombre de la obra:

**Equipamiento de Espacios Académicos del campus Surponiente (Tetecala)**







UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

0%

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

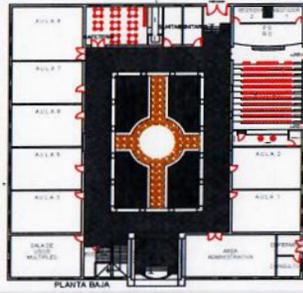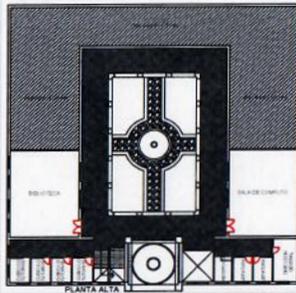

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Av. Lazaro Cardenas, Esquina con Altamirano  
S/N, colonia  
centro C.P. 62620 en el Municipio de Tetecala,  
Morelos.

FOTOS (ANTES)



F1: Fachada principal



F2: lateral

Comentarios de los trabajos realizados:

La Dirección de Recursos Materiales realizó el proceso de Licitación Pública de acuerdo a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.



F3: Se colocarán las butacas para auditorio en el área 6. Auditorio



F4: Se colocarán los bancos para laboratorio en el Aula 3-C



F5: Interior de aula




F6: Se colocará la pantalla de proyección en el área 6. Auditorio y 1 Bafle



F7: Se colocará persiana de 10.50m2 en el Salón 3-A



F8: Se colocará persiana de 11 m2 en el Salón 3-B

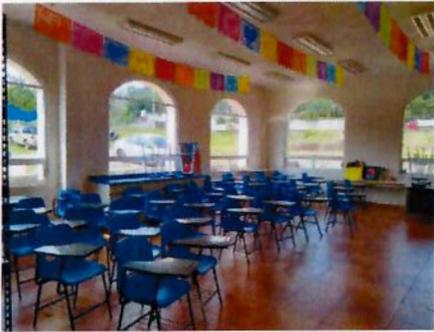

F9: Se colocará la persiana 26.25 m2 en el Salón 3-C



F10: Se colocará persiana de 10.80 m2 en el Salón 11



F11: Se colocará 1 mini split de 2.5 t.r. en el área 4. Biblioteca



F12: Se colocará 3 mini split de 2 t.r. en el área 6. Auditorio



F13: Se colocará 1 mini split de 2.5 t.r. en el área 5. Sala de cómputo



F14: Se colocarán las Mesas de laboratorio en el Salón 3-C

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



F15. Se colocará el proyector de tiro largo en el área 5. Auditorio

A handwritten signature in blue ink, enclosed in a rectangular box. The signature is stylized and appears to be 'G. Urquiza'.

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán  
Rector

A handwritten signature in blue ink, enclosed in a rectangular box. The signature is stylized and appears to be 'O. Lastra'.

Arq. Óscar Gabriel Lastra Fernández  
Director General de Infraestructura

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avances

**3%**


PROYECTO **2**

Nombre de la obra: **Segunda Etapa de la Escuela de Estudios Superiores de Atlatlahucán**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



Calle Universidad

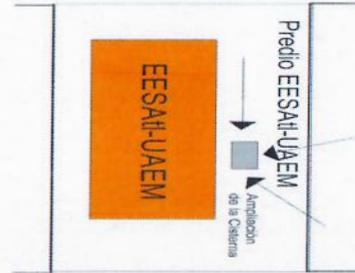


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Calle Universidad S/N Barrio San Antonio Atlatlahucan, Morelos C.P. 62840

FOTOS (ANTES)



F1: Fachada principal

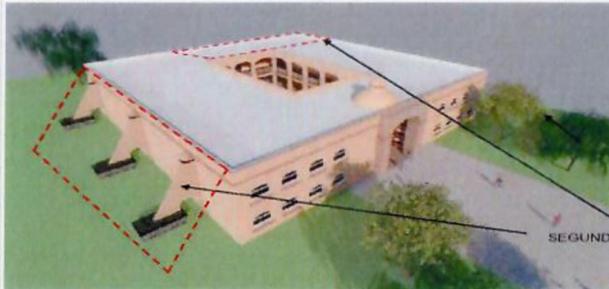

F2: Lateral



F3: Fachada posterior




F4: Entrada

Comentarios de los trabajos realizados:

1.- Construcción de estructura (diez contrafuertes). (F1,F2,F6,F7,F8,F9,F10)

El comité de Infraestructura de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, adjudicó el contrato por excepción al procedimiento de Licitación Pública, según acuerdo número 01/3ra-O/30-09-2019, tomado en la tercera sesión ordinaria del referido Órgano Colegiado celebrada en fecha 30 de septiembre de 2019.

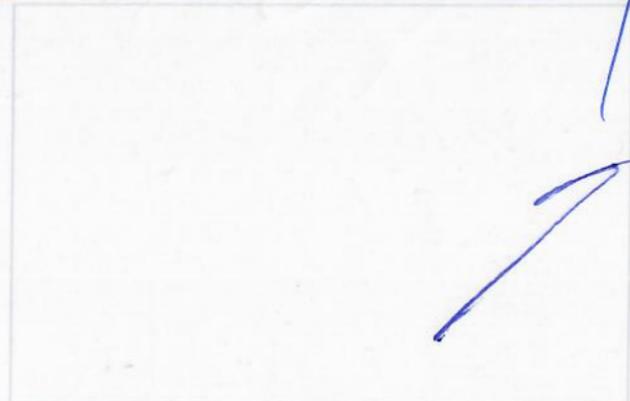

F5: Interior de aula

FOTOS (DURANTE)



F6: Se inician trabajos en la estructura del edificio para la construcción de los contrafuertes.



F7: Habilitado de acero para contrafuertes.



F8: Trazo de contrafuertes.



F9: Excavación para contrafuertes.



F10: Excavación para contrafuertes.

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán  
Rector

Arq. Óscar Gabriel Lastra Fernández  
Director General de Infraestructura

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

**FAM**

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**Octubre\_2019**  
PUNTO DE CONTROL SEMESTRAL

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance


**3%**

PRIMICIA

3

Nombre de la obra: **Segunda etapa planta alta para laboratorios en la Escuela de Estudios Superiores de Xalostoc**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Av. Nicolas Bravo S/N Parque Industrial Cuautla  
C.P. 62715

FOTOS (ANTES)



F1: Fachada principal



F2: lateral

Comentarios de los trabajos realizados:

1.- Construcción de la 2da etapa de planta alta para Laboratorios. (F1,F2,F5,F6,F7,F8,F9,F10)  
El comité de Infraestructura de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, adjudicó el contrato por excepción al procedimiento de Licitación Pública, según acuerdo número 02/3ra O/30-09-2019, tomado en la tercera sesión ordinaria del referido Órgano Colegiado celebrada en fecha 30 de septiembre de 2019.



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F6: Estado en que estaba la Planta Alta.



F6: Estado actual del inmueble

FOTOS (DURANTE)



F7: Demolición de concreto que recubría al acero de columnas



F8: Demolición de concreto pobre que recubría al acero de columnas.



F9: Demolición de concreto pobre que recubría al acero de columnas.



F10: Demolición de concreto pobre que recubría al acero de columnas.

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán  
Rector

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández  
Director General de Infraestructura

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra
