



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Cuernavaca, Morelos, 08 de octubre de 2021

CGPyA/466/2021

ING. SERGIO ROMERO SERRANO
DIRECTOR DE OPERACIÓN TÉCNICA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR
P R E S E N T E

En el marco del **Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Nivel Medio Superior**, en su componente **FAM Regular** se remiten de manera electrónica a los correos: armando.solis@sems.gob.mx, ricardo.hernandez@sems.gob.mx y sergio.romero@sems.gob.mx los informes debidamente firmados correspondientes al tercer trimestre (julio, agosto y septiembre) 2021, como a continuación se presenta:

- Formato de Seguimiento de Acciones de Infraestructura FAM 2014 Preparatoria No.5: **“Construcción de módulos sanitarios de la Escuela Preparatoria No. 5, Puente de Ixtla”**. (Se adjunta documentación respectiva).
- Formato de Seguimiento de Acciones de Infraestructura FAM 2015 Preparatoria No.1: **“Construcción de módulos sanitarios y área de convivencia de la Escuela Preparatoria No. 1. Lic. Bernabé L. de Elías”**. (Se adjunta documentación respectiva).
- Formato de Seguimiento de Acciones de Infraestructura FAM 2017 Escuela de Técnicos Laboratoristas: **“Construcción de segunda etapa de laboratorio para la Escuela de Técnicos Laboratoristas de la UAEM”**. (Se adjunta documentación respectiva).
- Formato de Seguimiento de Acciones de Infraestructura FAM 2018 Escuela Comunitaria de Tres Marías: **“Construcción de dos aulas en estructura U-TC de 2 EE para la Preparatoria Comunitaria de Tres Marías”**. (Se adjunta documentación respectiva).



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

FAM 2019:

- Formato de Seguimiento de Acciones de Infraestructura Preparatoria No. 1 Lic. Bernabé L. De Elías **“Equipamiento de Laboratorios”**, se adjunta acta de entrega-recepción de obra.
- Formato de Seguimiento de Acciones de Infraestructura Preparatoria No. 3 Cuautla, Profr. Luis Ríos Alvarado: **“Rehabilitación de pisos en exterior”**.
- Formato de Seguimiento de Acciones de Infraestructura FAM 2020 Preparatoria No. 1 Lic. Bernabé L. De Elías: **“Construcción de 240 m2 de piso de concreto y colocación de cinco extractores en laboratorios”** y Preparatoria No. 6 Tlaltizapán: **“Construcción de cuatro elementos de refuerzo en muro de contención existente”**.

FAM 2021:

En espera de información por parte del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM) de las obras apoyadas:

1. Escuela Preparatoria No.2: **Muro de Contención en Escuela Preparatoria No. 2** por un monto de \$477.795.00 (cuatrocientos setenta y siete mil setecientos noventa y cinco pesos 00/100 M.N).
2. Escuela de Técnicos Laboratoristas: **Conclusión de laboratorio en la Escuela de Técnicos Laboratoristas** \$900,000.00 (novecientos mil pesos 00/100 M.N).

En relación al **Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Nivel Medio Superior** en su componente **FAM Potenciado** (Escuelas al CIEN), la Dirección de Desarrollo de Infraestructura solicitó nuevamente mediante oficio DDI/152/2021 (se adjunta), información a la Dirección General del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa (INEIEM) respecto a la inversión autorizada a la Institución del fondo en comento. A la fecha, no se cuenta con respuesta a la solicitud.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
Por una humanidad culta



DR. ALVARO ZAMUDIO LARA
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

C.c.p. Dr. Gustavo Urquiza Beltrán. Rector de la UAEM. Para su conocimiento.
Mtra. Silvia Aguilar Martínez. Coordinadora Sectorial de Planeación y Administración SEMS. Mismo fin.
Ing. René Roberto Castañeda Gómez. Director General del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa. Mismo fin.
Dr. Pedro Antonio Márquez Aguilar. Director General de Planeación Institucional UAEM. Mismo fin.
Arq. Oscar Lastra Fernández. Director General de Infraestructura. UAEM. Mismo fin.
Archivo

AZL/PAMA/ANPM/ngpb

Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	Municipio	Localidad	Modalidad	Observaciones	Construcción				Mantenimiento				Rehabilitación				Mobiliario y/o equipo				Monto Total	Fecha de inicio	Fecha de conclusión	Avance físico (%)	Monto ejercido	Alumnos beneficiados	Empleos generados	Problemáticas atendidas	Fecha de verificación	Sesionalización
										Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo										
	AUTÓNOMO	MORELOS	UNIVERSIDADES AUTÓNOMAS ESTATALES (UAE)	ESCUELA PREPARATORIA NO. 1 "PROF. BERNABÉ L. DE ELÍAS"	17UBH600HE	CUERNAVACA	VICENTE ESTRADA CARRIZAL		Construcción de 240 m2 de piso de concreto y edificación de cinco extractores en laboratorios de la Escuela Preparatoria No. 1 Lic. Bernabé L. De Elías				\$	250,000.00										\$	250,000.00	23/11/2020	30/12/2021 (fecha tentativa de entrega recepción)	95%	El recurso es ejercido por la Dirección Gen. de Obra Educativa	371	8	Falta de espacios de calidad para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje.	30/04/2021	Se realizó hito en el plantel el 30/04/2021	
	AUTÓNOMO	MORELOS	UNIVERSIDADES AUTÓNOMAS ESTATALES (UAE)	PREPARATORIA NO. 6 DE TLALTIZAPAN.	17NT7000HX	TLALTIZAPAN	TLALTIZAPAN		Construcción de cuatro elementos de refuerzo en muro de contención existente en la Escuela Preparatoria No. 6 Tlaltizapan				\$	1,186,823.00										\$	1,186,823.00	23/11/2020	Aún sin definir por la Dirección Gen. de Obra Educativa	95%	El recurso es ejercido por la Dirección Gen. de Obra Educativa	387	36	Falta de seguridad en infraestructura, debido a que la Unidad Académica colinda con una carretera. Por lo que la obra permitirá brindar espacios de aprendizaje con mayor seguridad en cuanto a instalaciones.	30/04/2021	Se realizó hito en el plantel el 30/04/2021	
													\$	1,436,823.00										\$	1,436,823.00						3498				

Nota: Al tercer trimestre 2021, se continúa a la espera de iniciar con el proceso de entrega-recepción de obra para la Escuela Preparatoria no. 1 "Prof. Bernabé L. De Elías" y Preparatoria no. 6 de Tlaltizapan.
Por otro lado, es importante reiterar que la Institución únicamente brinda seguimiento a las obras, es la Dirección General de Obra Educativa la encargada de realizar los trabajos de obra, así como su ejercicio financiero.

ELABORÓ

Arq. Guillermo Pérez Hernández
Director de Desarrollo de Infraestructura

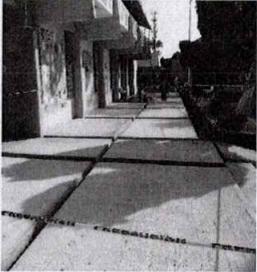
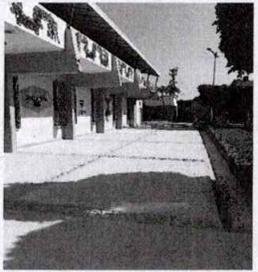
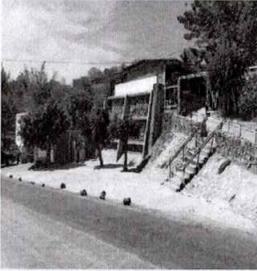
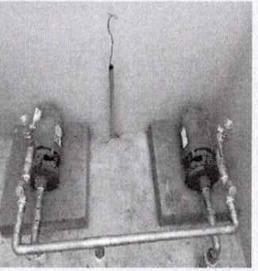
REVISÓ

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

AUTORIZÓ

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector UAEM

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN TÉCNICA
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2020 PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA
REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO Y SEÑALIZACIÓN

Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO				REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN	
						Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura
FAM 2020	AUTÓNOMO	MORELOS	UNIVERSIDADES AUTÓNOMAS ESTATALES (UAE)	ESCUELA PREPARATORIA NO. 1 "PROF. BERNABÉ L. DE ELÍAS"	17UBH0016E	 Construcción de 240 m2 de piso de concreto (03 DICIEMBRE DE 2020)	 Construcción de 240 m2 de piso de concreto (11 DICIEMBRE DE 2020)	 Construcción de 240 m2 de piso de concreto (23 DICIEMBRE DE 2020)	 Suministro y colocación de seis extractores (29 DICIEMBRE DE 2020)	 Imagen del letrero (30 NOVIEMBRE 2020)	 Letrero colocado en sitio (30 NOVIEMBRE 2020)
	AUTÓNOMO	MORELOS	UNIVERSIDADES AUTÓNOMAS ESTATALES (UAE)	PREPARATORIA NO. 6 DE TLALTIZAPAN .	17UCT0001X	 Conclusión de colado de área de estacionamiento (02 MARZO DE 2021)	 Cárcamo seco para almacenaje de bombas (02 MARZO DE 2021)	 Colocación y conexión de bombas para cisterna (12 MARZO DE 2021)	 Elaboración de rotulo en murete existente (26 MARZO DE 2021)	 Imagen del letrero (30 NOVIEMBRE 2020)	 Letrero colocado en sitio (30 NOVIEMBRE 2020)
