



-ACUSE-

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

RECTORÍA UAEM 2017-2023


11 OCT. 2022 0002884

Cuernavaca, Morelos, 07 de octubre de 2022

CGPyA/561/2022 1877

RECIBIDO

ING. SERGIO ROMERO SERRANO, DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIÓN TÉCNICA Y DE GESTIÓN SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

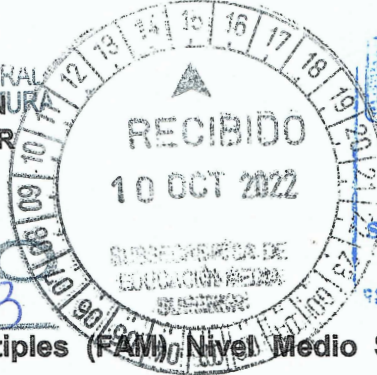

PRESENTE

12 OCT 2022 RECIBIDO 10:05 FOLIO: 563




En el marco del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Nivel Medio Superior, en su componente FAM Regular adjunto al presente en versión impresa y electrónica (CD) los "Formatos de Seguimiento para Acciones de Infraestructura" correspondientes al 3.er trimestre (julio, agosto y septiembre) 2022:

- Formato de Seguimiento de Acciones de Infraestructura FAM 2014 Preparatoria No.5: "Construcción de módulos sanitarios de la Escuela Preparatoria No. 5, Puente de Ixtla".

Formato de Seguimiento de Acciones de Infraestructura FAM 2015 Preparatoria No.1: "Construcción de módulos sanitarios y área de convivencia de la Escuela Preparatoria No. 1. Lic. Bernabé L. de Elías".

Formato de Seguimiento de Acciones de Infraestructura FAM 2017 Escuela de Técnicos Laboratoristas: "Construcción de segunda etapa de laboratorio para la Escuela de Técnicos Laboratoristas de la UAEM".

- Formato de Seguimiento de Acciones de Infraestructura FAM 2018 Escuela Comunitaria de Tres Marías: "Construcción de dos aulas en estructura U-TC de 2 EE para la Preparatoria Comunitaria de Tres Marías".



Av. Universidad 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca Morelos, México, 62209, 2° Piso Torre de Rectoría, Tel. (777) 329 70 33, 329 70, 00, Ext. 7033 / azamudio@uaem.mx

Recibi oficio original con 1 cd y reporte Lillian






UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL  
ESTADO DE MORELOS

## COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

- Formato de Seguimiento para Acciones de Infraestructura FAM 2019 Preparatoria No. 1 Lic. Bernabé L. De Elías “Equipamiento de Laboratorios”, Preparatoria No. 3 Cuautla, Profr. Luis Ríos Alvarado: “Rehabilitación de pisos en exterior”.
- Formato de Seguimiento para Acciones de Infraestructura FAM 2020 Preparatoria No. 1 Lic. Bernabé L. De Elías: “Construcción de 240 m2 de piso de concreto y colocación de cinco extractores en laboratorios” y Preparatoria No. 6 Tlaltizapán: “Construcción de cuatro elementos de refuerzo en muro de contención existente”.
- Formato de Seguimiento para Acciones de Infraestructura FAM 2021 Escuela Preparatoria No.2: “Muro de Contención en Escuela Preparatoria No. 2” y Escuela de Técnicos Laboratoristas: Conclusión de laboratorio en la Escuela de Técnicos Laboratoristas.

Por lo anterior, quedamos a la espera de los comentarios respectivos. Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente  
*Por una humanidad culta*  
*Una Universidad de excelencia*



**DR. ALVARO ZAMUDIO LARA**  
Titular de la Coordinación General de Planeación y Administración

C.c.p. Dr. Juan Pablo Arroyo Ortiz. Subsecretario de Educación Media Superior. Para su conocimiento  
Lic. Luis Antonio Cornejo Alatorre. Secretario de Educación Morelos. Mismo fin.  
Ing. René Roberto Castañeda Gómez. Director General Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos. Mismo fin.  
Lic. Daniel Hernández González. Coordinador Sectorial de Planeación y Administración SEMS. Mismo fin.  
Dr. Gustavo Urquiza Beltrán. Rector de la UAEM. Mismo fin.  
Dr. Pedro Antonio Márquez Aguilar. Titular de la Dirección General de Planeación Institucional UAEM. Mismo fin.  
Arq. Oscar Lastra Fernández. Titular de la Dirección General de Infraestructura UAEM. Mismo fin.  
Archivo

AZLI/PAMA/ANPM

Av. Universidad 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca Morelos, México, 62209, 2° Piso Torre de Rectoría,  
Tel. (777) 329 70 33, 329 70, 00, Ext. 7033 / azamudio@uaem.mx



Una universidad de excelencia

RECTORÍA  
2017-2023







**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2019 PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR**  
**FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA**  
**REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO Y SEÑALIZACIÓN**

Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO				REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN	
						Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura
FAM 2019	AUTÓNOMO	MORELOS	UNIVERSIDAD AUTÓNOMAS ESTATALES (UAE)	ESCUELA PREPARATORIA NO. 1 "PROF. BERNABÉ L. DE ELÍAS"	17UBH0016E	 Rehabilitación de piso de concreto. (01/04/2020)	 Rehabilitación de piso de concreto. (01/04/2020)	 Rehabilitación de piso de concreto. (01/04/2020)	 Rehabilitación de piso de concreto. (01/04/2020)	 Imagén del letrero de señalización. (31/01/2020)	 Letrero de señalización colocado en sitio. (31/01/2020)
	AUTÓNOMO	MORELOS	UNIVERSIDAD AUTÓNOMAS ESTATALES (UAE)	PREPARATORIA NO. 3 DE CUAUTLA. "PROF. LUIS RÍOS ALVARADO"	17UBH0017D	 Colocación de regadera de emergencia. (01/04/2020)	 Colocación de lavajos. (01/04/2020)	 Instalaciones en mesas de laboratorio. (08/04/2020)	 Instalaciones en mesas de laboratorios. (08/04/2020)	 Imagén del letrero de señalización. (31/01/2020)	 Letrero de señalización colocado en sitio. (31/01/2020)
