



-ACUSE-

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

RECTORÍA UAEM 2017-2023


11 OCT. 2022 0002884

Cuernavaca, Morelos, 07 de octubre de 2022

CGPyA/561/2022 1877

RECIBIDO

ING. SERGIO ROMERO SERRANO, DIRECCION GENERAL DE OPERACION TECNICA Y DE GESTIONURA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR



PRESENTE

12 OCT 2022 RECIBIDO 10:05 FOLIO: 563




En el marco del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Nivel Medio Superior, en su componente FAM Regular adjunto al presente en versión impresa y electrónica (CD) los "Formatos de Seguimiento para Acciones de Infraestructura" correspondientes al 3.er trimestre (julio, agosto y septiembre) 2022:

- Formato de Seguimiento de Acciones de Infraestructura FAM 2014 Preparatoria No.5: "Construcción de módulos sanitarios de la Escuela Preparatoria No. 5, Puente de Ixtla".

Formato de Seguimiento de Acciones de Infraestructura FAM 2015 Preparatoria No.1: "Construcción de módulos sanitarios y área de convivencia de la Escuela Preparatoria No. 1. Lic. Bernabé L. de Elías".

Formato de Seguimiento de Acciones de Infraestructura FAM 2017 Escuela de Técnicos Laboratoristas: "Construcción de segunda etapa de laboratorio para la Escuela de Técnicos Laboratoristas de la UAEM".

- Formato de Seguimiento de Acciones de Infraestructura FAM 2018 Escuela Comunitaria de Tres Marías: "Construcción de dos aulas en estructura U-TC de 2 EE para la Preparatoria Comunitaria de Tres Marías".



Av. Universidad 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca Morelos, México, 62209, 2° Piso Torre de Rectoría, Tel. (777) 329 70 33, 329 70, 00, Ext. 7033 / azamudio@uaem.mx

Recibi en oficina original con 1 cd y reporte Lillian




UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

- Formato de Seguimiento para Acciones de Infraestructura FAM 2019 Preparatoria No. 1 Lic. Bernabé L. De Elías "Equipamiento de Laboratorios", Preparatoria No. 3 Cuautla, Profr. Luis Ríos Alvarado: "Rehabilitación de pisos en exterior".
- Formato de Seguimiento para Acciones de Infraestructura FAM 2020 Preparatoria No. 1 Lic. Bernabé L. De Elías: "Construcción de 240 m2 de piso de concreto y colocación de cinco extractores en laboratorios" y Preparatoria No. 6 Tlaltizapán: "Construcción de cuatro elementos de refuerzo en muro de contención existente".
- Formato de Seguimiento para Acciones de Infraestructura FAM 2021 Escuela Preparatoria No.2: "Muro de Contención en Escuela Preparatoria No. 2" y Escuela de Técnicos Laboratoristas: Conclusión de laboratorio en la Escuela de Técnicos Laboratoristas.

Por lo anterior, quedamos a la espera de los comentarios respectivos. Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
Por una humanidad culta
Una Universidad de excelencia



DR. ALVARO ZAMUDIO LARA
Titular de la Coordinación General de Planeación y Administración

C.c.p. Dr. Juan Pablo Arroyo Ortiz. Subsecretario de Educación Media Superior. Para su conocimiento
Lic. Luis Antonio Cornejo Alatorre. Secretario de Educación Morelos. Mismo fin.
Ing. René Roberto Castañeda Gómez. Director General Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos. Mismo fin.
Lic. Daniel Hernández González. Coordinador Sectorial de Planeación y Administración SEMS. Mismo fin.
Dr. Gustavo Urquiza Beltrán. Rector de la UAEM. Mismo fin.
Dr. Pedro Antonio Márquez Aguilar. Titular de la Dirección General de Planeación Institucional UAEM. Mismo fin.
Arq. Oscar Lastra Fernández. Titular de la Dirección General de Infraestructura UAEM. Mismo fin.
➔ Archivo

AZLI/PAMA/ANPM

Av. Universidad 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca Morelos, México, 62209, 2° Piso Torre de Rectoría,
Tel. (777) 329 70 33, 329 70, 00, Ext. 7033 / azamudio@uaem.mx



Una universidad de excelencia




RECTORÍA
2017-2023

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2020 PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA







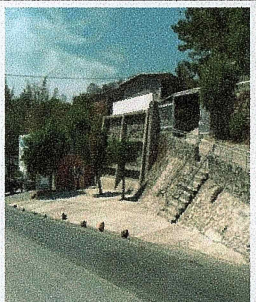
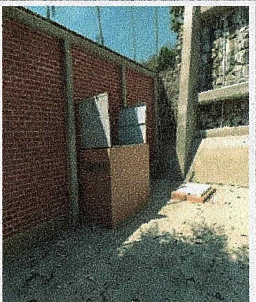
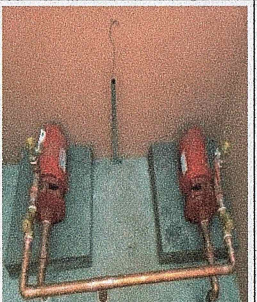
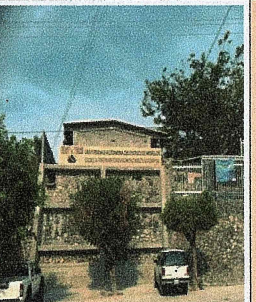


| Fondo | Tipo Control | Entidad Federativa | Tipo de Institución | Nombre del Plantel | CCT | Municipio | Localidad | Meta a realizar (Breve descripción de las acciones a realizar) | Observaciones | Construcción | | | | Mantenimiento | | | | Rehabilitación | | | | Mobiliario y/o equipo | | | | Monto Total | Fecha de Inicio | Fecha de conclusión | Avance Físico (%) | Monto ejercido | Alumnos beneficiados | Empleos generados | Problemática atendida | Fecha de verificación | Señalización | |
|-------------|--------------|--------------------|---|--|------------|-------------|-------------------------|--|---------------|--------------|-------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|--------|-------|----------------|-------------|--------|-------|-----------------------|-----------------|------------|------------|-------------|-----------------|---------------------|-------------------|--|----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--|
| | | | | | | | | | | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | | | | | | | | | | | |
| FAM Regular | Autónomo | Morelos | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | ESCUELA PREPARATORIA NO. 1 "PROF. BERNABÉ L. DE ELÍAS" | 17UBH0016E | CUERNAVACA | VICENTE ESTRADA CAJIGAL | Construcción de 240 m2 de piso de concreto y colocación de cinco extractores en laboratorios de la Escuela Preparatoria No. 1 Lic. Bernabé L. De Elías | | | | \$ 250,000.00 | | | | | | | | | | | \$ 250,000.00 | 10/01/2021 | 20/02/2021 | 100% | \$ 247,302.30 | 3039 | 8 | Falta de espacios de calidad para el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje. | 29/12/2021 | 30/11/2020 | | | | |
| FAM Regular | Autónomo | Morelos | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | PREPARATORIA NO. 6 DE TLALTIZAPÁN | 17UCT0001X | TLALTIZAPÁN | TLALTIZAPÁN | Construcción de cuatro elementos de refuerzo en muro de contención existente en la Escuela Preparatoria No. 6 Tlaltizapán | | | | \$ 1,186,823.00 | | | | | | | | | | | \$ 1,186,823.00 | 20/11/2020 | 19/12/2020 | 100% | \$1,175,537.44 | 364 | 36 | Falta de seguridad en Infraestructura, debido a que la Unidad Académica colinda con una carretera. Por lo que la obra permitirá brindar espacios de aprendizaje con mayor seguridad en cuanto a instalaciones. | 26/03/2022 | 30/11/2020 | | | | |
| | | | | | | | | | | - | - | - | \$1,436,823.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,436,823.00 | | |

Nota:

En el segundo trimestre la Institución remitió a la Dirección de Operación Técnica y de Gestión las actas de entrega-recepción correspondientes a la Escuela Preparatoria No.1 "Prof. Bernabé L. de Elías" y Escuela Preparatoria No. 6 Tlaltizapán en donde se refleja que las obras fueron terminadas en su totalidad. Por lo anterior, quedamos a la espera de sus comentarios y observaciones.

| | | |
|---|---|---|
| ELABORÓ | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|  |  |  |
| Arq. Guillermo Pérez Hernández Director de Desarrollo de Infraestructura | Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández Director General de Infraestructura | Dr. Alvaro Zamudio Lara Coordinador General de Planeación y Administración |

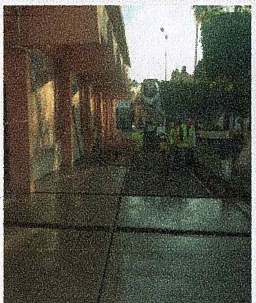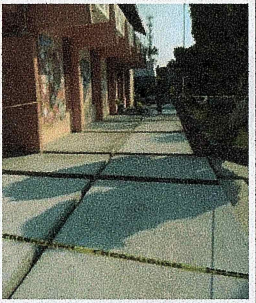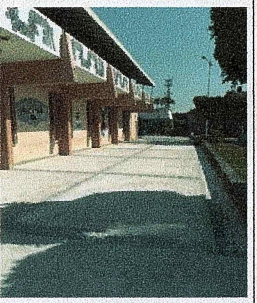FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2020 PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
 FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA
 REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO Y SEÑALIZACIÓN

| Fondo | Tipo Control | Entidad Federativa | Tipo de Institución | Nombre del Plantel | CCT | REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO | | | | REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN | |
|-------------|--------------|--------------------|---|--|------------|--|--|--|---|--|--|
| | | | | | | Descripción de la imagen y fecha de captura | Descripción de la imagen y fecha de captura | Descripción de la imagen y fecha de captura | Descripción de la imagen y fecha de captura | Descripción de la imagen y fecha de captura | Descripción de la imagen y fecha de captura |
| FAM Regular | Autónomo | Morelos | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | Escuela Preparatoria No.1 "Prof. Bernabé L. de Elías". | 17UBH0016E |  Construcción de 240 m2 de piso de concreto. (03/12/2020) |  Construcción de 240 m2 de piso de concreto. (11/12/2020) |  Construcción de 240 m2 de piso de concreto. (23/12/2020) |  Suministro y colocación de seis extractores. (29/12/2020) |  Imagen del letrero de señalización. (30/11/2020) |  Letrero en sitio de señalización. (30/11/2020) |
| FAM Regular | Autónomo | Morelos | Universidades Autónomas Estatales (UAE) | Preparatoria No. 6 de Tlaltizapán. | 17UCT0001X |  Conclusión de colado de área de estacionamiento. (02/03/2021) |  Cárcamo seco para almacenaje de bombas. (02/03/2021) |  Colocación y conexión de bomba para cisterna. (02/03/2021) |  Elaboración de rotulo en murete existente. (26/03/2022) |  Imagen del letrero de señalización. (30/11/2020) |  Letrero en sitio de señalización. (30/11/2020) |
