



RECTORÍA
2017-2023

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN


UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

28 JUL. 2022 0001844

RECIBIDO

RECIBIÓ: Andrew HORA: 13:32

DR. EDUARDO GERARDO ROSAS GONZÁLEZ
DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
PRESENTE



Cuernavaca, Morelos, 1° de julio de 2022.

CGPyA/359/2022

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL



Recibi USB.
Arg Carlos Sánchez

En el marco del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) y en respuesta a su atento oficio No. 511/2022-2182, por este medio hago llegar a Usted de manera impresa y electrónica (USB) en formato Excel y PDF debidamente firmados los informes de avance de obra e informes descriptivos correspondientes al **segundo trimestre** (abril, mayo y junio) 2022, de las obras apoyadas con los recursos del fondo en comento, informando lo siguiente:

1.- En relación a las obras apoyadas con recursos FAM año 2015, la Institución realizó una mesa de trabajo con el objetivo de definir los mecanismos adecuados, para dar cumplimiento a los requerimientos solicitados respecto al cierre de las obras: "Construcción de la sala de cómputo, auditorio, oficinas administrativas y cubículos de investigadores para el edificio complementario de la Facultad de Humanidades; "Ampliación de laboratorios, cubículos de investigación y oficinas académicas para el Centro de Investigación en Biotecnología. Primera etapa". Se anexa minuta de trabajo debidamente firmada, en alcance a dicha minuta, se precisa que, el cierre de las obras en donde se establezcan los porcentajes físicos determinados por la institución y los montos ejercidos, será enviado en el tercer trimestre.

2.- FAM año 2016, numerales 2 y 3, la Institución realizó una mesa de trabajo con el objetivo de definir los mecanismos adecuados, para dar cumplimiento a los requerimientos solicitados respecto al cierre de la obra: "Construcción de la Tercera Etapa de la Facultad de Estudios Superiores de Cuautla". Se anexa minuta de trabajo debidamente firmada, en alcance a dicha minuta, se precisa que, el cierre de la obra en donde se establezcan los porcentajes físicos determinados por la institución y los montos ejercidos, será enviado en el tercer trimestre.

4.- En relación a las obras apoyadas con recursos FAM año 2020, el monto ejercido fue de \$25,780.508.72 (veinticinco millones setecientos ochenta mil quinientos ocho pesos 72/100 M.N.) con un remanente de \$3,660.28 (tres mil seiscientos sesenta pesos 28/100 M.N), cantidad que fue reintegrada a la TESOFE mediante línea de captura 0022AAXN671060963221 con fecha 11 de mayo del 2022. Así como los rendimientos financieros generados en la cuenta, del periodo del 1° de noviembre 2021 al 30 de abril de 2022 por un monto de \$27,398.00 (veintisiete mil trescientos noventa y ocho pesos), mediante línea de captura N° 0022AAYD221061021212.

En este sentido, y una vez que se cumplieron al 100% el objetivo y las acciones planteadas en el proyecto, el 19 de mayo del presente año se realizó la cancelación de la cuenta bancaria específica y productiva 1105602869 destinada para los recursos del fondo.

5.- Mediante oficio CGPyA/144/2022 de fecha 7 de abril de 2022, signado por el Dr. Álvaro Zamudio Lara Coordinador General de Planeación y Administración, se enviaron las Actas Administrativas de Entrega-Recepción de las obras N° 2 "Equipamiento del Campus norte" y N° 3. "Equipamiento del Campus Oriente". (se adjunta).





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Para las obras N°. 1 “*Construcción de la Segunda Etapa para los Talleres de la Facultad de Artes*”, N°. 4, “*Adecuación y Mejoras del Campus Norte*”, N°. 5 “*Adecuación y Mejoras del Campus Oriente*” y N°. 6. “*Mantenimiento del Campus Sur y Campus Poniente*”, se adjuntan de manera impresa y electrónica en formato PDF, las Actas Administrativas de Entrega-Recepción y Actas Finiquito de las obras anteriormente descritas. Lo anterior para su revisión y en su caso conclusión.

6.- Conforme a lo descrito en el numeral 4 del presente documento, se adjunta comprobante de devolución a la TESOFE por un monto de \$3,660.28 (tres mil seiscientos sesenta pesos 28/100 M.N).

7.- En relación a la obra “*Construcción de la Segunda Etapa para los Talleres de la Facultad de Artes*”. Existe un Convenio Modificatorio en el plazo de ejecución con fecha del 24 de noviembre de 2021 al 18 de enero de 2022 (se adjunta). Es importante mencionar que existieron demoras en la construcción de la citada obra, situación por la cual se generó el presente convenio modificatorio, siendo sus principales:

1.- La Institución participo y continúa participando de manera permanente como Macro Modulo de Vacunación contra Covid-19, para atender a toda la población del Estado de Morelos.

- a) La Institución ha desempeñado un papel fundamental en la sociedad morelense, durante el año 2021 y para este año 2022 el reto de la UAEM fue y será en un sentido de resiliencia con los estudiantes y la sociedad ante el panorama del coronavirus y sus variantes, abriendo sus puertas para la vacunación. El papel que desempeño la universidad durante la pandemia fue fundamental con la instalación del Macro Módulo de vacunación en la que se aplicaron 96 mil 47 dosis del biológico al 08 de diciembre del 2021, en este sentido la Institución continúa con el apoyo logístico y de asistencia vial para la sociedad morelense, en el mes de marzo y abril se aplicaron refuerzos biológicos a la población morelense, a continuación, se presentan los comunicados que detallan el proceso. Para lo anterior, se adjunta relatoría de hechos y evidencias respectivas.
- b) Alza en el costo de materiales para la construcción derivados del acero a consecuencia de la pandemia provocada por el SARS-CoV2 (COVID-19).

8.- Para las obras del FAM 2021, el monto ejercido fue de \$20,544,837.17 (veinte millones quinientos cuarenta y cuatro mil ochocientos treinta y siete pesos 17/100 M.N con un saldo de \$58.88 (cincuenta y ocho pesos 88/100 M.N). En relación a los rendimientos financieros generados al 31 de abril del año 2022, se realizó reintegro a la TESOFE por un monto de \$7,326.00 (siete mil trescientos veintiséis pesos 00/100 M.N.).

En este sentido, se informa que, la cuenta bancaria específica y productiva con N°: 1150116825, fue cancelada con fecha 11 de mayo del presente año. Cumpliendo en su totalidad con las acciones programadas en los cinco proyectos autorizados.

Por lo anterior, se adjuntan *debidamente firmadas de manera impresa y electrónica en formato PDF*, las Actas Administrativas de Entrega-Recepción y Actas Finiquito de los proyectos apoyados



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

En relación a la fecha de conclusión de la obra "Construcción de la Segunda para la ampliación de laboratorios, cubículos y oficinas académicas para el Centro de Investigaciones Biológicas entes (CEIB)", se ratifica que, la fecha de conclusión de la obra fue el 28 de febrero de 2022, en apego al Convenio Modificatorio al plazo de ejecución y monto del contrato primario de obra basado en precio unitario y tiempo determinado número 06-15520-OS-2021. (Se adjunta).

9.- Para las obras apoyadas con recursos del FAM 2022, con fecha 23 de marzo de 2022, mediante oficio R/043/2022, signado por el Dr. Gustavo Urquiza Beltrán Rector de la Institución, se comunica a la Lic. Mónica Boggio Tomasaz Merino Secretaria de Hacienda, que la Institución cuenta con la infraestructura necesaria para ejecutar los proyectos autorizados del FAM 2022, solicitando a su vez, el apoyo con la gestión para la ministración de los recursos a la Institución.

Con apoyo del área jurídica de la Institución, se llevó a cabo la formalización del Instrumento Jurídico "Convenio para la Transferencia y Ejecución de Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraestructura Educativa de Nivel Superior, con fecha de firma 6 de mayo de 2022, celebrado con el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos representado en este caso por la Secretaria de Hacienda y la Secretaria de Educación.

De acuerdo a lo establecido en el Manual de Políticas y Procedimientos de la Dirección General de Presupuesto y Gasto Público, adscrita a la Secretaria de Hacienda. Se inicia con el procedimiento que conlleva a la liberación de los recursos a través del Gasto de Capital (Inversión Pública), para lo cual se registraron los proyectos FAM 2022 en el Sistema de la Unidad de Inversión Estatal (SUIE) obteniendo clave de cartera en los proyectos por parte de la Dirección General de Evaluación de Proyectos de Inversión, adscrita a la Secretaría de Educación, una vez que se otorga clave de cartera, se procede al registro en el Sistema Integral de Gestión Financiera (SIGEF) para obtener la cédula básica y expediente técnico.

Finalmente, y como parte de lo establecido en el manual, se está en espera de la clave de la obra y oficio de aprobación, lo anterior, para proceder a la elaboración de las Solicitudes de Liberación de Recurso (SLR) que conlleva a la ministración de los recursos a la institución.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.



28 JUL 2022

Ulrich


Atentamente
Por una humanidad culta
Una universidad de excelencia



DR. ALVARO ZAMUDIO LARA
Coordinador General de Planeación y Administración

C.c.p. Dra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta, Directora General de Educación Superior Universitaria e Intercultural para su conocimiento.
Dr. Gustavo Urquiza Beltrán Rector de la UAEM. Para su conocimiento.
Dr. Pedro Antonio Márquez Aguilar. Director General de Planeación Institucional de la UAEM. Mismo fin.
Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández. Director General de Infraestructura. Mismo fin.

Archivo.
PAMA/ANPMI



2022



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes registrado:
Segundo Trimestre 2022
(Abril-Junio)
PERIODO: 01/04/2022 - 30/06/2022

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: Universidad Autónoma del Estado de Morelos
Entidad federativa: Morelos
Clave Inst 911 17MSU0017P

Nombre: Álvaro Zamudio Lara
Cargo: Coordinador General de Planeación y Administración
Teléfono: (777) 3 29 70 00 Ext. 7033 y 4312
Correo electrónico: azamudio@uam.mx

RESPONSABLES

Nombre: Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Cargo: Director General de Infraestructura
Teléfono: (777) 3 29 70 00 Ext. 3136
Correo electrónico: oscar.lastra@uam.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto	Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto			Acciones que sustentan el avance	Acciones por realizar	% de avance	Fecha		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas			
						Especialización	cantidad	metros cuadrados				Inicio	Término			¿Cuenta con foto del evento?	¿Cuándo y dónde inauguró?	Entrega Recupero (Acta Inquilato)	Acta Administrativa de Entrega Recepción	Monto de Acta Administrativa	
GLOBAL DEL PROYECTO																					
1	Adecuaciones y mejoras campus norte Biblioteca Central.	X	\$ 6,200,000.00	\$ -	\$ 6,200,000.00						0%			Mediante oficio RD43/2022, signed por el Dr. Gustavo Enrique Salas Trejo de la Institución de concertación a la Lic. María Begoña Tomazaj Marro Secretaría de Hacienda, que le indica cuenta con la información necesaria para emitir los proyectos autorizados del FAM 2022, solicitando a su vez, el apoyo con la gestión para la liberación de los recursos a la institución. Con apoyo del área jurídica de la institución, se llevó a cabo la formalización del instrumento jurídico "Convenio para la Transferencia y Educación de Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraestructura Educativa de Nivel Superior, con fecha de firma 6 de mayo de 2022, celebrado con el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos representado en este caso por la Secretaría de Hacienda y el Secretario de Educación. De acuerdo a lo establecido en el Manual de Políticas y Procedimientos de la Dirección General de Presupuesto y Gasto Público, editada a la Secretaría de Hacienda. Se trata con el procedimiento que confiere a la liberación de los recursos a través del Gasto de Capital (Inversión Pública), para lo cual se registraron los proyectos FAM 2022 en el Sistema de la Unidad de Inversión Estatal (UIE) obteniendo clave de cartera en los proyectos por parte de la Dirección General de Evaluación de Proyectos de Inversión, emitida a la Secretaría de Educación, una vez que se otorga clave de cartera, se procede al registro en el Sistema Integral de Gestión Financiera (SIGEF) para obtener la ordenación y expedir el cheque. Paralelamente y como parte de lo establecido en el manual, se está en espera de la clave de la obra y oficio de aprobación lo anterior, para proceder a la elaboración de las Solicitudes de Liberación de Recursos (SLR) que confiere a la liberación de los recursos a la institución.							
GLOBAL DEL PROYECTO																					
2	Equipamiento del Campus Norte	X	\$ 7,772,356.00	\$ -	\$ 7,772,356.00						0%	03/06/22	31/12/22	Los días 17 y 22 de junio de 2022, se llevó a cabo el acto de presentación y apertura de proposiciones del Procedimiento de Licitación Pública Electrónica Nacional LP10/2022 y LP11/2022 para la adquisición de reactivos, materiales y equipo de laboratorio, mobiliario, herramientas y otros acondicionados para la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y adquisición de materiales y equipo de cómputo para la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Lo anteriormente señalado se encuentra en la dirección electrónica https://www.uam.mx/multimedios/informacion/oficializacion/direccion-de-recursos-materiales-2022							
GLOBAL DEL PROYECTO																					
3	Equipamiento del Campus Oriente	X	\$ 2,162,115.00	\$ -	\$ 2,162,115.00						0%	03/06/2022	31/12/2022	Los días 17 y 22 de junio de 2022, se llevó a cabo el acto de presentación y apertura de proposiciones del Procedimiento de Licitación Pública Electrónica Nacional LP10/2022 y LP11/2022 para la adquisición de reactivos, materiales y equipo de laboratorio, mobiliario, herramientas y otros acondicionados para la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y adquisición de materiales y equipo de cómputo para la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Lo anteriormente señalado se encuentra en la dirección electrónica https://www.uam.mx/multimedios/informacion/oficializacion/direccion-de-recursos-materiales-2022							
GLOBAL DEL PROYECTO																					
4	Mantenimiento del Campus Norte	X	\$ 1,415,000.00	\$ -	\$ 1,415,000.00						0%										
TOTAL																					
						0.00	0.00														

2022

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Segundo Trimestre 2022
(Abril-Junio)
FECHA DE CORTE: 30/06/2022

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Mapa de la Universidad
Porcentaje de avance



0%

PRIORIDAD **1**

Nombre de la obra:

Adecuaciones y mejoras Campus Norte Biblioteca Central.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

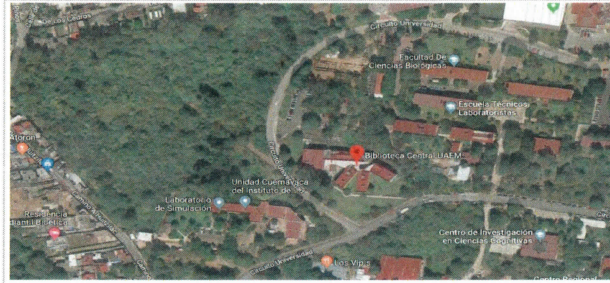


Planta de Conjunto
nivel 1-125 Adecuación y Mejoras de la Cubierta y "Huerto Solar" en la Biblioteca Central del Campus Norte.


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca, Mor.
C.P.62209. Cuernavaca Morelos.


FOTOS (ANTES)

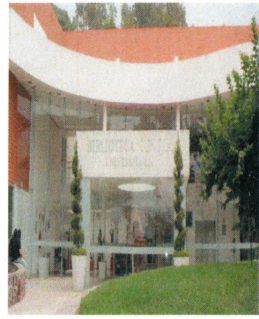

F1: Fachada Principal



F2: Fachada lateral

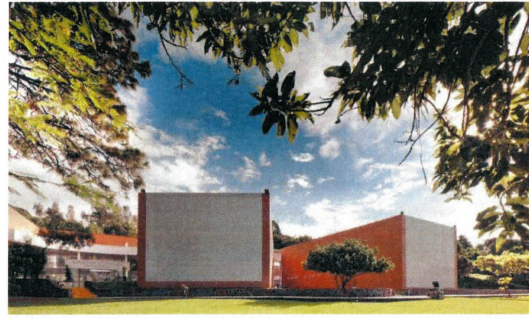


Comentarios de los trabajos realizados:
VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.



F3: Adecuación y Mejoras de la Cubierta y "Huerto Solar" en la Biblioteca Central. Trabajos de impermeabilización, en losa de azotea y pretel, colocación de sistema fotovoltaico (huerto solar) Área de auditorio




F4: Adecuación y Mejoras de la Cubierta y "Huerto Solar" en la Biblioteca Central. Trabajos de impermeabilización en losa de azotea y pretel, colocación de huerto solar, Nave principal

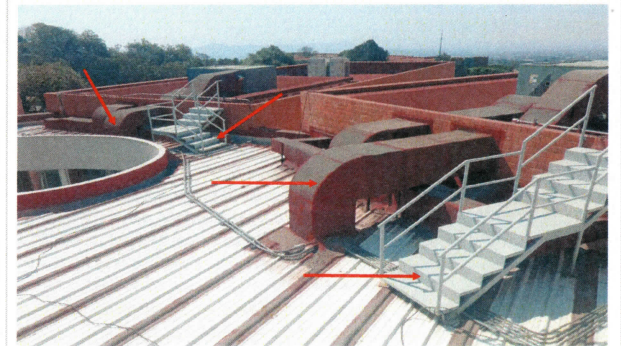


F5: Adecuación y Mejoras de la Cubierta y "Huerto Solar" en la Biblioteca Central. Retiro de ductos de aire acondicionado, escaleras metálicas y sustitución de cubierta.

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

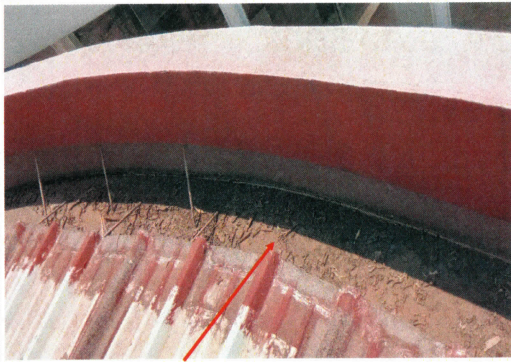

F6: Adecuación y Mejoras de la Cubierta y "Huerto Solar" en la Biblioteca Central. Impermeabilización de canal metálico y colocación de bajadas pluviales, área central de biblioteca

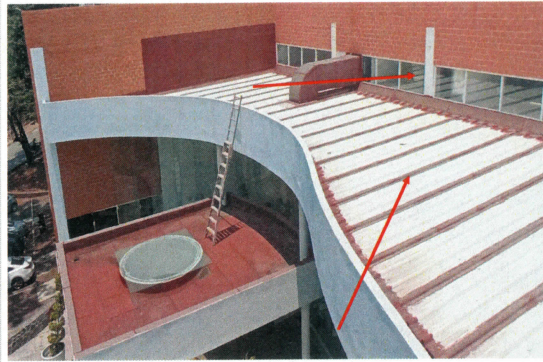

F7: Adecuación y Mejoras de la Cubierta y "Huerto Solar" en la Biblioteca Central. Trabajos de impermeabilización en cubierta de multitecho y sellado de ventanas de azotea, área central de biblioteca



F8: Adecuación y Mejoras de la Cubierta y "Huerto Solar" en la Biblioteca Central. Trabajos de sellado en domos de azotea.



F9: Adecuación y Mejoras de la Cubierta y "Huerto Solar" en la Biblioteca Central. Sellado de muro de tabique de barro extruido



F10: Adecuación y Mejoras de la Cubierta y "Huerto Solar" en la Biblioteca Central. Trabajos de sustitución de plafón, área interior central.

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector

Arg. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2022

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Segundo Trimestre 2022
(Abril-Junio)
FECHA DE CORTE: 30/06/2022

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD **2** Nombre de la obra: **Equipamiento del Campus Norte (Facultad De Ciencias Del Deporte)**





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

0%

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

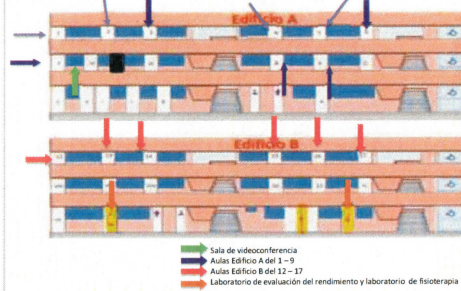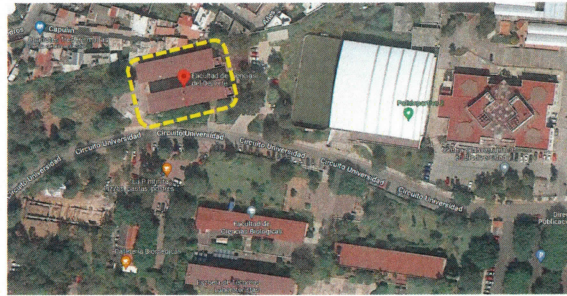

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca, Mor.
C.P.62209. Cuernavaca Morelos.

FOTOS (ANTES)



F1: Fachada Principal de la Facultad de Ciencias del Deporte.



F2: Se equipará la Sala de videoconferencias de la Facultad de Ciencias del Deporte, con videoprojector y pizarrón.

Comentarios de los trabajos realizados:
Los días 17 y 22 de junio de 2022, se llevó a cabo el acto de presentación y apertura de proposiciones del Procedimiento de Licitación Pública Electrónica Nacional LP10/2022 y LP11/2022 para la "adquisición de reactivos, materiales y equipo de laboratorio, mobiliario, herramientas y aire acondicionado para la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y "adquisición de materiales y equipo de cómputo para la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Lo anteriormente señalado se encuentra en la dirección electrónica <https://www.uaem.mx/difusion-y-medios/informacion-oficial/licitaciones/direccion-de-recursos-materiales-2022/> .



F3: Se equipará el aula 1 del Edificio A, con proyector , pizarrónde cristal y sillas con paleta.



F4: Se equipará el Aula 2 del Edificio A, con proyector , pizarrónde cristal y sillas con paleta.



F5: Se equipará el Aula 3 del Edificio A, con proyector , pizarrónde cristal y sillas con paleta.

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



F6: Se equipará el Aula 4 del Edificio A, con proyector , pizarrón de cristal y sillas con paleta.



F7: Se equipará el Aula 5 del Edificio A, con proyector , pizarrón de cristal y sillas con paleta.



F8: Se equipará el Aula 6 del Edificio A, con proyector , pizarrón de cristal y sillas con paleta.



F9: Se equipará el Aula 7 del Edificio A, con proyector , pizarrón de cristal y sillas con paleta.



F10: Se equipará el Aula 8 del Edificio A, con proyector , pizarrón de cristal y sillas con paleta.



F11: Se equipará el Aula 9 del Edificio A, con proyector , pizarrón de cristal y sillas con paleta.



F12: Se equipará el Aula 12 del Edificio B , con proyector , pizarrón de cristal y sillas con paleta.



F13: Se equipará el Aula 13 del Edificio B , con proyector , pizarrón de cristal y sillas con paleta.



F14: Se equipará el Aula 14 del Edificio B , con proyector , pizarrón de cristal y sillas con paleta.

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



F15: Se equipará el Aula 15 del Edificio B con pizarrón de cristal .



F16: Se equipará el Aula 16 del Edificio B con pizarrón de cristal .



F17: Se equipará el Aula 17 del Edificio B con pizarrón de cristal .



F18: Se equipará el Laboratorio de fisioterapia con extintor.



F19: Se equipará el Laboratorio de evaluación del rendimiento con extintor.

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector

Dr. Álvaro Zamudio Lara
Coordinador General de Planeación y Administración

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2022

FAM




FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Segundo Trimestre 2022
(Abril-Junio)

FECHA DE CORTE: 30/06/2022


REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

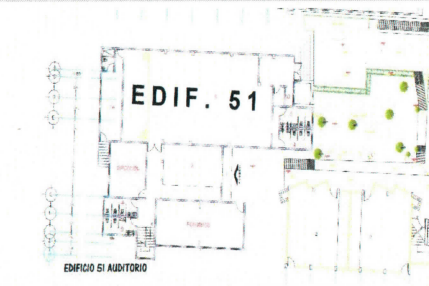 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS Porcentaje de avance <p style="font-size: 24px; font-weight: bold;">0%</p>	PRIORIDAD 2 Nombre de la obra: Equipamiento del Campus Norte (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales)	CROQUIS DE LOCALIZACIÓN 	UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO <p>Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca, Mor. C.P.62209. Cuernavaca Morelos.</p>
			

FOTOS (ANTES)



F1: Fachada Principal de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.

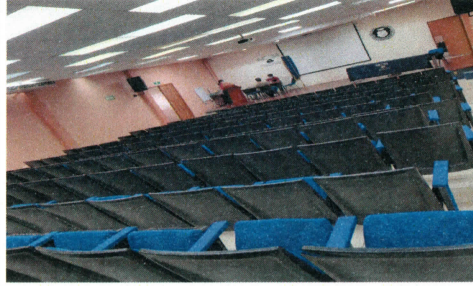

F2: Se equipará el auditorio de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales con butacas de auditorio.




F3: Se equipará el auditorio de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales con butacas de auditorio.



F4: Se equipará el auditorio de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales con butacas de auditorio.

Comentarios de los trabajos realizados:
 Los días 17 y 22 de junio de 2022, se llevó a cabo el acto de presentación y apertura de proposiciones del Procedimiento de Licitación Pública Electrónica Nacional LP10/2022 y LP11/2022 para la "adquisición de reactivos, materiales y equipo de laboratorio, mobiliario, herramientas y aire acondicionado para la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y "adquisición de materiales y equipo de cómputo para la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Lo anteriormente señalado se encuentra en la dirección electrónica <https://www.uaem.mx/difusion-y-medios/informacion-oficial/licitaciones/direccion-de-recursos-materiales-2022/> .


 Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
 Rector


 Dr. Alvaro Zamudio Lara
 Coordinador General de Planeación y Administración

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2022



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Segundo Trimestre 2022
(Abril-Junio)
FECHA DE CORTE: 30/06/2022

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD 2 Nombre de la obra: **Equipamiento del Campus Norte (Facultad de Farmacia)**



Porcentaje de avance

0%

CRÓQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca, Mor.
C.P.62209. Cuernavaca Morelos.

FOTOS (ANTES)



F1: Fachada Principal de la Facultad de Farmacia.



F2: Se equipará el Laboratorio A03 de la Facultad de Farmacia, con 1 extractor atmosférico y 2 anaquel metálico.




F3: Se equipará el Laboratorio B01 de la Facultad de Farmacia, con 1 extractor atmosférico y 1 anaquel metálico.



F4: Se equipará el Laboratorio B02 de la Facultad de Farmacia, con 1 extractor atmosférico y 1 anaquel metálico.

Comentarios de los trabajos realizados:

Los días 17 y 22 de junio de 2022, se llevó a cabo el acto de presentación y apertura de proposiciones del Procedimiento de Licitación Pública Electrónica Nacional LP10/2022 y LP11/2022 para la "adquisición de reactivos, materiales y equipo de laboratorio, mobiliario, herramientas y aire acondicionado para la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y "adquisición de materiales y equipo de cómputo para la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Lo anteriormente señalado se encuentra en la dirección electrónica <https://www.uaem.mx/difusion-y-medios/informacion-oficial/licitaciones/direccion-de-recursos-materiales-2022/>.

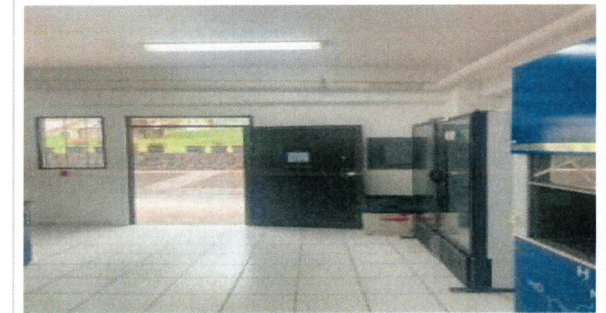

F5: Se equipará el Laboratorio B03 de la Facultad de Farmacia, con 1 extractor atmosférico y 2 anaquel metálico.

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL




F6: Se equipará el Laboratorio B04 de la Facultad de Farmacia, con 1 extractor atmosferico.



F7: Se equipará la Planta Piloto (Laboratorio), con 1 extractor atmosferico y 1 aire acondicionado y 1 anaquel metálico.



F8: Se equipará el Centro de Cómputo con 1 aire acondicionado.

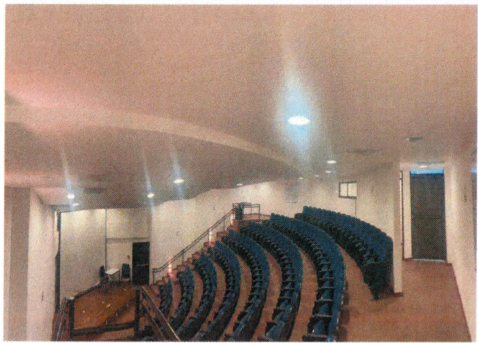

F9: Se equipará el Auditorio, con 1 videoprojector y 1 podiim.



F10: Se equipará la Sala de Actos, con 1 videoprojector.



F11: Se equipará Aulas B2-5 y B2-6 (posgrado), con 1 videoprojector y 1 aire acondicionado.



F12: Se equipará el cuarto Site Edificio 30, con 1 aire acondicionado.

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector

Dr. Alvaro Zamudio Lara
Coordinador General de Planeación y Administración

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2022

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Segundo Trimestre 2022
(Abril-Junio)
FECHA DE CORTE: 30/06/2022


REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD

2

Equipamiento del Campus Norte (Facultad de Nutrición)

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

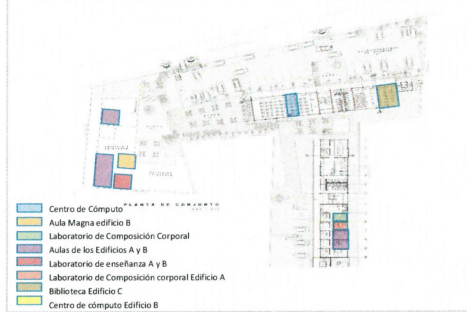

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca, Mor.
C.P.62209. Cuernavaca Morelos.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

0%

FOTOS (ANTES)



F1: Entrada Principal de la Facultad de Nutrición.



F2: Se equipará el Aula A1 Edificio A, con silla.



F3: Se equipará el Aula A2 Edificio A, con silla.



F4: Se equipará el Aula A3 Edificio A, con silla.



F5: Se equipará el Aula A4 Edificio A, con silla.

Comentarios de los trabajos realizados:

Los días 17 y 22 de junio de 2022, se llevó a cabo el acto de presentación y apertura de proposiciones del Procedimiento de Licitación Pública Electrónica Nacional LP10/2022 y LP11/2022 para la "adquisición de reactivos, materiales y equipo de laboratorio, mobiliario, herramientas y aire acondicionado para la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y "adquisición de materiales y equipo de cómputo para la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Lo anteriormente señalado se encuentra en la dirección electrónica <https://www.uaem.mx/difusion-y-medios/informacion-oficial/licitaciones/direccion-de-recursos-materiales-2022/>.

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



F6: Se equipará el Aula B7 Edificio B, con silla.



F7: Se equipará el Aula B8 Edificio B, con silla.



F8: Se equipará el Aula B9 Edificio B, con silla.



F9: Se equipará el Aula B10 Edificio B, con silla y pizarrón.



F10: Se equipará el Aula B11 Edificio B, con silla y pizarrón.



F11: Se equipará el Aula B12 Edificio B, con silla y pizarrón.



F12: Se equipará el Aula B13 Edificio B, con silla y pizarrón.



F13: Se equipará el Aula B14 Edificio B, con silla y pizarrón.



F14: Se equipará el Aula B15 Edificio B, con silla y pizarrón.

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



F15: Se equipará el Aula B16 Edificio B, con silla y pizarrón.



F16: Se equipará el Aula de usos múltiples, Edificio B (antes Biblioteca), con sillas, pizarrón y mesas.



F17: Se equipará el Aula Magna edificio B, con pizarrón y silla.



F18: Se equipará el Lab. De enseñanza (Edificio A), con bancos para sentarse y pizarrón blanco.



F19: Se equipará el Lab. De enseñanza (Edificio B), con anaquel metálico y pizarrón.



F20: Se equipará el Lab. De técnicas culinarias (Edificio A), con anaquel metálico.



F21: Se equipará el Lab. De técnicas culinarias (Edificio B), con anaquel metálico.



F22: Se equipará el Lab. De Composición corporal (Edificio A), con pizarrón blanco.



F23: Se equipará el Centro de Cómputo, Edificio B, con pizarrón blanco.



F24: Se equipará la Biblioteca, Edificio C, con estantes, mesa binaria y sillas.

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector

Dr. Alvaro Zamudio Lara
Coordinador General de Planeación y Administración

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



F6: Aula 5, 2do nivel, edificio 71



F7: Aula 6, 2do nivel, edificio 71




F8: Laboratorio de Docencia, 1er nivel Edificio 71



F9: Laboratorio Agrícola, Planta baja edificio 71



F10: Laboratorio en Producción Animal, planta baja, edificio 71

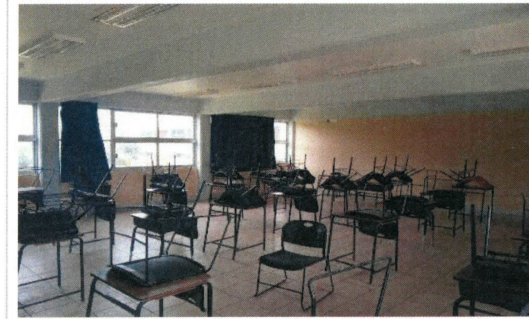


F11: Aula 10 primer nivel edificio 72



F12: Aula 11, 1er nivel edificio 72



F13: Aula 12, 2do nivel edificio 72

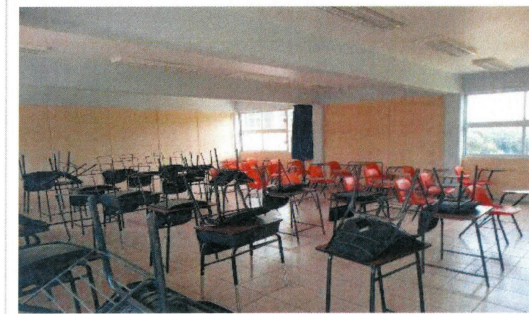


F14: Aula 13, 2do nivel, edificio 72

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



F15: Aula 14, 2do nivel, edificio 72

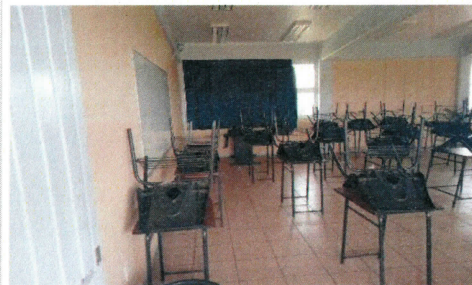


F16: Aula 15, 2do nivel, edificio 72




F17: Biblioteca, Planta baja, edificio 72



F18: Aula 1 Posgrado, primer nivel Edificio 10-A



F19: Aula 2 Edificio 10-A

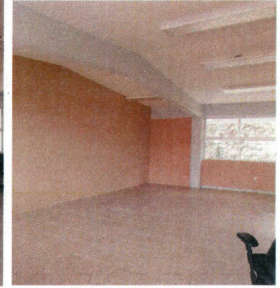

F20: Sala audiovisual 1, 1er nivel, edificio 10-A



F21: Sala audiovisual 2, Primer nivel, edificio 10-A

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector

Dr. Avaro Zamudio Lara
Coordinador Central de Planeación y Administración

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2022

ARD

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Segundo Trimestre 2022
(Abril-Junio)
FECHA DE CORTE: 30/06/2022

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance



0%

PRIORIDAD 2

Nombre de la obra:

Equipamiento del Campus Norte (Facultad de Contaduría, Administración e Informática, FCAeI)

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

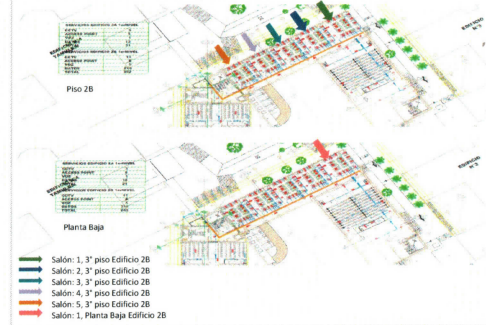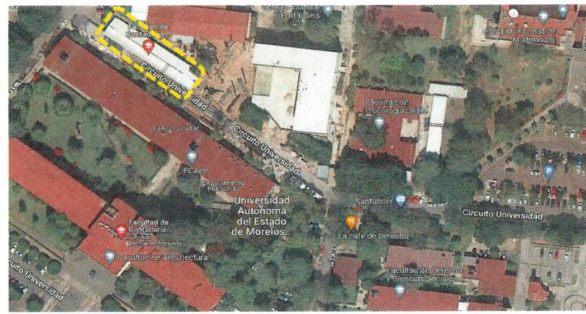


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca, Mor.
C.P.62209. Cuernavaca Morelos.

FOTOS (ANTES)




F1: Fachada Principal del Edificio 2B de la FCAeI

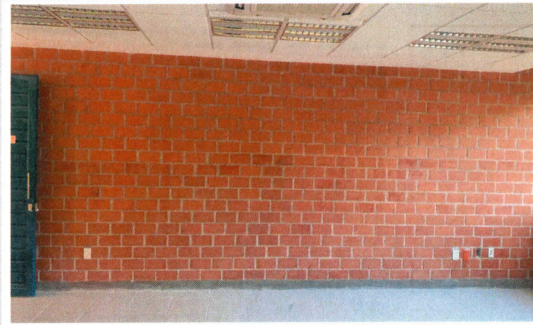

F2: Se equipará el 1, 3° piso Edificio 2B, con pizarrón blanco.

Comentarios de los trabajos realizados:
Los días 17 y 22 de junio de 2022, se llevó a cabo el acto de presentación y apertura de proposiciones del Procedimiento de Licitación Pública Electrónica Nacional LP10/2022 y LP11/2022 para la "adquisición de reactivos, materiales y equipo de laboratorio, mobiliario, herramientas y aire acondicionado para la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y "adquisición de materiales y equipo de cómputo para la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Lo anteriormente señalado se encuentra en la dirección electrónica <https://www.uaem.mx/difusion-y-medios/informacion/licitaciones/direccion-de-recursos-materiales-2022/>.

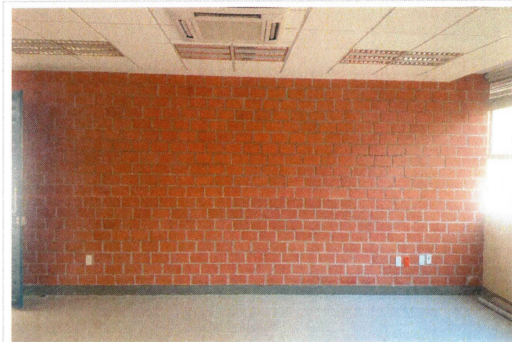

F3: Se equipará el Salón: 2, 3° piso Edificio 2B, con pizarrón blanco.



F4: Se equipará el Salón: Salón: 3, 3° piso Edificio 2B, con pizarrón blanco.



F5: Se equipará el Salón: 4, 3° piso Edificio 2B, con pizarrón blanco.

2022

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Segundo Trimestre 2022
(Abril-Junio)
FECHA DE CORTE: 30/06/2022

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

0%


PRIORIDAD

2

Nombre de la obra:

Equipamiento del Campus Norte (Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería FCQel)

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

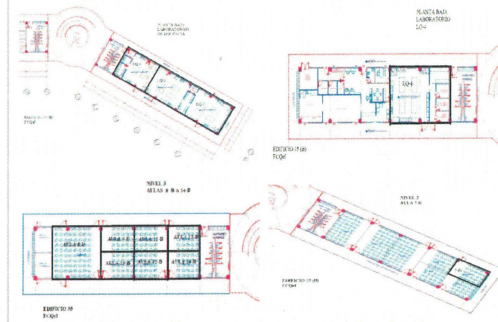

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca, Mor.
C.P.62209. Cuernavaca Morelos.

FOTOS (ANTES)



F1: Fachada Principal de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería FCQel




F2: Se equipará el Laboratorios Químicos Para Docencia , con colocación e instalación de cerradura, tipo barra antipánico.


Comentarios de los trabajos realizados:
Los días 17 y 22 de junio de 2022, se llevó a cabo el acto de presentación y apertura de proposiciones del Procedimiento de Licitación Pública Electrónica Nacional LP10/2022 y LP11/2022 para la "adquisición de reactivos, materiales y equipo de laboratorio, mobiliario, herramientas y aire acondicionado para la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y "adquisición de materiales y equipo de cómputo para la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Lo anteriormente señalado se encuentra en la dirección electrónica <https://www.uaem.mx/difusion-y-medios/informacion-oficial/licitaciones/direccion-de-recursos-materiales-2022/> .



F3: Se equipará el Aula 8, edificio B, con pizarrón blanco de 90"1.20.

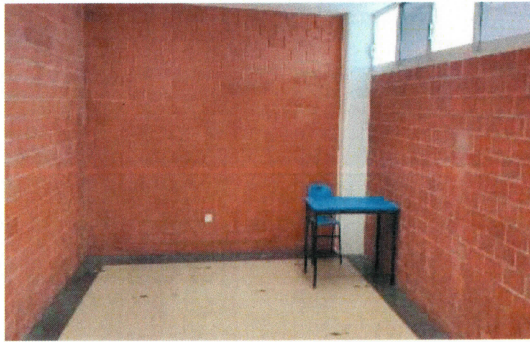


F4: Se equipará el Aula 9, edificio B, con pizarrón blanco de 90"1.20.

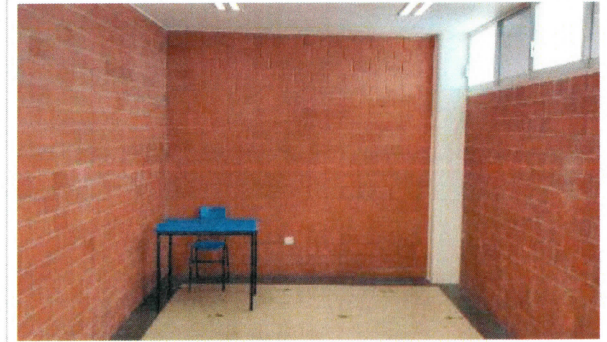


F5: Se equipará el Aula 10, edificio B, con pizarrón blanco de 90"1.20.


REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

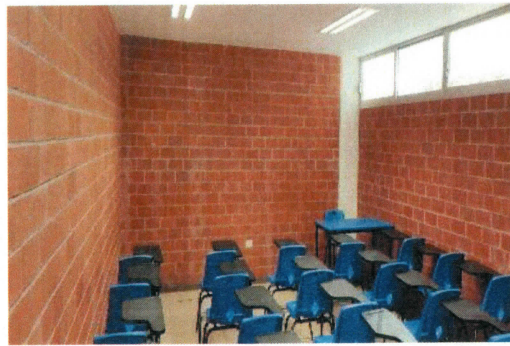

F6: Se equipará el Aula 11, edificio B, con pizarrón blanco de 90*1.20.

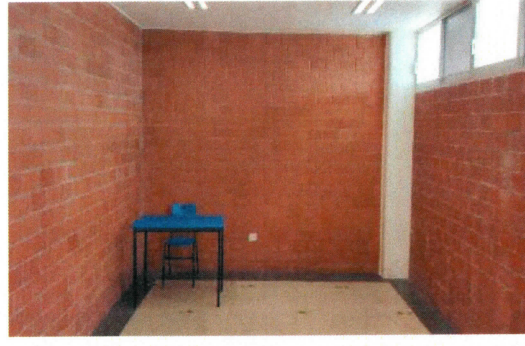


F7: Se equipará el Aula 12, edificio B, con proyector, pizarrón blanco de 90*1.20.

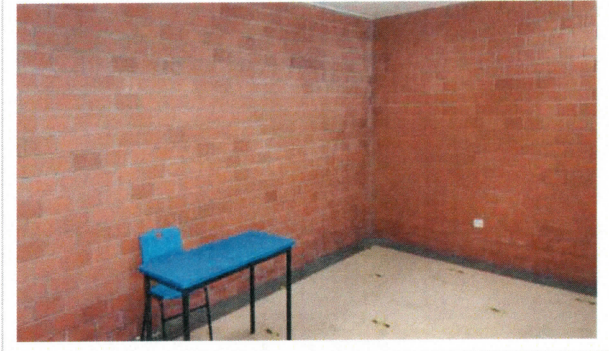


F8: Se equipará el Aula 13, edificio B, con proyector, pizarrón blanco de 90*1.20.




F9: Se equipará el Aula 14, edificio B, con proyector, pizarrón blanco de 90*1.20.

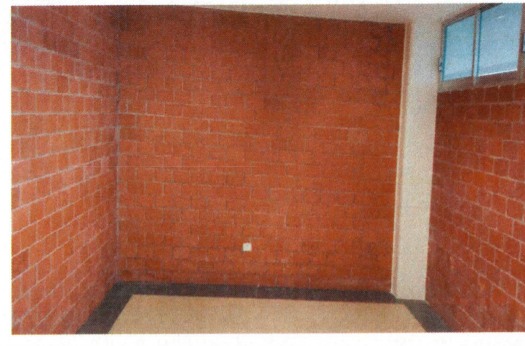

F10: Se equipará el Aula 15, edificio B, con proyector, pizarrón blanco de 90*1.20 y pupitres.

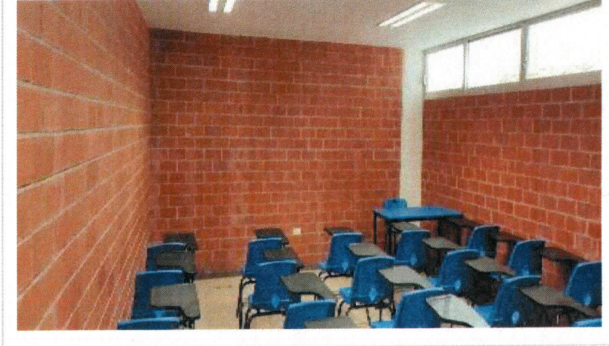

F11: Se equipará el aula 16, edificio B, con proyector, pizarrón blanco de 90*1.20 y pupitres.

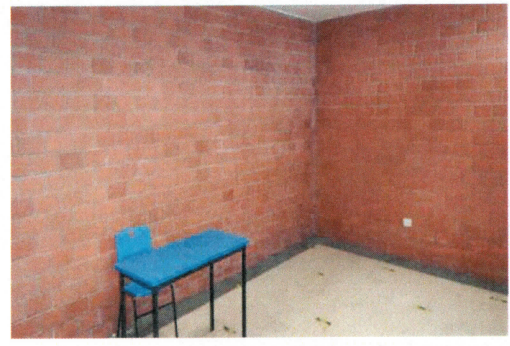

F12: Se equipará el Aula 17, edificio B, con proyector, pizarrón blanco de 90*1.20 y pupitres.




F13: Se equipará el Aula 18, edificio B, con proyector, pizarrón blanco de 90*1.20.




F14: Se equipará el Aula 19, edificio B, con proyector, pizarrón blanco de 90*1.20.


REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

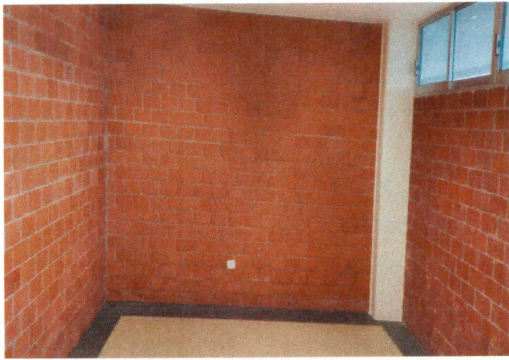


F15: Se equipará el Aula 20, edificio B, con proyector, pizarrón blanco de 90*1.20.

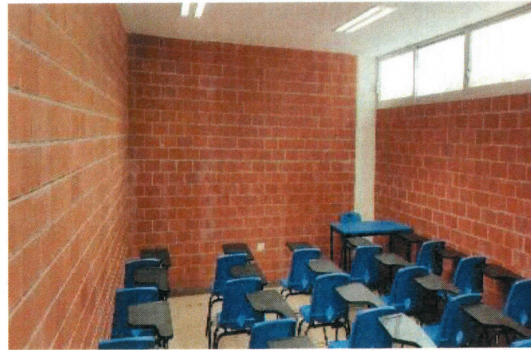

F16: Se equipará el Aula 21, edificio B, con proyector y pizarrón blanco de 90*1.20.

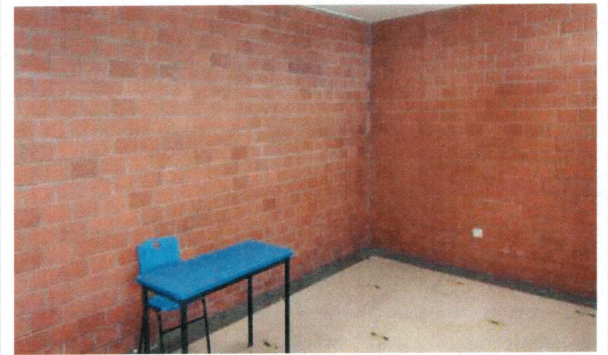

F17: Se equipará el Aula 22, edificio B, con proyector, pizarrón blanco de 90*1.20.

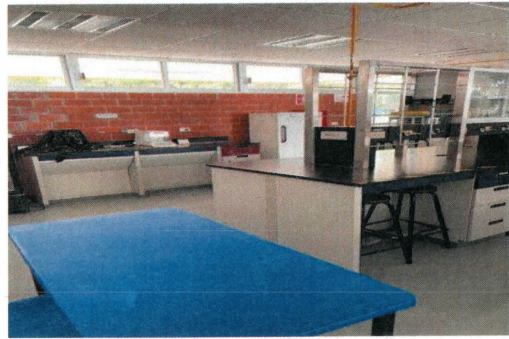

F18: Se equipará el Laboratorio de Química Analítica Edificio B, con 2 refrigerador tipo vitrina.



F19: Se equipará el Laboratorio de Eléctrica Electrónica Edificio B, con Mesa de trabajo para laboratorio.



F20: Se equipará la puerta de salida de emergencia del Laboratorios LQ1, con colocación e instalación de cerradura, tipo barra antipánico, bancos de madera.



F21: Se equipará la puerta de salida de emergencia del Laboratorios LQ2, con colocación e instalación de cerradura, tipo barra antipánico.



F22: Se equipará la puerta de salida de emergencia del Laboratorios LQ3, con colocación e instalación de cerradura, tipo barra antipánico.



F23: Se equipará la puerta de salida de emergencia del Laboratorios LQ4, con colocación e instalación de cerradura, tipo barra antipánico.

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



F24: Se equipará la puerta de salida de emergencia del Laboratorios LQ5, con colocación e instalación de cerradura, tipo barra antipánico.



F25: Se equipará la puerta de salida de emergencia del Almacén de Laboratorios ED.B, con colocación e instalación de cerradura, tipo barra antipánico.



F26: Se equipará el Aula 8 Edificio A, con pizarrón blanco de 1.20*2.40.




F27: Se equipará el Aula 9 Edificio A, con pizarrón blanco de 1.20*2.40.



F28: Se equipará el Aula 10 Edificio A, con pizarrón blanco de 1.20*2.40.




F29: Se equipará el Aula 11 Edificio A, con pizarrón blanco de 1.20*2.40.

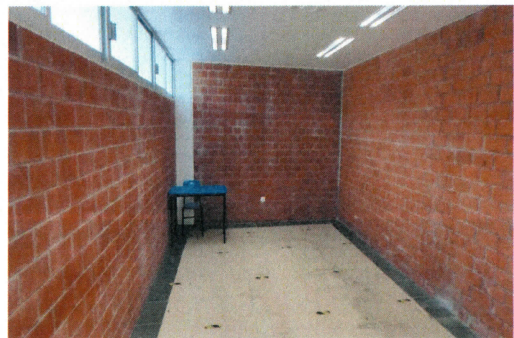

F30: Se equipará el Aula 12 Edificio A, con pizarrón blanco de 1.20*2.40.



F31: Se equipará el Aula 13 Edificio A, con pizarrón blanco de 1.20*2.40.

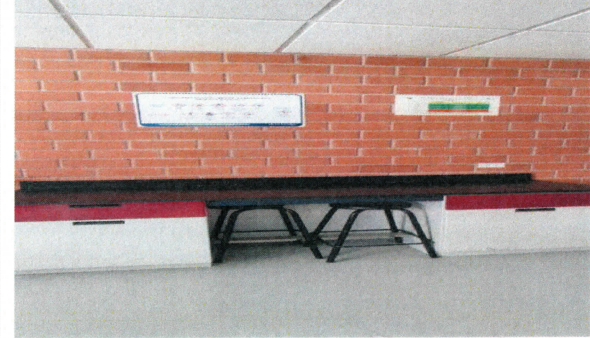

F32: Se equipará el Laboratorio del edificio B, con pizarrón blanco de 1.20*2.40.


REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



F33: Se equipará el Salón de titulaciones edificio A, con pizarrón blanco de 1.20*2.40.



F34: Se equipará el Salón 18, con pizarrón blanco de 1.20*2.40.

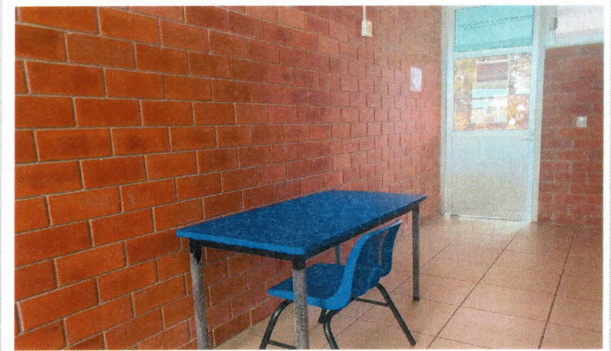

F35: Se equipará el Salón 19, con pizarrón blanco de 1.20*2.40.



F38: Se equipará el Salón 20, con pizarrón blanco de 1.20*2.40.

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector

Dr. Alvaro Zamudio Lara
Coordinador General de Planeación y Administración

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2022

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Segundo Trimestre 2022
(Abril-Junio)
FECHA DE CORTE: 30/06/2022

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD **2**

Nombre de la obra: **Equipamiento del Campus Norte (Facultad De Diseño)**




UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

0%

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

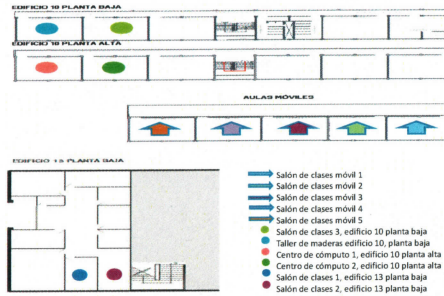


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca, Mor.
C.P.62209. Cuernavaca Morelos.

FOTOS (ANTES)



F1: Fachada del Edificio 10 de la Facultad De Diseño.

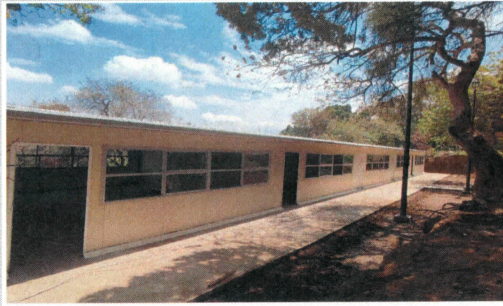

F2: Fachada Aulas móviles de la Facultad De Diseño.

Comentarios de los trabajos realizados:
Los días 17 y 22 de junio de 2022, se llevó a cabo el acto de presentación y apertura de proposiciones del Procedimiento de Licitación Pública Electrónica Nacional LP10/2022 y LP11/2022 para la "adquisición de reactivos, materiales y equipo de laboratorio, mobiliario, herramientas y aire acondicionado para la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y "adquisición de materiales y equipo de cómputo para la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Lo anteriormente señalado se encuentra en la dirección electrónica <https://www.uaem.mx/difusion-y-medios/informacion-oficial/licitaciones/direccion-de-recursos-materiales-2022/>.



F3: Se equipará el Salón de clases móvil 1, con pizarrón proyector y pantalla.




F4: Se equipará el Salón de clases móvil 2, con pizarrón proyector y pantalla.



F5: Se equipará el Salón de clases móvil 3, con pizarrón proyector y pantalla.

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

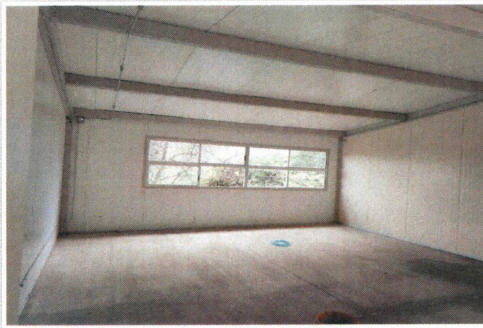

F6: Se equipará el Salón de clases móvil 4, con pizarrón proyector y pantalla.




F7: Se equipará el Salón de clases móvil 5, con pizarrón proyector y pantalla.



F8: Se equipará el Salón de clases 3, edificio 10 planta baja, con bancos de madera.



F9: Se equipará el Taller de maderas edificio 10, planta baja, con bancos de madera, con anaquel tipo esqueleto y ventilador.

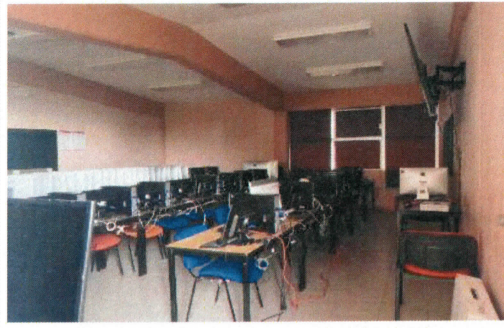


F10: Se equipará el Centro de cómputo 1, edificio 10 planta alta, con ventilador y locker.



F11: Se equipará el Centro de cómputo 2, edificio 10 planta alta, con locker, sillas y ventilador.



F12: Se equipará el Salón de clases 1, edificio 13 planta baja, con ventilador

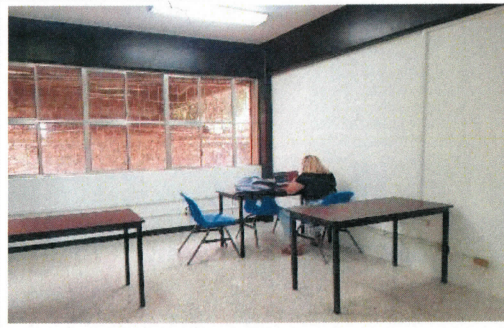

F13: Se equipará el Salón de clases 2, edificio 13 planta baja, con pizarrón, proyector y pantalla.

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector

Dr. Nvaro Zamudio Lara
Coordinador General de Planeación y Administración

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2022

ARG

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Segundo Trimestre 2022
(Abril-Junio)
FECHA DE CORTE: 30/06/2022

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD **2** Nombre de la obra: **Equipamiento del Campus Norte (Centro de Investigación en Dinámica Celular CIDC)**




UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

0%

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

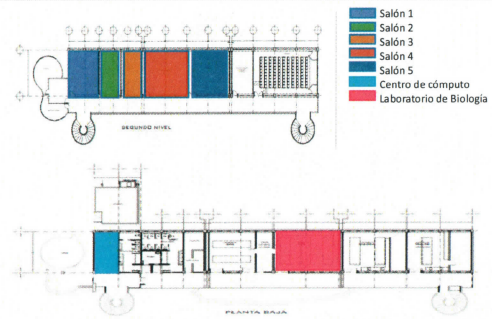


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca, Mor.
C.P.62209. Cuernavaca Morelos.

FOTOS (ANTES)




F1: Fachada Principal del Centro De Investigación en Dinámica Celular

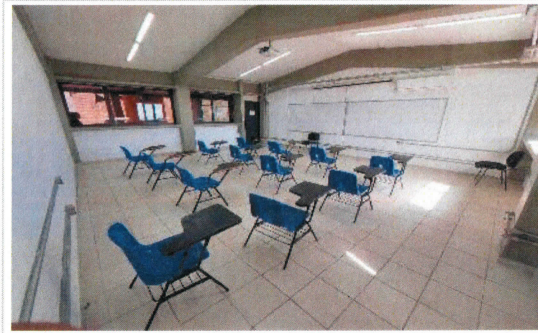

F2: Se equipará el Salón 1, con pupitre y mesa.

Comentarios de los trabajos realizados:
Los días 17 y 22 de junio de 2022, se llevó a cabo el acto de presentación y apertura de proposiciones del Procedimiento de Licitación Pública Electrónica Nacional LP10/2022 y LP11/2022 para la "adquisición de reactivos, materiales y equipo de laboratorio, mobiliario, herramientas y aire acondicionado para la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y "adquisición de materiales y equipo de cómputo para la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Lo anteriormente señalado se encuentra en la dirección electrónica <https://www.uaem.mx/difusion-y-medios/informacion-licitaciones/direccion-de-recursos-materiales-2022/> .

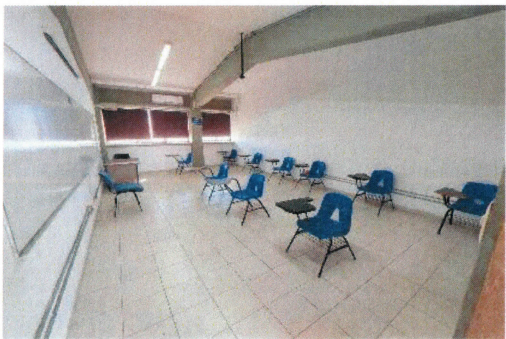

F3: Se equipará el Salón 2, con pupitre y mesa.




F4: Se equipará el Salón 3, con pupitre y mesa.



F5: Se equipará el Salón 4, con pupitre y mesa.



F6: Se equipará el Salón 5, con pupitre y mesa.

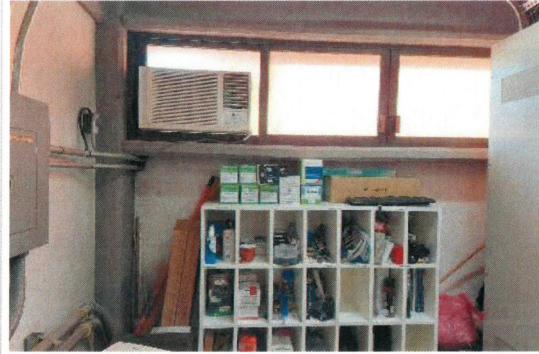

F7: Se equipará el Centro de cómputo, con aire acondicionado.



F8: Se equipará el Laboratorio de Biología, con Máquina de hielo y ultra congelador.

Dr. Gustavo Uruiza Beltrán
Rector

Dr. Alvaro Zamudio Lara
Coordinador General de Planeación y Administración

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra

2022

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Segundo Trimestre 2022
(Abril-Junio)
FECHA DE REPORTE: 30/06/2022

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

0%


PRIMORDIAL

2

Nombre de la obra:

Equipamiento del Campus Norte (Centro De Investigación En Ingeniería Y Ciencias Aplicadas CIICAp)

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

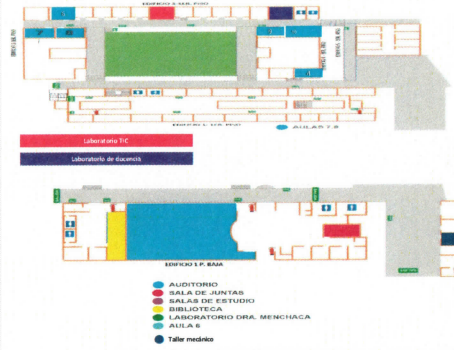

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca, Mor.
C.P.62209. Cuernavaca Morelos.

FOTOS (ANTES)



F1: Fachada Principal del CIICAp




F2: Fachada Lateral del CIICAp


Comentarios de los trabajos realizados:
Los días 17 y 22 de junio de 2022, se llevó a cabo el acto de presentación y apertura de proposiciones del Procedimiento de Licitación Pública Electrónica Nacional LP10/2022 y LP11/2022 para la "adquisición de reactivos, materiales y equipo de laboratorio, mobiliario, herramientas y aire acondicionado para la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y "adquisición de materiales y equipo de cómputo para la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Lo anteriormente señalado se encuentra en la dirección electrónica <https://www.uaem.mx/difusion-y-medios/informacion-oficial/licitaciones/direccion-de-recursos-materiales-2022/>.



F3: Se equipará el Salón 7, con extractor

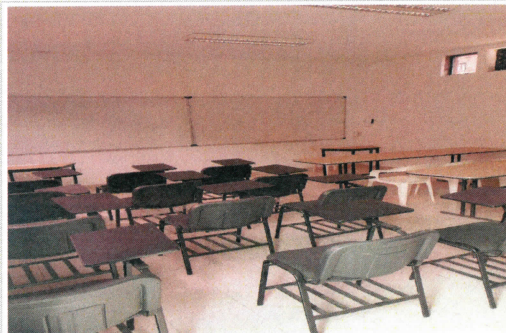

F4: Se equipará el Salón 8 con extractor, pantalla de proyección y proyector.

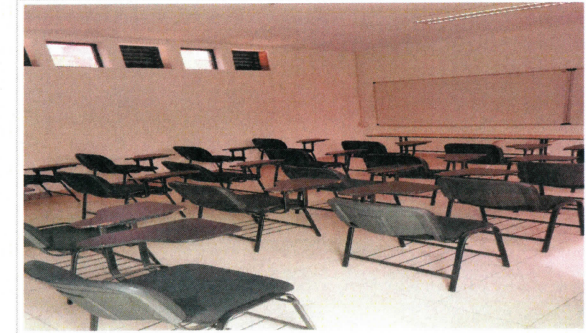

F5: Se equipará el Salón 9 con extractor

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL




F6: Se equipará el Salón 10, con extractor, pantalla de proyección y proyector.



F7: Se equipará el Salón 4, con proyector.



F8: Se equipará el Salón 6 con proyector.

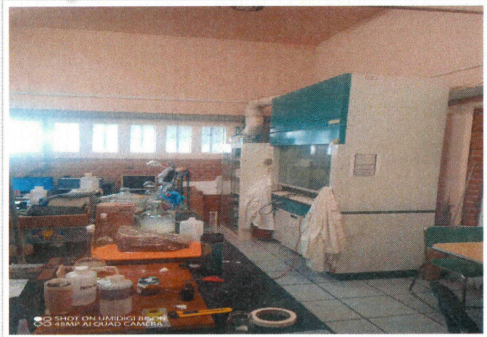

F9: Se equipará el Laboratorio: Procesos de corrosión, con Extractor de aire 1/2 caballos.




F10: Se equipará el Laboratorio: TIC, con pantalla de proyección y proyector.



F11: Se equipará el Laboratorio: Docencia, pantalla de proyección



F12: Se equipará el Sala de Consejo (usos múltiples) con proyector.

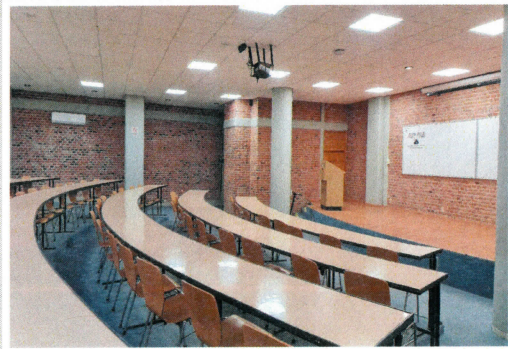

F13: Se equipará el Auditorio, pantalla de proyección, 2 aires acondicionado y proyector.



F14: Se equipará el Laboratorio: Fenómenos de superficies e interfaces con aire acondicionado.



F15: Se equipará el Taller mecánico con mufta.



F16: Se equipará el Biblioteca, con gandola.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, enclosed in a rectangular box.

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'Z' followed by several loops, enclosed in a rectangular box.

Dr. Avaro Zamudio Lara
Coordinador General de Planeación y Administración

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2022

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES


DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Segundo Trimestre 2022
(Abril-Junio)
FECHA DE CORTE: 30/06/2022

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRORIDAD 2 Nombre de la obra: **Equipamiento del Campus Norte (Centro de Investigación en Ciencias CInC)**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

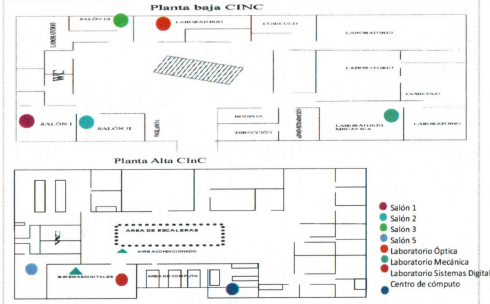

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca, Mor.
C.P.62209. Cuernavaca Morelos.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

0%

FOTOS (ANTES)



F1: Fachada Principal del Centro De Investigación En Ciencias



F2: Se equipará el Salón 1, con silla de tela y de polipropileno, pizarrón de cristal, pizarrón blanco, ventilador de techo y video proyector.



F3: Se equipará el Salón 2, con silla de polipropileno, pizarrón de cristal, pizarrón blanco, ventilador de techo y video proyector.



F4: Se equipará el Salón 3, con silla de polipropileno, pizarrón de cristal, pizarrón blanco, ventilador de techo y video proyector.

Comentarios de los trabajos realizados:
Los días 17 y 22 de junio de 2022, se llevó a cabo el acto de presentación y apertura de proposiciones del Procedimiento de Licitación Pública Electrónica Nacional LP10/2022 y LP11/2022 para la "adquisición de reactivos, materiales y equipo de laboratorio, mobiliario, herramientas y aire acondicionado para la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y "adquisición de materiales y equipo de cómputo para la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Lo anteriormente señalado se encuentra en la dirección electrónica <https://www.uaem.mx/difusion-y-medios/informacion-oficial/licitaciones/direccion-de-recursos-materiales-2022/>.



F5: Se equipará el Salón 5, con silla de polipropileno, pizarrón de cristal, pizarrón blanco, ventilador de techo y video proyector.

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



F6: Se equipará el Laboratorio Óptica, con pizarrón de cristal, pizarrón blanco y ventilador de techo.



F7: Se equipará el Laboratorio Mecánica, con pizarrón de cristal, video proyector y ventilador de techo.



F8: Se equipará el Laboratorio Electro, pizarrón blanco, videoprojector y ventilador de techo.



F9: Se equipará el Laboratorio Sistemas Digitales, con sillas de tela y de polipropileno.



F10: Se equipará el Centro de cómputo, con sillas de polipropileno.

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector

Dr. Avaro Zamudio Lara
Coordinador General de Planeación y Administración

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2022

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Segundo Trimestre 2022
(Abril-Junio)
FECHA DE ORTE: 30/06/2022

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

0%


PRICIDAD

2

Nombre de la obra:

Equipamiento del Campus Norte (Centro de Investigaciones Químicas CIQ)

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

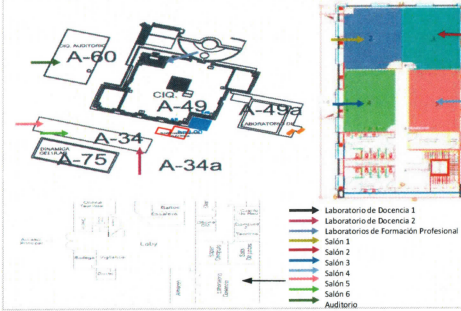

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca, Mor.
C.P.62209. Cuernavaca Morelos.

FOTOS (ANTES)



F1: Fachada Principal del Centro De investigaciones Químicas



F2: Se equipará el Laboratorio de Docencia 1, con 2 extractores centrífugo.



F3: Se equipará el Laboratorio de Docencia 2, con 2 extractores centrífugo.



F4: Se equipará el Laboratorios de Formación Profesional, con 4 extractores centrífugo.



F5: Se equipará el Salón 1, con proyector.

Comentarios de los trabajos realizados:

Los días 17 y 22 de junio de 2022, se llevó a cabo el acto de presentación y apertura de proposiciones del Procedimiento de Licitación Pública Electrónica Nacional LP10/2022 y LP11/2022 para la "adquisición de reactivos, materiales y equipo de laboratorio, mobiliario, herramientas y aire acondicionado para la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y "adquisición de materiales y equipo de cómputo para la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Lo anteriormente señalado se encuentra en la dirección electrónica <https://www.uaem.mx/difusion-y-medios/informacion-oficial/licitaciones/direccion-de-recursos-materiales-2022/>.

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



F6: Se equipará el Salón 2, con proyector.



F7: Se equipará el Salón 3, con proyector.



F8: Se equipará el Salón 4, con proyector.



F9: Se equipará el Auditorio, con proyector.



F10: Se equipará el Salón 5, con proyector.



F11: Se equipará el Salón 6, con proyector.

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector

Dr. Anvaro Zamudio Lara
Coordinador General de Planeación y Administración

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2022

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Segundo Trimestre 2022
(Abril-Junio)
FECHA DE EMISIÓN: 15/06/2022

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS



Porcentaje de avance

0%

PRIORIDAD 2 Nombre de la obra:

Equipamiento del Campus Norte (Centro De Investigación En Biotecnología CEIB)

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

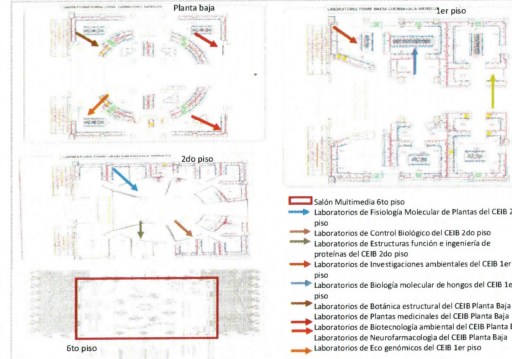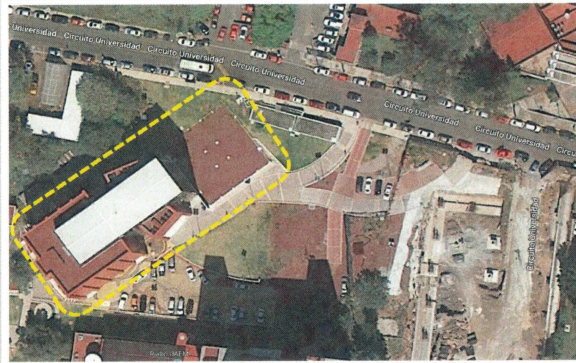

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca, Mor.
C.P.62209. Cuernavaca Morelos.

FOTOS (ANTES)



F1: Fachada Principal del Centro de Investigación en Biotecnología.



F2: Se equipará el Salón Multimedia 6to piso, mesas multimedia, sillas y pizarrón.




F3: Se equipará el Laboratorios de Fisiología Molecular de Plantas del CEIB 2do piso, con 2 mesas de laboratorio.



F4: Se equipará el Laboratorios de Control Biológico del CEIB 2do piso, con 2 mesas de laboratorio.

Comentarios de los trabajos realizados:
Los días 17 y 22 de junio de 2022, se llevó a cabo el acto de presentación y apertura de proposiciones del Procedimiento de Licitación Pública Electrónica Nacional LP10/2022 y LP11/2022 para la "adquisición de reactivos, materiales y equipo de laboratorio, mobiliario, herramientas y aire acondicionado para la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y "adquisición de materiales y equipo de cómputo para la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Lo anteriormente señalado se encuentra en la dirección electrónica <https://www.uaem.mx/difusion-y-medios/informacion-oficial/licitaciones/direccion-de-recursos-materiales-2022/>.

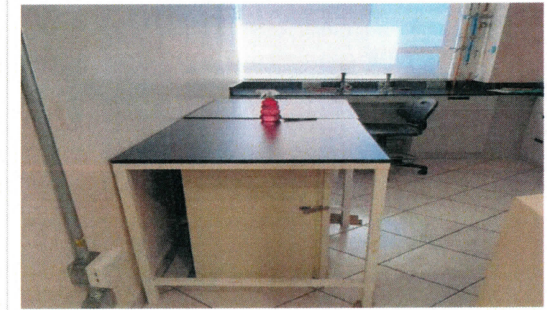

F5: Se equipará el Laboratorios de Estructuras función e ingeniería de proteínas del CEIB 2do piso, con 2 mesas de laboratorio.



F6: Se equipará el Laboratorio de Investigaciones ambientales del CEIB 1er piso, con 2 mesas de laboratorio.



F7: Se equipará el Laboratorio de Biología molecular de hongos del CEIB 1er piso, con 2 mesas de laboratorio.



F8: Se equipará el Laboratorio de Botánica estructural del CEIB Planta Baja, con 2 mesas de laboratorio.



F9: Se equipará el Laboratorio de Plantas medicinales del CEIB Planta Baja, con 2 mesas de laboratorio y bancos.



F10: Se equipará el Laboratorio de Biotecnología ambiental del CEIB Planta Baja, con 1 mesa de laboratorio.




F11: Se equipará el Laboratorio de Neurofarmacología del CEIB Planta Baja, con 2 mesas de laboratorio.



F12: Se equipará el Laboratorio de Eco genómicos del CEIB 1er piso, con 2 mesas de laboratorio.



F13: Se equipará el Auditorio sótano, con pizarrón

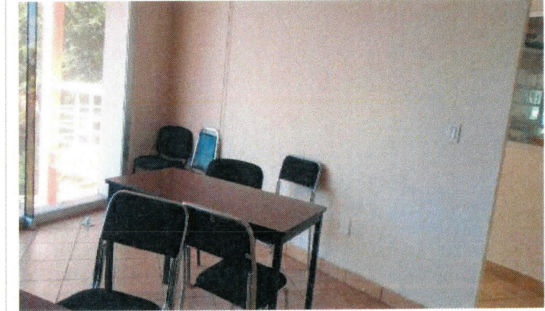

F14: Se equipará el Salón multimedia de planta baja, con pizarrón blanco.




F15: Se equipará el Salón multimedia de 1er piso, con pizarrón blanco.



F16: Se equipará el Salón de posgrado de 2do piso, con pizarrón blanco.



F17: Se equipará el Salón 1 de 5to piso, con pizarrón blanco.

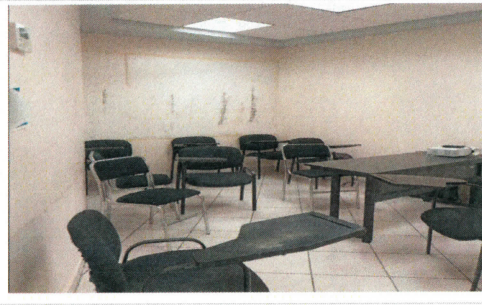

F18: Se equipará el Salón 2 de 5to piso, con pizarrón blanco.

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector

Dr. Avaro Zamudio Lara
Coordinador General de Planeación y Administración

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2022

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Segundo Trimestre 2022
(Abril-Junio)
FECHA DE CORTE: 30/06/2022

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIMORDIAL 2 Nombre de la obra: **Equipamiento del Campus Norte (Biblioteca Central)**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

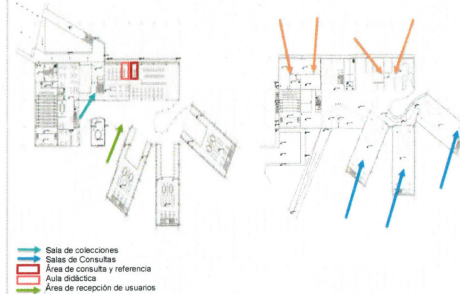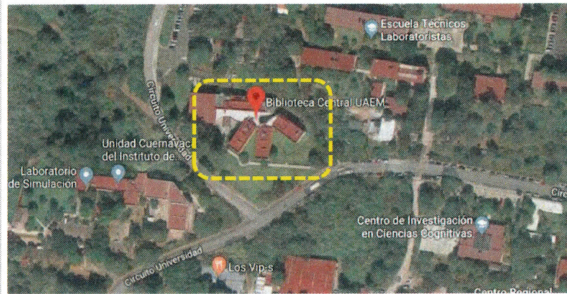

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca, Mor.
C.P.62209. Cuernavaca Morelos.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS


Porcentaje de avance

0%

FOTOS (ANTES)



F1: Entrada Principal de la Biblioteca Central

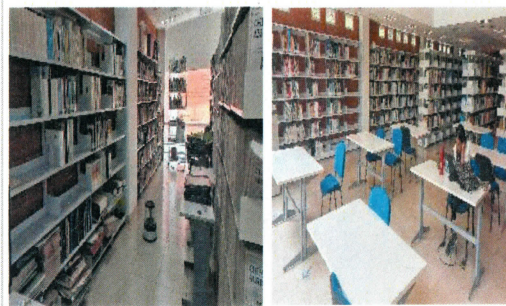

F2: Se equipará el Sala de colecciones y Biblioteca Central Universitaria.

Comentarios de los trabajos realizados:
Los días 17 y 22 de junio de 2022, se llevó a cabo el acto de presentación y apertura de proposiciones del Procedimiento de Licitación Pública Electrónica Nacional LP10/2022 y LP11/2022 para la "adquisición de reactivos, materiales y equipo de laboratorio, mobiliario, herramientas y aire acondicionado para la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y "adquisición de materiales y equipo de cómputo para la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Lo anteriormente señalado se encuentra en la dirección electrónica <https://www.uaem.mx/difusion-y-medios/informacion-oficial/licitaciones/direccion-de-recursos-materiales-2022/>.



F3: Se equipará el Sala de Consultas de la biblioteca Central



F4: Se equipará el Área de consulta y referencia de la biblioteca Central



F5: Se equipará el Aula didáctica y sala de colecciones de la biblioteca Central

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL




F6: Se equipará el Área de recepción de usuarios de la biblioteca Central




F7: Se equipará el Aula didáctica y aula de usos múltiples de la biblioteca Central




F8: Se equipará la Sala de consulta de la biblioteca Central

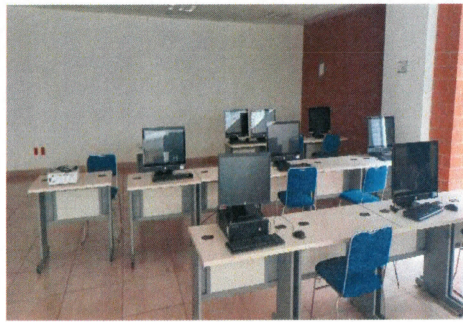


F9: Se equipará el Aula de Usos Múltiples de la biblioteca Central

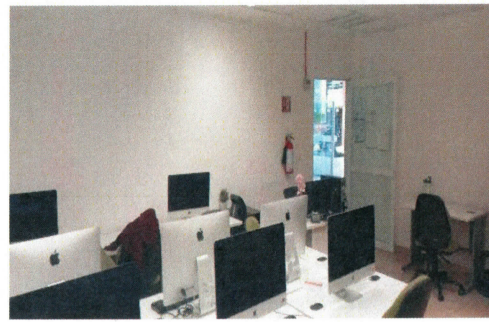


F10: Se equipará el Centro de Computo de la biblioteca Central

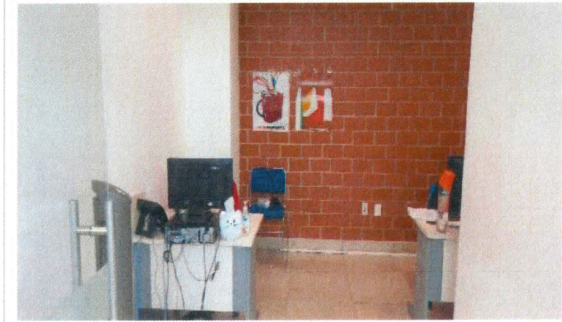


F11: Se equipará el Biblioteca en general, con extintores

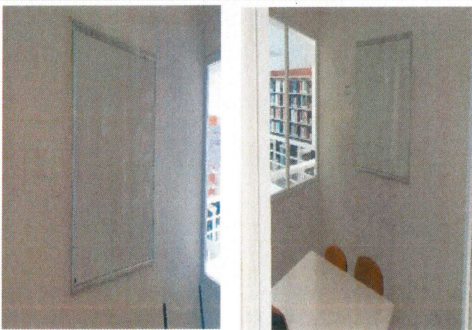

F12: Biblioteca en general, con pizarrón interactivo.


Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector


Dr. Ayero Zamudio Lara
Coordinador General de Planeación y Administración

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Escuela de la universidad


Porcentaje de avance

0%

PRIORIDAD 3 Nombre de la obra:

Equipamiento del Campus Oriente (Escuela de Estudios Superiores de Joncatepec)

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

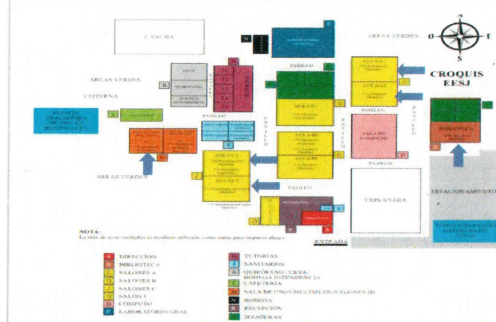

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Joncatepec -Tepalcingo S/N, C.P. 62930, Tepalcingo, Morelos.

FOTOS (ANTES)



F1: Fachada Principal de la Escuela de Estudios Superiores de Joncatepec




F2: Se equipará el Salón A2, con pizarrón de cristal.

Comentarios de los trabajos realizados:
Los días 17 y 22 de junio de 2022, se llevó a cabo el acto de presentación y apertura de proposiciones del Procedimiento de Licitación Pública Electrónica Nacional LP10/2022 y LP11/2022 para la "adquisición de reactivos, materiales y equipo de laboratorio, mobiliario, herramientas y aire acondicionado para la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y "adquisición de materiales y equipo de cómputo para la Universidad Autónoma del Estado de Morelos" <https://www.uaem.mx/difusion-y-medios/informacion-oficial/licitaciones/direccion-de-recursos-materiales-2022/> .



F3: Se equipará el Salón C1, con pizarrón de cristal.

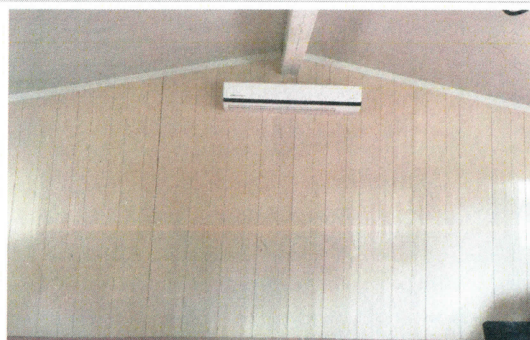

F4: Se equipará el Salón C2, con pizarrón de cristal.



F5: Se equipará el Salón A1, con pizarrón de cristal y aire acondicionado.

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL




F6: Se equipará el Usos Múltiples, con pizarrón de cristal.



F7: Se equipará la Biblioteca, con estantes.



F8: Se equipará el Salón L1, con aire acondicionado.

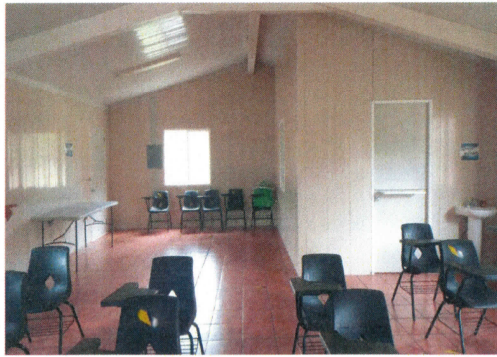

F9: Se equipará el Salón L2, con aire acondicionado.



F10: Se equipará el Salón D2, con aire acondicionado.

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector

Dr. Álvaro Zamudio Lara
Coordinador General de Planeación y Administración

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2022

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Segundo Trimestre 2022
(Abril-Junio)
FECHA DE CORTE: 30/06/2022

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD **3** Nombre de la obra: **Equipamiento del Campus Oriente (Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec Subsede Tepalcingo)**




UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Escuela de la universidad

Porcentaje de avance

0%

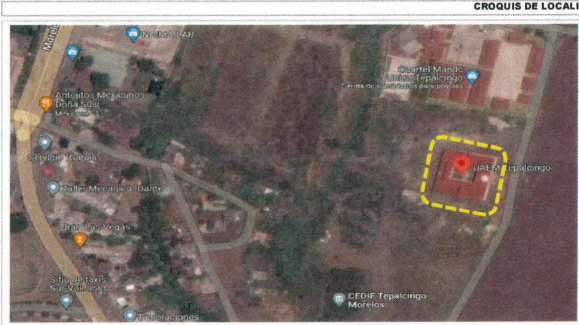

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Calle Paseo Riveroño s/n, C.P. 62920, Tepalcingo, Morelos.


FOTOS (ANTES)



F1: Fachada Principal de la Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec Subsede Tepalcingo



F2: Se equipará el Aula 1, con pizarrón de cristal y aire acondicionado.

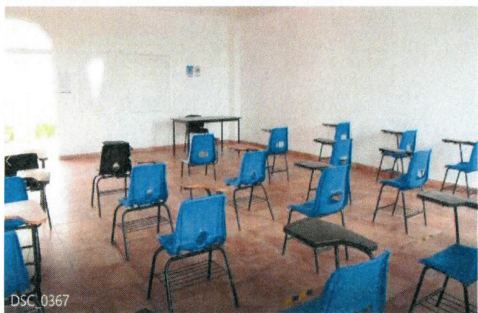

F3: Se equipará el Aula 2, con pizarrón de cristal y aire acondicionado.



F4: Se equipará el Aula 3, con pizarrón de cristal y aire acondicionado.

Comentarios de los trabajos realizados:

Los días 17 y 22 de junio de 2022, se llevó a cabo el acto de presentación y apertura de proposiciones del Procedimiento de Licitación Pública Electrónica Nacional LP10/2022 y LP11/2022 para la "adquisición de reactivos, materiales y equipo de laboratorio, mobiliario, herramientas y aire acondicionado para la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y "adquisición de materiales y equipo de cómputo para la Universidad Autónoma del Estado de Morelos" <https://www.uaem.mx/difusion-y-medios/informacion-oficial/licitaciones/direccion-de-recursos-materiales-2022/>.



F5: Se equipará el Aula 4, con pizarrón de cristal y aire acondicionado.

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



F6: Se equipará el Aula 5, con pizarrón de cristal y aire acondicionado.



F7: Se equipará el Aula 6, con pizarrón de cristal.



F8: Se equipará el Aula 7, con pizarrón de cristal.




F9: Se equipará el Aula 8, con pizarrón de cristal.



F10: Se equipará el Centro de Cómputo, con aire acondicionado y pizarrón de cristal.



F11: Se equipará el Auditorio, con video proyector.

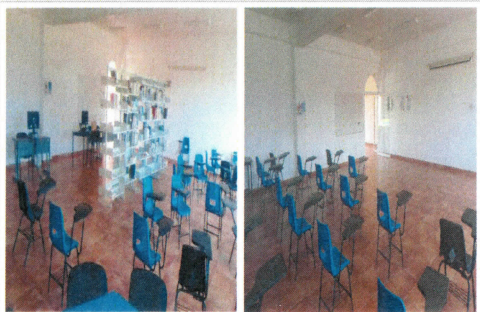

F12: Se equipará la biblioteca, con aire acondicionado.



F13: Se equipará el Aula 9, con pizarrón de cristal.



F14: Se equipará el Aula 10, con pizarrón de cristal.

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector

Dr. Avaro Zamudio Lara
Coordinador General de Planeación y Administración

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2022



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Segundo Trimestre 2022
(Abril-Junio)
FECHA DE CORTE: 30/06/2022

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Porcentaje de avance

0%

PRIORIDAD 3

Nombre de la obra:

Equipamiento del Campus Oriente(Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec Subsede Axochiapan)

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Libramiento San Pablo S/N, C.P. 62954, Axochiapan, Morelos.

FOTOS (ANTES)



F1: Fachada Principal de la Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec Subsede Axochiapan



F2: Se equipará el Centro de Cómputo, con aire acondicionado.



F3: Se equipará el Salón A, con aire acondicionado.

Comentarios de los trabajos realizados:

Los días 17 y 22 de junio de 2022, se llevó a cabo el acto de presentación y apertura de proposiciones del Procedimiento de Licitación Pública Electrónica Nacional LP10/2022 y LP11/2022 para la "adquisición de reactivos, materiales y equipo de laboratorio, mobiliario, herramientas y aire acondicionado para la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y "adquisición de materiales y equipo de cómputo para la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. <https://www.uaem.mx/difusion-y-medios/informacion-oficial/licitaciones/direccion-de-recursos-materiales-2022/>

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector

Dr. Amaro Zamudio Lara
Coordinador General de Planeación y Administración

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2022

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Segundo Trimestre 2022
(Abril-Junio)
FECHA DE CORTE: 30/06/2022

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL


PRIORIDAD

3

Nombre de la obra:

Equipamiento del Campus Oriente (Facultad de Estudios Superiores de Cuautla)

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

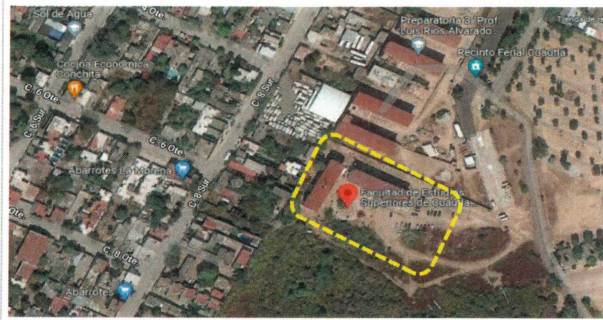

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Escuela de la universidad

Porcentaje de avance

0%


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera México-Oaxaca No. 218, Colonia Plan de Ayala, C.P. 62743, Cuautla, Morelos.

FOTOS (ANTES)



F1: Entrada Principal de la Facultad de Estudios Superiores de Cuautla

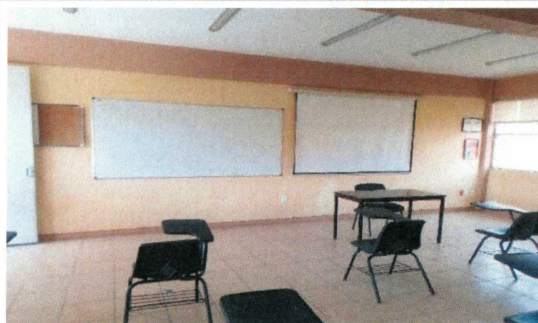

F2: Se equipará el Salón 1, con Silla Binaria 1" de Polipropileno.



F3: Se equipará el Salón 2, con Silla Binaria 1" de Polipropileno.



F4: Se equipará el Salón 3, con Silla Binaria 1" de Polipropileno.

Comentarios de los trabajos realizados:
Los días 17 y 22 de junio de 2022, se llevó a cabo el acto de presentación y apertura de proposiciones del Procedimiento de Licitación Pública Electrónica Nacional LP10/2022 y LP11/2022 para la "adquisición de reactivos, materiales y equipo de laboratorio, mobiliario, herramientas y aire acondicionado para la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y "adquisición de materiales y equipo de cómputo para la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. <https://www.uaem.mx/difusion-y-medios/informacion-oficial/citaciones/direccion-de-recursos-materiales-2022/> .




F5: Se equipará el Salón 4, con Silla Binaria 1" de Polipropileno.


REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



F6: Se equipará el Salón 5, con Silla Binaria 1° de Polipropileno.

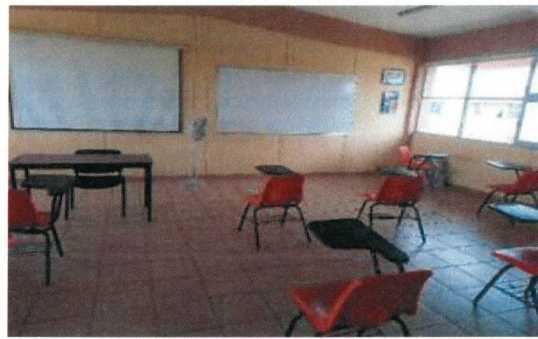

F7: Se equipará el Salón 6, con Video proyector.

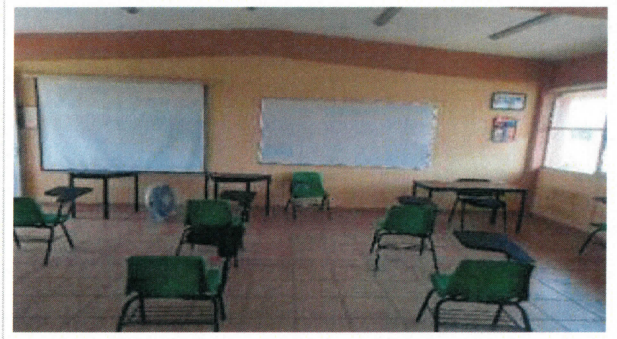


F8: Se equipará el Salón 10, con Video proyector.



F9: Se equipará el Salón 11, con Video proyector.



F10: Se equipará el Salón 12, con Video proyector.

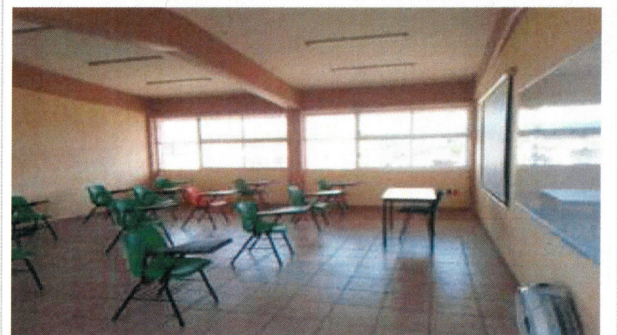

F11: Se equipará el Salón 13, con Video proyector.



F12: Se equipará el Salón 14, con Video proyector.



F13: Salón H: Se equipará la Cabina de Radio 1 extintor 1 silla binaria y extintor.



F14: Se equipará el Salón L. Aula de Videograbación 1 extintor.

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL




F16: Se equipará el Centro de Cómputo, con anaquel tipo esqueleto



F16: Se equipará la Biblioteca 1, con anaquel tipo esqueleto



F17: Se equipará el Laboratorio de Idiomas, con mesas de polipropileno.

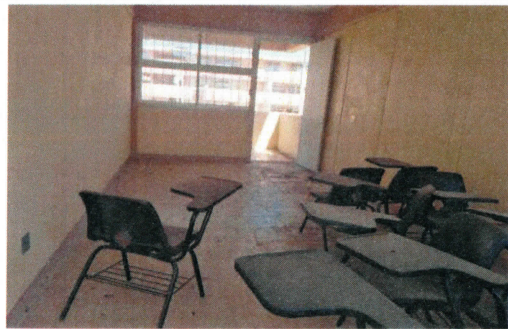

F18: Se equipará el Salón G: Laboratorio de Seguridad Ciudadana y Ciencias Forenses, con bancos gratorios, mesa de acero inoxidable

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector

Dr. Alvaro Zamudio Lara
Coordinador General de Planeación y Administración

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra

2022

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Segundo Trimestre 2022
(Abril-Junio)
FECHA DE CORTE: 30/06/2022



REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD 3

Nombre de la obra:

Equipamiento del Campus Oriente (Escuela de Estudios Superiores de Xalostoc)

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

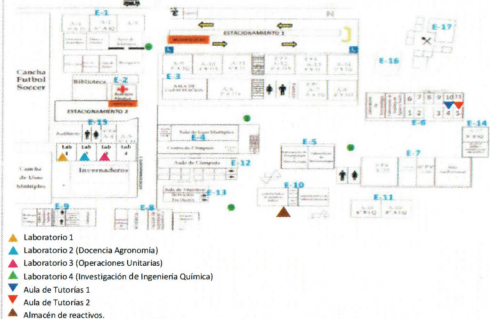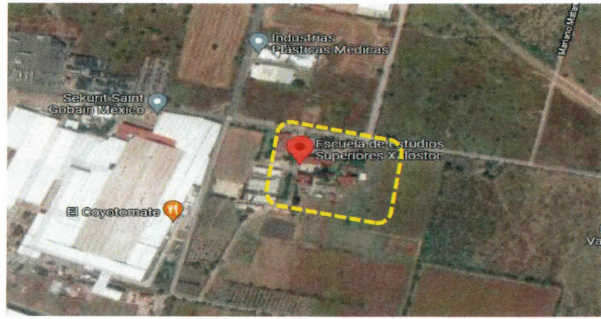

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Avenida Nicolás S/N, Parque Industrial, C.P. 62717 Ayala, Morelos.



Escuela de la Universidad
Porcentaje de avance

0%

FOTOS (ANTES)



F1: Edificio principal de la Escuela de Estudios Superiores de Xalostoc.



F2: Se equipará el Laboratorio 1, con banco para sentarse, silla apilable, pizarrón blanco, anaquel tipo esqueleto y mesa binaria.



F3: Se equipará el Laboratorio 2 (Docencia Agronomía), con banco para sentarse, silla apilable, pizarrón blanco, anaquel tipo esqueleto y mesa binaria.



F4: Se equipará el Laboratorio 3 (Operaciones Unitarias), con banco para sentarse, silla apilable, pizarrón blanco, anaquel tipo esqueleto y mesa binaria.

Comentarios de los trabajos realizados:
Los días 17 y 22 de junio de 2022, se llevó a cabo el acto de presentación y apertura de proposiciones del Procedimiento de Licitación Pública Electrónica Nacional LP10/2022 y LP11/2022 para la "adquisición de reactivos, materiales y equipo de laboratorio, mobiliario, herramientas y aire acondicionado para la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y "adquisición de materiales y equipo de cómputo para la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. <https://www.uaem.mx/difusion-y-medios/informacion-oficial/licitaciones/direccion-de-recursos-materiales-2022/> .



F5: Se equipará el Laboratorio 4 (Investigación de Ingeniería Química), con banco para sentarse, silla apilable, pizarrón blanco, anaquel tipo esqueleto y mesa binaria.



F6:Se equipará el Aula de Tutorías 1, con mesa binaria de polipropileno, silla apilable, pizarrón blanco y mesa trapezoidal.



F7:Se equipará el Aula de Tutorías 2, con mesa binaria de polipropileno, silla apilable, pizarrón blanco y mesa trapezoidal.



F8:Se equipará el Almacén de reactivos, con Anaquel tipo esqueleto de 5 entrepaños.

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector

Dr. Alvaro Zamudio Lara
Coordinador General de Planeación y Administración

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra

2022

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA


Mes reportado
Segundo Trimestre 2022
(Abril-Junio)
FECHA DE COPIE: 30/06/2022

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD 3 Nombre de la obra:

Equipamiento del Campus Oriente (Escuela de Estudios Superiores de Yecapixtla)

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

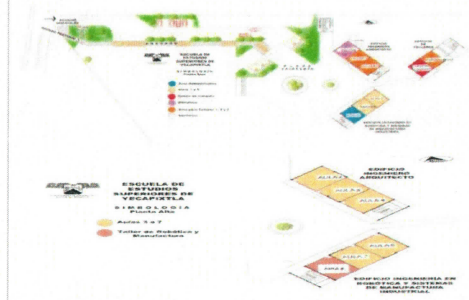

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Avenida Félix Arias, quinta de los Amates, C.P. 62820, Yecapixtla Morelos.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Escuela de la universidad
Porcentaje de avance

0%

FOTOS (ANTES)



F1: Fachada Principal de la Escuela de Estudios Superiores de Yecapixtla.



F2: Se equipará el Aula 1, Planta baja, edificio Ingeniero Arquitecto.

Comentarios de los trabajos realizados:

Los días 17 y 22 de junio de 2022, se llevó a cabo el acto de presentación y apertura de proposiciones del Procedimiento de Licitación Pública Electrónica Nacional LP10/2022 y LP11/2022 para la "adquisición de reactivos, materiales y equipo de laboratorio, mobiliario, herramientas y aire acondicionado para la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y "adquisición de materiales y equipo de cómputo para la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. <https://www.uaem.mx/difusion-y-medios/informacion-oficial/licitaciones/direccion-de-recursos-materiales-2022/> .



F3: Se equipará el Aula 2, Planta alta, edificio Ingeniero Arquitecto.




F4: Se equipará el Aula 3, Planta baja, edificio Ingeniero Arquitecto.



F5: Se equipará el Aula 4, Planta alta, edificio Ingeniero Arquitecto.

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

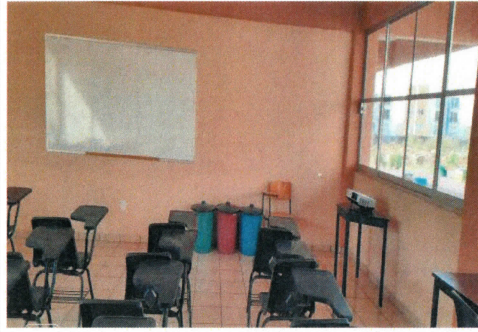

F6: Se equipará el Aula 1 Planta Baja Edificio Ingeniero en Robótica y Sistemas de Manufactura Industrial.



F7: Se equipará el Aula 2 Planta Baja Edificio Ingeniero en Robótica y Sistemas de Manufactura Industrial.

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector

Dr. Avaro Zamudio Lara
Coordinador General de Planeación y Administración

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2022

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Segundo Trimestre 2022
(Abril-Junio)
FECHA DE CORTE: 30/04/2022

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL


PRIMERIDAD

3

Nombre de la obra:

Equipamiento del Campus Oriente (Escuela de Estudios Superiores de Yauatepec)

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

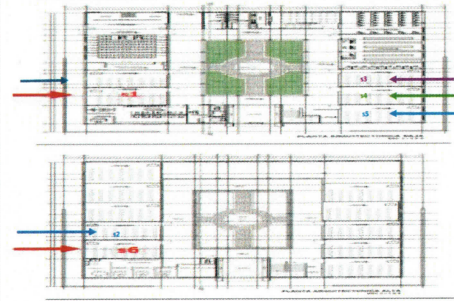

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Buenavista, C.P. 62730, Yauatepec de Zaragoza, Morelos.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Escuela de la universidad

Porcentaje de avance

0%

FOTOS (ANTES)



F1: Fachada Principal de la Escuela de Estudios Superiores de Yauatepec



F2: Se equipará el Salón 1, con silla y mesa binaria.



F3: Se equipará el Salón 2, con silla y mesa binaria.



F4: Se equipará el Salón 3, con silla y mesa binaria.



F5: Se equipará el Salón 4, con silla y mesa binaria.

Comentarios de los trabajos realizados:

Los días 17 y 22 de junio de 2022, se llevó a cabo el acto de presentación y apertura de proposiciones del Procedimiento de Licitación Pública Electrónica Nacional LP10/2022 y LP11/2022 para la "adquisición de reactivos, materiales y equipo de laboratorio, mobiliario, herramientas y aire acondicionado para la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y "adquisición de materiales y equipo de cómputo para la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. <https://www.uaem.mx/difusion-y-medios/informacion-oficial/licitaciones/direccion-de-recursos-materiales-2022/>

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



F6: Se equipará el Salón 5, con silla y mesa binaria.



F7: Se equipará el Salón 6, con silla y mesa binaria.



F8: Se equipará el Salón 7, con silla y mesa binaria.

Dr. Gustavo Uruzza Beltrán
Rector

Dr. Avaro Zamudio Lara
Coordinador General de Planeación y Administración

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2022

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA



Mes reportado
Segundo Trimestre 2022
(Abril-Junio)
FECHA DE CORTE: 13/04/2022

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD 3 Nombre de la obra:

Equipamiento del Campus Oriente (Escuela de Estudios Superiores de Yecapixtla Subsede Tetela del Volcán)

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

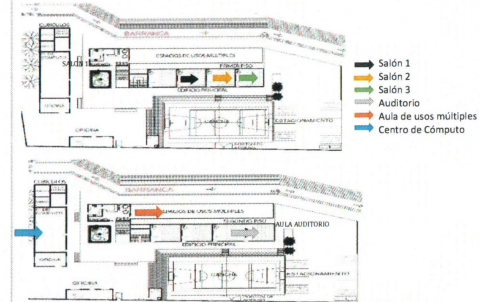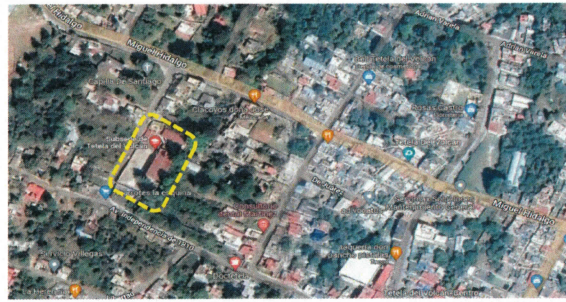

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Calle 24 de Febrero #7, Santiago C.P. 62800, Tétela del Volcán, Morelos.




Esporte de la universidad

Porcentaje de avance

0%

FOTOS (ANTES)

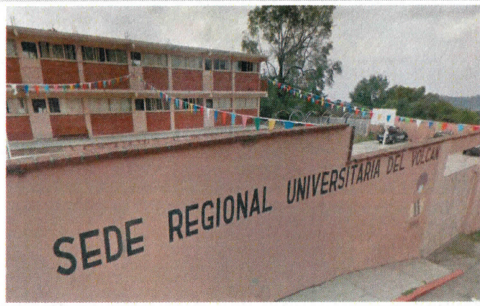

F1: Fachada Principal de la Escuela de Estudios Superiores de Yecapixtla Subsede Tetela del Volcán



F2: Se equipará el Salón 1, con pupitre.




F3: Se equipará el Salón 2, con pupitre.



F4: Se equipará el Salón 3, con pupitre.

Comentarios de los trabajos realizados:
Los días 17 y 22 de junio de 2022, se llevó a cabo el acto de presentación y apertura de proposiciones del Procedimiento de Licitación Pública Electrónica Nacional LP10/2022 y LP11/2022 para la "adquisición de reactivos, materiales y equipo de laboratorio, mobiliario, herramientas y aire acondicionado para la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y "adquisición de materiales y equipo de cómputo para la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. <https://www.uaem.mx/difusion-y-medios/informacion-oficial/licitaciones/direccion-de-recursos-materiales-2022/>

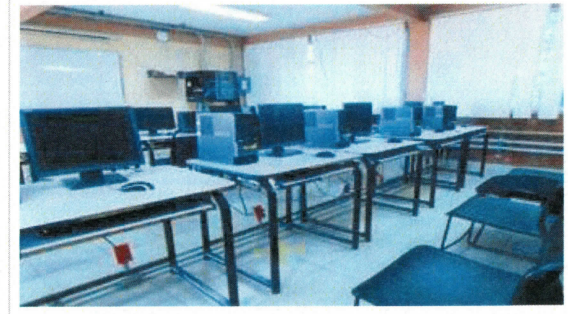

F5: Se equipará el Centro de Cómputo, con sillas y mesas binarias.

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



F5: Se equipará el Auditorio, planta alta edificio principal, con sillas.



F7: Se equipará el Espacio de usos múltiples, con sillas y mesas binarias.

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector

Dr. Alvaro Zamudio Lara
Coordinador General de Planeación y Administración

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2022

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Segundo Trimestre 2022
(Abril-Junio)
FECHA DE CORTE: 30/06/2022

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL


PRIORIDAD

3

Nombre de la obra:

Equipamiento del Campus Oriente (Escuela de Estudios Superiores de Atlatlahucan Subsede Totolapan)

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

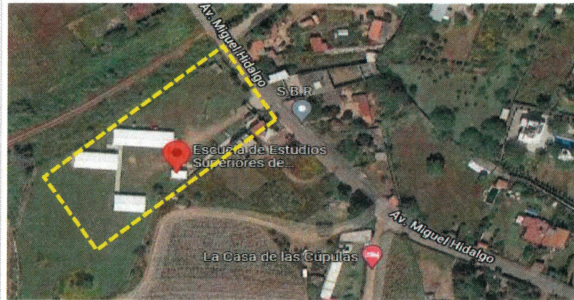

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Avenida Miguel Hidalgo S/N, Colonia Ahuatán, C.P. 62834
Totolapan Morelos.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Escuela de la universidad
Porcentaje de avance

0%

FOTOS (ANTES)



F1: Fachada Principal de la Escuela de Estudios Superiores de Atlatlahucan Subsede Totolapan



F2: Se equipará el Laboratorio de Quirófano, con locker.

Comentarios de los trabajos realizados:
Los días 17 y 22 de junio de 2022, se llevó a cabo el acto de presentación y apertura de proposiciones del Procedimiento de Licitación Pública Electrónica Nacional LP10/2022 y LP11/2022 para la "adquisición de reactivos, materiales y equipo de laboratorio, mobiliario, herramientas y aire acondicionado para la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y "adquisición de materiales y equipo de cómputo para la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. <https://www.uaem.mx/difusion-y-medios/informacion-licitaciones/direccion-de-recursos-materiales-2022/> .



F3: Se equipará el Laboratorio de Anatomía y Fisiología, con gabinete y locker.



F4: Se equipará el Laboratorio de Microbiología, con gabinete.




F5: Se equipará el Laboratorio de Evaluación del Estado Nutricional, con gabinete.

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



F6: Se equipará el Gineco Obstetricia, con gabinete.

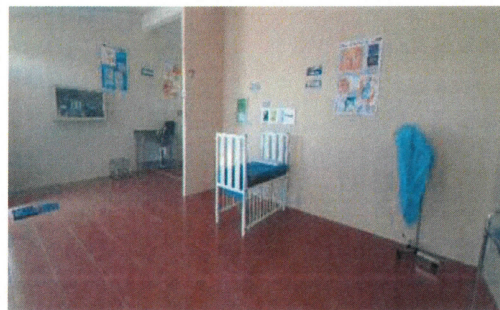

F7: Se equipará el Laboratorio de Pediatría, con gabinete.



F8: Se equipará el Auditorio, con proyector.

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector

Dr. Anvaro Zamudio Lara
Coordinador General de Planeación y Administración

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2022

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Segundo Trimestre 2022
(Abril-Junio)
FECHA DE CORTE: 30/06/2022

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

0%

PRECEDENCIA

4


Nombre de la obra:

Mantenimiento del Campus Norte (Edificio No. A70 Facultad de Psicología)

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



Mantenimiento al sistema de Impermeabilización existente del edificio No. A 70 (Facultad de Psicología).

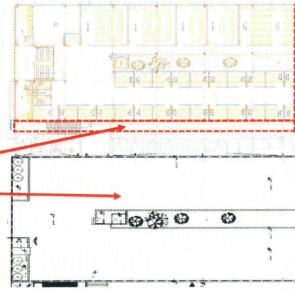

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca, Mor. C.P.62209. Cuernavaca Morelos.

FOTOS (ANTES)



F1: Fachada Principal, del Edificio No. A70 Facultad de Psicología



F2: Fachada lateral, del Edificio No. A70 Facultad de Psicología

Comentarios de los trabajos realizados:
VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.



F3: Mantenimiento al sistema de Impermeabilización existente del edificio No. A 70. Cubierta de azotea, fachada sur.



F4: Mantenimiento al sistema de Impermeabilización existente del edificio No. A 70. Cubierta de azotea, fachada suroeste del edificio.



F5: Mantenimiento al sistema de Impermeabilización existente del edificio No. A 70. Cubierta de azotea, fachada sur, del edificio.



F6: Mantenimiento al sistema de Impermeabilización existente del edificio No. A 70.
Impermeabilización de Muros Exteriores, Fachada Este.

A handwritten signature in blue ink, enclosed in a rectangular box. The signature is stylized and appears to be 'G. Urquiza'.

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector

A handwritten signature in blue ink, enclosed in a rectangular box. The signature is stylized and appears to be 'O. Lastra'.

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la **misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.**

2022

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Segundo Trimestre 2022
(Abril-Junio)
FECHA DE ORTE: 30/06/2022

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

0%


PRIORIDAD

4

Nombre de la obra:

Mantenimiento del Campus Norte (Centro de Investigación en Ciencias (CInC)).

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

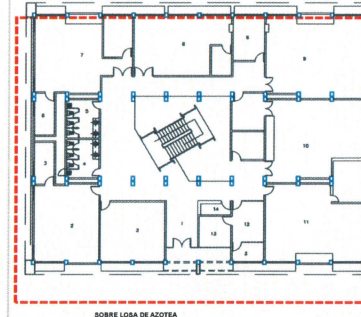

Mantenimiento de impermeabilizante en losa del edificio del Centro de Investigación en Ciencias (CInC).

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca, Mor. C.P.62209. Cuernavaca Morelos.

FOTOS (ANTES)



F1: Fachada Principal del Centro de Investigación en Ciencias.



F2: Fachada Lateral del Centro de Investigación en Ciencias.

Comentarios de los trabajos realizados:
VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.



F3: Mantenimiento de impermeabilización en losa del edificio del Centro de Investigación en Ciencias



F4: Mantenimiento de Impermeabilizante en losa del edificio del Centro de Investigación en Ciencias (CInC). Lado Sur del edificio.



F5: Mantenimiento de impermeabilizante en losa del edificio del Centro de Investigación en Ciencias (CInC). Lado Este del edificio.



F6: Mantenimiento de impermeabilizante en losa del edificio del Centro de Investigación en Ciencias (CInC). Lado Oeste del edificio.

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2022


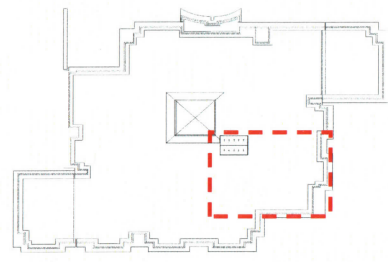
FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Segundo Trimestre 2022
(Abril-Junio)
FECHA DE CORTE: 30/06/2022

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

 <p>UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS</p>	<p>PRIORIDAD 4 Nombre de la obra: Mantenimiento del Campus Norte (Centro de Investigación en Ciencias (CIQ)).</p>	<p>CROQUIS DE LOCALIZACIÓN</p> 	<p>UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO</p>
<p>Porcentaje de avance</p> <p>0%</p>	 <p>Impermeabilización de cubierta, muros laterales, fachadas y base de caseta.</p>		<p>Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca, Mor. C.P.62209. Cuernavaca Morelos.</p>

FOTOS (ANTES)




F1: Fachada Principal del Centro de Investigación en Ciencias



F2: Fachada lateral del Centro de Investigación en Ciencias


Comentarios de los trabajos realizados:
VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.

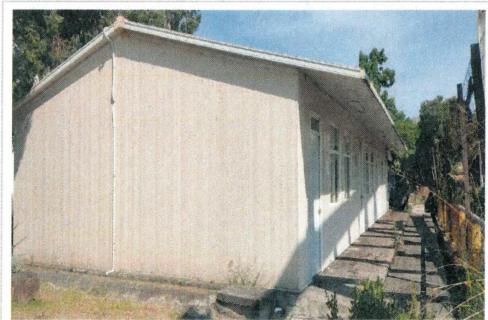


F3: Impermeabilización de cubierta, muros laterales, fachadas y base de caseta prefabricada a los salones y laboratorio de docencia del programa educativo de la Licenciatura en Diseño Molecular y Nanoquímica del Centro de Investigaciones Químicas (CIQ).



F4: Impermeabilización de cubierta, muros laterales, fachadas y base de caseta prefabricada a los salones y laboratorio de docencia del programa educativo de la Licenciatura en Diseño Molecular y Nanoquímica del Centro de Investigaciones Químicas (CIQ).

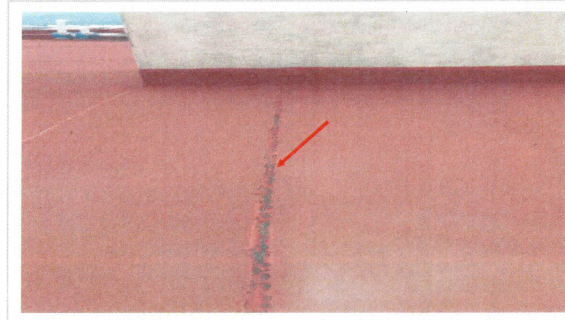

F5: Impermeabilización de cubierta, muros laterales, fachadas y base de caseta. Detalle de impermeabilización de Impermeabilizante, Fachada norte de caseta.

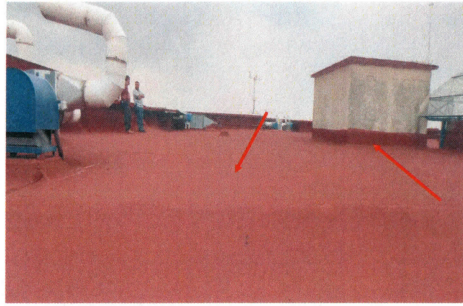

F6: Impermeabilización de cubierta, muros laterales, fachadas y base de caseta. Lado Oeste de edificio

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector



F7: Impermeabilización de cubierta, muros laterales, fachadas y base de caseta. Fachada sur del CIQ.

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2022

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Segundo Trimestre 2022
(Abril-Junio)
FECHA DE CORTE: 10/06/2022


REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD 5

Nombre de la obra:

Mantenimiento de la Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec subsede Axochiapan.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

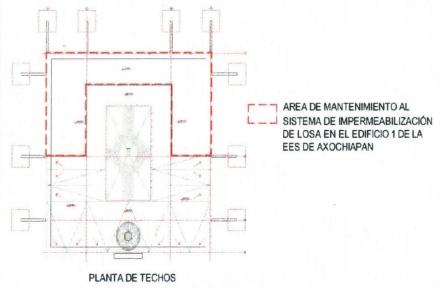

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Libramiento 10, El Papagayo, Axochiapan Morelos.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

0%

FOTOS (ANTES)




F1: Fachada Principal de la Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec subsede Axochiapan.



F2: Fachada Lateral de la Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec subsede Axochiapan.

Comentarios de los trabajos realizados:
VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.

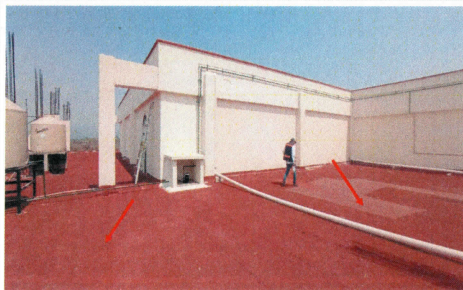

F3: Mantenimiento al sistema de impermeabilización de losa en el edificio 1 de Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec subsede Axochiapan. Cubierta de entrepiso, fachada sureste.



F4: Mantenimiento al sistema de impermeabilización de losa en el edificio 1 de Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec subsede Axochiapan. Cubierta de entrepiso, fachada suroeste.



F5: Mantenimiento al sistema de impermeabilización de losa en el edificio 1 de Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec subsede Axochiapan. Cubierta de entrepiso, detalle de sistema de coladera pluvial existente en fachada sur.

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.
