

ACUSE



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN



Cuernavaca, Morelos, 10 de abril del 2023

CGPyA/181/2023

SEP SEMS

RECIBIDO

10 ABR 2023

2:10

DIRECCIÓN DE
OPERACIÓN TÉCNICA

Recibir oficio original
con anexos y 1 cd.
Ultaan

ING. SERGIO ROMERO SERRANO
DIRECTOR DE OPERACIÓN TÉCNICA Y DE GESTIÓN
SUBSECRETARÍA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

PRESENTE

En el marco del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Nivel Medio Superior, en su componente FAM Regular adjunto al presente en versión impresa y electrónica (CD) los "Formatos de Seguimiento para Acciones de Infraestructura," así como la documentación respectiva correspondiente al primer trimestre (enero, febrero y marzo) 2023, como a continuación se enlistan:

- Formato de Seguimiento para Acciones de Infraestructura FAM 2014 Preparatoria No.5: "Construcción de módulos sanitarios de la Escuela Preparatoria No. 5, Puente de Ixtla".
- Formato de Seguimiento para Acciones de Infraestructura FAM 2015 Preparatoria No.1: "Construcción de módulos sanitarios y área de convivencia de la Escuela Preparatoria No. 1. Lic. Bernabé L. de Elías".
- Formato de Seguimiento para Acciones de Infraestructura FAM 2017 Escuela de Técnicos Laboratoristas: "Construcción de segunda etapa de laboratorio para la Escuela de Técnicos Laboratoristas de la UAEM".
- Formato de Seguimiento para Acciones de Infraestructura FAM 2018 Escuela Comunitaria de Tres Marías: "Construcción de dos aulas en estructura U-TC de 2 EE para la Preparatoria Comunitaria de Tres Marías".
- Formato de Seguimiento para Acciones de Infraestructura FAM 2019 Preparatoria No. 1 Lic. Bernabé L. De Elías "Equipamiento de Laboratorio y Rehabilitación de pisos en exterior", Preparatoria No. 3 Cuautla, Profr. Luis Ríos Alvarado: "Equipamiento de Laboratorios".




UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

- Formato de Seguimiento para Acciones de Infraestructura FAM 2021 Escuela Preparatoria No.2: **"Muro de Contención en Escuela Preparatoria No. 2"** y Escuela de Técnicos Laboratoristas: **Conclusión de laboratorio en la Escuela de Técnicos Laboratoristas.**
- Formato de Seguimiento para Acciones de Infraestructura FAM 2022 Escuela Preparatoria No. 1 Lic. Bernabé L. De Elías **"Reconstrucción y rehabilitación de cimentación, barda de colindancia y reforzamiento estructura"** y Escuela Preparatoria No.4 Jojutla: **"Reconstrucción y rehabilitación de áreas comunes de intercomunicación e instalación eléctrica en media tensión"**.
- Formato de Seguimiento para Acciones de Infraestructura FAM 2023 Escuela Preparatoria No. 2 "Prof. Antonio L. Mora del Castillo" **"Estabilización de talud"** y Escuela Preparatoria N. 6, Tlaltizapán **"Segunda etapa de la construcción de laboratorio"**.

Sin más por el momento y en espera de sus comentarios u observaciones, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
Por una humanidad culta
Una Universidad de excelencia



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN
INSTITUCIONAL
Rectoría 2017-2023


DR. ALVARO ZAMUDIO LARA

Titular de la Coordinación General de Planeación y Administración

C.c.p. Mtra. Nora Ruvalcaba Gámez. Subsecretaria de Educación Media Superior. Para su conocimiento
 Lic. Luis Arturo Cornejo Alatorre. Secretario de Educación Morelos. Mismo fin.
 Dr. Gustavo Urquiza Beltrán. Rector de la UAEM. Mismo fin.
 Ing. René Roberto Castañeda Gómez. Director General Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos. Mismo fin.
 Dr. Pedro Antonio Márquez Aguilar. Titular de la Dirección General de Planeación Institucional UAEM. Mismo fin.
 Arg. Oscar Lastra Fernández. Titular de la Dirección General de Infraestructura UAEM. Mismo fin.

Archivo
AZL/PAM/AJ/ANPM


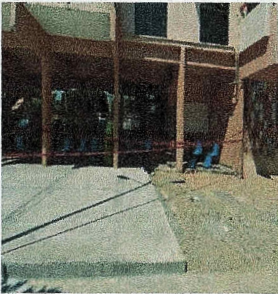



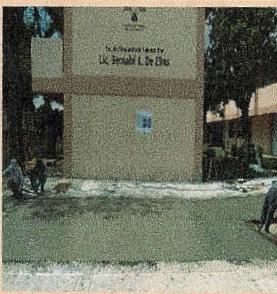





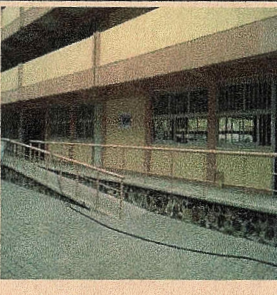
Av. Universidad 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca Morelos, México, 62209, 2° Piso Torre de Rectoría,
Tel. (777) 329 70 33, 329 70, 00, Ext. 7033 / azamudio@uaem.mx



Una universidad de excelencia

RECTORÍA
2017-2023

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2019 PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA
REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO Y SEÑALIZACIÓN

Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO				REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN	
						Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura
FAM Regular	Autónomo	Morelos	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Escuela Preparatoria No. 1 "Prof. Bernabé L. de Elías"	17UBH0016E	 Rehabilitación de piso de concreto (01/04/2020)	 Rehabilitación de piso de concreto (01/04/2020)	 Rehabilitación de piso de concreto (01/04/2020)	 Rehabilitación de piso de concreto (01/04/2020)	 Imagen del letrero de señalización (31/01/2020)	 Letrero de señalización colocado en sitio (31/01/2020)
	Autónomo	Morelos	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Preparatoria No. 3 de Cuautla "Prof. Luis Ríos Alvarado"	17UBH0017D	 Colocación de regadera de emergencia (01/04/2020)	 Colocación de lavaojos (01/04/2020)	 Instalaciones en mesas de laboratorio (08/04/2020)	 Instalaciones en mesas de laboratorios (08/04/2020)	 Imagen del letrero de señalización (31/01/2020)	 Letrero de señalización colocado en sitio (31/01/2020)

ACUSE



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN



Cuernavaca, Morelos, 10 de abril del 2023

CGPyA/181/2023

SEP SEMS

RECIBIDO

10 ABR 2023

2:10

DIRECCIÓN DE
OPERACIÓN TÉCNICA

Recibido en oficina original
con anexos y 1 cd.
Ultham

ING. SERGIO ROMERO SERRANO
DIRECTOR DE OPERACIÓN TÉCNICA Y DE GESTIÓN
SUBSECRETARÍA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

PRESENTE

En el marco del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Nivel Medio Superior, en su componente FAM Regular adjunto al presente en versión impresa y electrónica (CD) los "Formatos de Seguimiento para Acciones de Infraestructura," así como la documentación respectiva correspondiente al primer trimestre (enero, febrero y marzo) 2023, como a continuación se enlistan:

- Formato de Seguimiento para Acciones de Infraestructura FAM 2014 Preparatoria No.5: "Construcción de módulos sanitarios de la Escuela Preparatoria No. 5, Puente de Ixtla".
- Formato de Seguimiento para Acciones de Infraestructura FAM 2015 Preparatoria No.1: "Construcción de módulos sanitarios y área de convivencia de la Escuela Preparatoria No. 1. Lic. Bernabé L. de Elías".
- Formato de Seguimiento para Acciones de Infraestructura FAM 2017 Escuela de Técnicos Laboratoristas: "Construcción de segunda etapa de laboratorio para la Escuela de Técnicos Laboratoristas de la UAEM".
- Formato de Seguimiento para Acciones de Infraestructura FAM 2018 Escuela Comunitaria de Tres Marías: "Construcción de dos aulas en estructura U-TC de 2 EE para la Preparatoria Comunitaria de Tres Marías".
- Formato de Seguimiento para Acciones de Infraestructura FAM 2019 Preparatoria No. 1 Lic. Bernabé L. De Elías "Equipamiento de Laboratorio y Rehabilitación de pisos en exterior", Preparatoria No. 3 Cuautla, Profr. Luis Ríos Alvarado: "Equipamiento de Laboratorios".




UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

- Formato de Seguimiento para Acciones de Infraestructura FAM 2021 Escuela Preparatoria No.2: **"Muro de Contención en Escuela Preparatoria No. 2"** y Escuela de Técnicos Laboratoristas: **Conclusión de laboratorio en la Escuela de Técnicos Laboratoristas.**
- Formato de Seguimiento para Acciones de Infraestructura FAM 2022 Escuela Preparatoria No. 1 Lic. Bernabé L. De Elías **"Reconstrucción y rehabilitación de cimentación, barda de colindancia y reforzamiento estructura"** y Escuela Preparatoria No.4 Jojutla: **"Reconstrucción y rehabilitación de áreas comunes de intercomunicación e instalación eléctrica en media tensión"**.
- Formato de Seguimiento para Acciones de Infraestructura FAM 2023 Escuela Preparatoria No. 2 "Prof. Antonio L. Mora del Castillo" **"Estabilización de talud"** y Escuela Preparatoria N. 6, Tlaltizapán **"Segunda etapa de la construcción de laboratorio"**.

Sin más por el momento y en espera de sus comentarios u observaciones, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
Por una humanidad culta
Una Universidad de excelencia



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN
INSTITUCIONAL
Rectoría 2017-2023


DR. ALVARO ZAMUDIO LARA

Titular de la Coordinación General de Planeación y Administración

C.c.p. Mtra. Nora Ruvalcaba Gámez. Subsecretaria de Educación Media Superior. Para su conocimiento
 Lic. Luis Arturo Cornejo Alatorre. Secretario de Educación Morelos. Mismo fin.
 Dr. Gustavo Urquiza Beltrán. Rector de la UAEM. Mismo fin.
 Ing. René Roberto Castañeda Gómez. Director General Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos. Mismo fin.
 Dr. Pedro Antonio Márquez Aguilar. Titular de la Dirección General de Planeación Institucional UAEM. Mismo fin.
 Arg. Oscar Lastra Fernández. Titular de la Dirección General de Infraestructura UAEM. Mismo fin.

Archivo
AZL/PAMAJANPM

Av. Universidad 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca Morelos, México, 62209, 2° Piso Torre de Rectoría,
Tel. (777) 329 70 33, 329 70, 00, Ext. 7033 / azamudio@uaem.mx



Una universidad de excelencia

RECTORÍA
2017-2023

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2021 PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA
REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO Y SEÑALIZACIÓN

Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO				REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN	
						Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura
FAM Regular	Autónomo	Morelos	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Escuela Preparatoria N°2 "Prof. Antonio L. Mora del Castillo"	17UBH0001C	 Habilitado de cimbra de muro. (06/04/2022)	 Colado con concreto prefabricado de muro y zapata corrida. (14/04/2022)	 Aplicación de barrera de vapor sobre muro. (26/04/2022)	 Aplicación de barrera de vapor sobre muro. (26/04/2022)	 Imagen de letrero de señalización. (14/02/2022)	 Letrero de señalización colocado en sitio. (14/02/2022)
FAM Regular	Autónomo	Morelos	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Escuela de Técnicos Laboratoristas	17UCT0002W	 Colocación de piso de loseta. (11/04/2022)	 Aplicación de pintura vinílica en muros y plafón. (28/abril/2022)	 Colocación de adocreto en pasillo exterior y protecciones de herrería. (02/mayo/2022)	 Colocación de mesas de laboratorio, regadera de emergencia y extractores. (13/mayo/2022)	 Imagen de letrero de señalización. (14/02/2022)	 Letrero de señalización colocado en sitio. (14/02/2022)

ACUSE



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN



Cuernavaca, Morelos, 10 de abril del 2023

CGPyA/181/2023

SEP SEMS

RECIBIDO

10 ABR 2023

2:10

DIRECCIÓN DE
OPERACIÓN TÉCNICA

Recibido en oficina original
con anexos y 1 cd.
Ullyan

ING. SERGIO ROMERO SERRANO
DIRECTOR DE OPERACIÓN TÉCNICA Y DE GESTIÓN
SUBSECRETARÍA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

PRESENTE

En el marco del **Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Nivel Medio Superior**, en su componente **FAM Regular** adjunto al presente en versión impresa y electrónica (CD) los *“Formatos de Seguimiento para Acciones de Infraestructura,”* así como la documentación respectiva correspondiente al **primer trimestre** (enero, febrero y marzo) **2023**, como a continuación se enlistan:

- Formato de Seguimiento para Acciones de Infraestructura FAM 2014 Preparatoria No.5: **“Construcción de módulos sanitarios de la Escuela Preparatoria No. 5, Puente de Ixtla”**.
- Formato de Seguimiento para Acciones de Infraestructura FAM 2015 Preparatoria No.1: **“Construcción de módulos sanitarios y área de convivencia de la Escuela Preparatoria No. 1. Lic. Bernabé L. de Elías”**.
- Formato de Seguimiento para Acciones de Infraestructura FAM 2017 Escuela de Técnicos Laboratoristas: **“Construcción de segunda etapa de laboratorio para la Escuela de Técnicos Laboratoristas de la UAEM”**.
- Formato de Seguimiento para Acciones de Infraestructura FAM 2018 Escuela Comunitaria de Tres Marías: **“Construcción de dos aulas en estructura U-TC de 2 EE para la Preparatoria Comunitaria de Tres Marías”**.
- Formato de Seguimiento para Acciones de Infraestructura FAM 2019 Preparatoria No. 1 Lic. Bernabé L. De Elías **“Equipamiento de Laboratorio y Rehabilitación de pisos en exterior”**, Preparatoria No. 3 Cuautla, Profr. Luis Ríos Alvarado: **“Equipamiento de Laboratorios”**.




UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

- Formato de Seguimiento para Acciones de Infraestructura FAM 2021 Escuela Preparatoria No.2: **"Muro de Contención en Escuela Preparatoria No. 2"** y Escuela de Técnicos Laboratoristas: **Conclusión de laboratorio en la Escuela de Técnicos Laboratoristas.**
- Formato de Seguimiento para Acciones de Infraestructura FAM 2022 Escuela Preparatoria No. 1 Lic. Bernabé L. De Elías **"Reconstrucción y rehabilitación de cimentación, barda de colindancia y reforzamiento estructura"** y Escuela Preparatoria No.4 Jojutla: **"Reconstrucción y rehabilitación de áreas comunes de intercomunicación e instalación eléctrica en media tensión"**.
- Formato de Seguimiento para Acciones de Infraestructura FAM 2023 Escuela Preparatoria No. 2 "Prof. Antonio L. Mora del Castillo" **"Estabilización de talud"** y Escuela Preparatoria N. 6, Tlaltizapán **"Segunda etapa de la construcción de laboratorio"**.

Sin más por el momento y en espera de sus comentarios u observaciones, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
Por una humanidad culta
Una Universidad de excelencia



**DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN
INSTITUCIONAL**
Rectoría 2017-2023

DR. ALVARO ZAMUDIO LARA

Titular de la Coordinación General de Planeación y Administración

C.c.p. Mtra. Nora Ruvalcaba Gámez. Subsecretaria de Educación Media Superior. Para su conocimiento
 Lic. Luis Arturo Cornejo Alatorre. Secretario de Educación Morelos. Mismo fin.
 Dr. Gustavo Urquiza Beltrán. Rector de la UAEM. Mismo fin.
 Ing. René Roberto Castañeda Gómez. Director General Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos. Mismo fin.
 Dr. Pedro Antonio Márquez Aguilar. Titular de la Dirección General de Planeación Institucional UAEM. Mismo fin.
 Arg. Oscar Lastra Fernández. Titular de la Dirección General de Infraestructura UAEM. Mismo fin.

Archivo
AZL/PAMAJANPM

Av. Universidad 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca Morelos, México, 62209, 2° Piso Torre de Rectoría,
Tel. (777) 329 70 33, 329 70, 00, Ext. 7033 / azamudio@uaem.mx



Una universidad de excelencia

RECTORÍA
2017-2023

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2022 PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA


Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	Municipio	Localidad	Meta a realizar (Breve descripción de las acciones a realizar)	Observaciones	Construcción				Mantenimiento				Rehabilitación				Mobiliario y/o equipo				Monto Total	Fecha de inicio	Fecha de conclusión	Avance Físico (%)	Monto ejercido	Alumnos beneficiados	Empleos generados	Problemática atendida	Fecha de verificación	Señalización			
										Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo													
FAM Regular	Autónomo	Morelos	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Escuela Preparatoria No.1 "Profr. Bernabé L. de Elías"	17UBH0016E	Cuernavaca	Cuernavaca	Reconstrucción y Rehabilitación de Barda en la Escuela Preparatoria No.01, "Profr. Bernabé L. de Elías".	Trabajos de obra exterior y complementaria de colindancia y reforzamiento estructural.				x											\$ 807,974.00	08/07/2022	15/09/2022	100%	\$ 796,929.78	2,905		Brindar seguridad estructural a través de la rehabilitación y reconstrucción de barda de colindancia en Escuela Preparatoria No. 1 con el objetivo de ofrecer a los estudiantes; Instalaciones dignas y seguras.	04/08/2022	Se colocó letrero en sitio					
FAM Regular	Autónomo	Morelos	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Escuela Preparatoria No. 4, Jojutla	17UBH0018C	Jojutla	Jojutla de Juárez	Reconstrucción y Rehabilitación de Áreas Comunes e Instalación Eléctrica en Escuela Preparatoria No.4, "Jojutla".	Rehabilitación de obra exterior.				x											\$ 800,000.00	18/07/2022	05/01/2023	95%	SD	1,704		Tras las afectaciones ocasionadas por el sismo del 2017 a la infraestructura, se vuelve fundamental atender los espacios que necesitan rehabilitación y reconstrucción, con el fin de prevenir y dar seguridad a nuestros estudiantes inscritos.	12/09/2022	Se colocó letrero en sitio					
																							1,607,974.00															


Nota:


Nota 1: Al 31 de marzo de 2023 de la obra de "Reconstrucción y rehabilitación de barda" en la Preparatoria No. 1 se han concluido los trabajos, por lo que se anexa el "Acta de entrega-recepción" física y formal del contrato 2022-SE-INEIEM-FAMMEDIASUP2022-LP-007-OP.

Nota 2: De la obra denominada "Reconstrucción y rehabilitación de áreas comunes e instalación eléctrica en la Preparatoria No. 04, Jojutla de Juárez del Estado de Morelos", la Dirección de Desarrollo de Infraestructura se encuentra en espera de la entrega-recepción de la obra, así como de las actas de entrega-recepción para poder reflejar en el Formato para Seguimiento de Acciones de Infraestructura el monto ejercido.

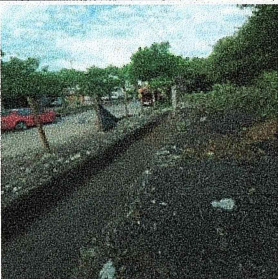
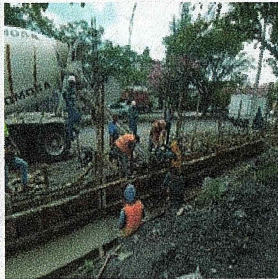
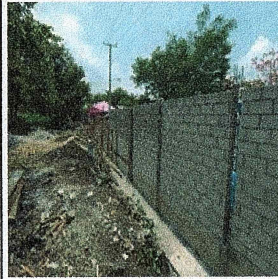
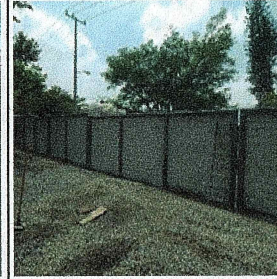

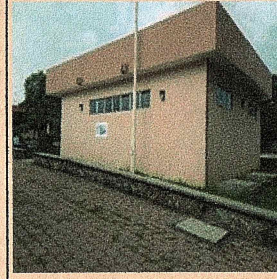
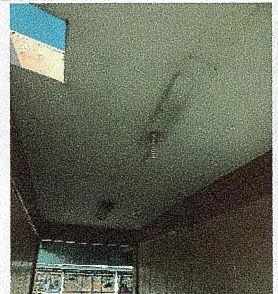

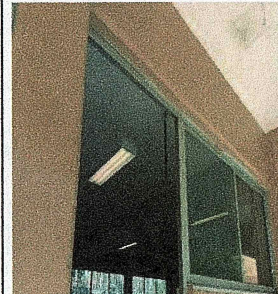
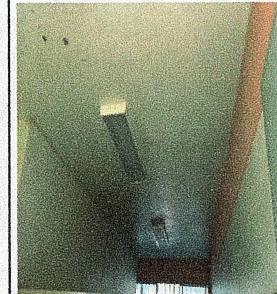
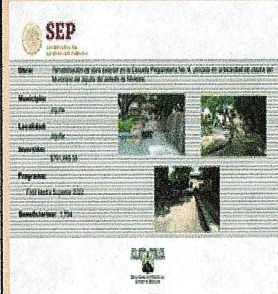
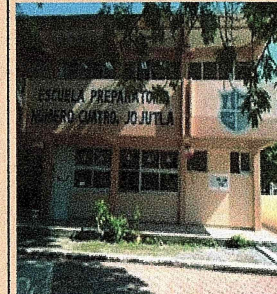
Nota 3: Es importante reiterar que los trabajos de obra son administrados por el Instituto de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM), la UAEM solo participa como área usuaria.

ELABORÓ

Arq. Guillermo Pérez Hernández Director de Desarrollo de Infraestructura

REVISÓ

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández Director General de Infraestructura

AUTORIZÓ

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán Rector UAEM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2022 PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA
REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO Y SEÑALIZACIÓN

Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO				REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN	
						Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura
FAM Regular	Autónomo	Morelos	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Escuela Preparatoria No.1 "Profr. Bernabé L. de Elías"	17UBH0016E	 Excavación de terreno y preparación (18/07/2022)	 Acero, cimbra y concreto de zapata corrida (08/08/2022)	 Construcción de muro de block pesado (31/08/2022)	 Conclusión de barda de block pesado (15/09/2022)	 Imagen del letrero 04/08/2022	 Letrero colocado en la Preparatoria No.1 04/08/2022
FAM Regular	Autónomo	Morelos	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Escuela Preparatoria No. 4, Jojutla	17UBH0018C	 Desmontaje de luminarias y focos existentes dañados (04/Enero/2023)	 Desmontaje de luminarias y focos existentes dañados (04/Enero/2023)	 Suministro y colocación de luminarias (05/Enero/2023)	 Suministro y colocación de luminarias (05/Enero/2023)	 Imagen del letrero 12/09/2022	 Letrero colocado en Preparatoria No. 4 12/09/2022

ACUSE



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN



Cuernavaca, Morelos, 10 de abril del 2023

CGPyA/181/2023

SEP SEMS

RECIBIDO

10 ABR 2023

2:10

DIRECCIÓN DE
OPERACIÓN TÉCNICA

Recibir oficio original
con anexos y 1 cd.
Ultaan

ING. SERGIO ROMERO SERRANO
DIRECTOR DE OPERACIÓN TÉCNICA Y DE GESTIÓN
SUBSECRETARÍA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

PRESENTE

En el marco del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Nivel Medio Superior, en su componente FAM Regular adjunto al presente en versión impresa y electrónica (CD) los "Formatos de Seguimiento para Acciones de Infraestructura," así como la documentación respectiva correspondiente al primer trimestre (enero, febrero y marzo) 2023, como a continuación se enlistan:

- Formato de Seguimiento para Acciones de Infraestructura FAM 2014 Preparatoria No.5: "Construcción de módulos sanitarios de la Escuela Preparatoria No. 5, Puente de Ixtla".
- Formato de Seguimiento para Acciones de Infraestructura FAM 2015 Preparatoria No.1: "Construcción de módulos sanitarios y área de convivencia de la Escuela Preparatoria No. 1. Lic. Bernabé L. de Elías".
- Formato de Seguimiento para Acciones de Infraestructura FAM 2017 Escuela de Técnicos Laboratoristas: "Construcción de segunda etapa de laboratorio para la Escuela de Técnicos Laboratoristas de la UAEM".
- Formato de Seguimiento para Acciones de Infraestructura FAM 2018 Escuela Comunitaria de Tres Marías: "Construcción de dos aulas en estructura U-TC de 2 EE para la Preparatoria Comunitaria de Tres Marías".
- Formato de Seguimiento para Acciones de Infraestructura FAM 2019 Preparatoria No. 1 Lic. Bernabé L. De Elías "Equipamiento de Laboratorio y Rehabilitación de pisos en exterior", Preparatoria No. 3 Cuautla, Profr. Luis Ríos Alvarado: "Equipamiento de Laboratorios".




UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

- Formato de Seguimiento para Acciones de Infraestructura FAM 2021 Escuela Preparatoria No.2: **"Muro de Contención en Escuela Preparatoria No. 2"** y Escuela de Técnicos Laboratoristas: **Conclusión de laboratorio en la Escuela de Técnicos Laboratoristas.**
- Formato de Seguimiento para Acciones de Infraestructura FAM 2022 Escuela Preparatoria No. 1 Lic. Bernabé L. De Elías **"Reconstrucción y rehabilitación de cimentación, barda de colindancia y reforzamiento estructura"** y Escuela Preparatoria No.4 Jojutla: **"Reconstrucción y rehabilitación de áreas comunes de intercomunicación e instalación eléctrica en media tensión"**.
- Formato de Seguimiento para Acciones de Infraestructura FAM 2023 Escuela Preparatoria No. 2 "Prof. Antonio L. Mora del Castillo" **"Estabilización de talud"** y Escuela Preparatoria N. 6, Tlaltizapán **"Segunda etapa de la construcción de laboratorio"**.

Sin más por el momento y en espera de sus comentarios u observaciones, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
Por una humanidad culta
Una Universidad de excelencia



DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN
INSTITUCIONAL
Rectoría 2017-2023


DR. ALVARO ZAMUDIO LARA

Titular de la Coordinación General de Planeación y Administración

C.c.p. Mtra. Nora Ruvalcaba Gámez. Subsecretaria de Educación Media Superior. Para su conocimiento
 Lic. Luis Arturo Cornejo Alatorre. Secretario de Educación Morelos. Mismo fin.
 Dr. Gustavo Urquiza Beltrán. Rector de la UAEM. Mismo fin.
 Ing. René Roberto Castañeda Gómez. Director General Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos. Mismo fin.
 Dr. Pedro Antonio Márquez Aguilar. Titular de la Dirección General de Planeación Institucional UAEM. Mismo fin.
 Arg. Oscar Lastra Fernández. Titular de la Dirección General de Infraestructura UAEM. Mismo fin.

Archivo
AZL/PAM/AJANPM



Av. Universidad 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca Morelos, México, 62209, 2° Piso Torre de Rectoría,
Tel. (777) 329 70 33, 329 70, 00, Ext. 7033 / azamudio@uaem.mx



Una universidad de excelencia

RECTORÍA
2017-2023

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2023 PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA
REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO Y SEÑALIZACIÓN**

Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO				REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN	
						Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura
FAM Regular	Autónomo	Morelos	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Escuela Preparatoria N°2 "Prof. Antonio L. Mora del Castillo"	17UBH0001C	 <p>Fachada principal de la Escuela Preparatoria N°2 "Prof. Antonio L. Mora del Castillo"</p>					
FAM Regular	Autónomo	Morelos	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Escuela Preparatoria N. 6, Tlaltizapan	17UCT0001X	 <p>Fachada principal de la Escuela Preparatoria N. 6, Tlaltizapan</p>					
