



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Cuernavaca Morelos a 08 de octubre de 2025
CGPyDS/1088/2025

Acuse

MTRA. CYNTHIA RUANO MÉNDEZ
DIRECTORA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL (DGESUI)

PRESENTE




RECIBIDO
HORA: 10:15
FOLIO: 505
OCT 13 2025

UAEM DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

En respuesta al atento oficio 511/2025-0575-34 mediante el cual se notificó el calendario para la elaboración y envío de los informes trimestrales de seguimiento administrativo de los proyectos apoyados con recursos del **Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) ejercicio fiscal 2025**, se adjunta en versión electrónica (USB), en formato Excel y PDF los informes correspondientes al **tercer trimestre** (julio, agosto y septiembre), debidamente firmados como a continuación se describe:

1. Reporte descriptivo del informe de avance trimestral.
2. Reporte fotográfico del informe de avance trimestral.



Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

UAEM



Atentamente
Por una humanidad culta

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE

DR. JUAN MANUEL RIVAS GONZÁLEZ

Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable



Recibi 1 USB.
Claudia Duenos

C.I.P Dr. Carlos Iván Moreno Arellano. Director General de Educación Superior Universitaria e Intercultural. Para conocimiento.
Dra. Viridiana Aydeé León Hernández. Rectora. UAEM. Mismo fin.
Dra. María del Carmen Torres Salazar. Directora General de Planeación y Desarrollo Sustentable. Mismo fin.
Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández. Director General de Infraestructura. UAEM. Mismo fin.
Archivo

JMRG/MCST/ANPM*eez

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS
Oficio
13 OCT 2025
RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

9:53 U.A.E.M.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"



Av. Universidad 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca Morelos, México, 62209, 2do. Piso Torre de Rectoría,
Tel. (777) 329 7033, 329 70, 00, Ext. 7033 o 4312 / cgpyds@uaem.mx

UAEM
RECTORÍA
2023-2029

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: Universidad Autónoma del Estado de Morelos
Entidad federativa: Morelos
Clave 911: 17MSU0017P

Nombre: Dr. Juan Manuel Rivas González
Cargo: Responsable del Proyecto
Teléfono: (777) 3 29 70 00 Ext. 7033 y 4312
Correo electrónico: egpyds@uaem.mx

Nombre: Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Cargo: Director General de Infraestructura
Teléfono: (777) 3 29 70 00 Ext. 3136
Correo electrónico: oscar.lastra@uaem.mx



DATOS DEL RAMIFICADO DEL PROYECTO

Proyecto	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto	Monto Recibido (\$)	CONTRATO Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA				REMANENTES		Especios Físicos/equipo/programa/estructurado			Observaciones	OBRAS CONCLUIDAS									
				No. del Contrato (1)	Fechas Programadas		Monto Contratado (B)	Contratista	Monto de Contratación (C) Diferencia entre recibo/cobro y Contrato (C-A-B)	(13) Ejecución (D) Monto	(14) Diferencia entre Monto Recibido y Monto ejecutado (E-I)	(15) Diferencia entre Monto cobrado y Monto ejecutado (E-I) (B-D)		Número del Depósito/registro	Cantidad	Monto Cuadrado (F)	(16) Actores que sustentan el proceso	(17) % de avance	FECHAS REALES (18) DOMINIO				
					Inicio	Termino													Inicio	Termino	Inicio	Termino	
Construcción de talleres multidisciplinarios básicos para la formación práctica de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería y construcción de barda de colindancia de la Escuela de Estudios Superiores de Atlatlahucan	x		\$ 5,700,000.00	01-15032-OS-2025	31/07/2025	01/12/2025	\$ 4,179,623.78	CARLOS RIVERA SALGADO	\$ 1,253,887.13														
							\$ 51,965.45		\$ 4,170,847.75	\$ 4,118,882.30													
				04-15032-OS-2025	31/07/2025	01/12/2025	\$ 1,468,410.77	SC CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS DEL SUR, S.A. DE C.V.	\$ 275,265.12														

En apego al anexo 3 del Convenio para la Transferencia y Ejecución de Recursos con la Secretaría de Educación y la Secretaría de Hacienda en su componente de Infraestructura Educativa de Nivel Superior, a través de las ministraciones de enero-agosto la institución recibió la cantidad de \$14,881,946.56 (catorce millones ochocientos ochenta y un mil novecientos cuarenta y seis pesos 56/100 M.N), los cuales se distribuyen como a continuación se describe:

1. P-1 Construcción de talleres multidisciplinarios básicos para la formación práctica de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería y construcción de barda de colindancia de la Escuela de Estudios Superiores de Atlatlahucan.

En el trimestre reportado se recibió la cantidad de \$3,800,000.00 (tres millones ochocientos mil pesos 00/100 M.N.). Como parte de las acciones realizadas, se adjudicaron los trabajos al contratista C. Carlos Rivera Salgado mediante contrato 01-15032-OS correspondiente a la construcción de talleres multidisciplinarios básicos para la formación práctica de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería, realizando trabajos preliminares como: desmontaje de elementos existentes, delimitación de área de trabajo, limpieza y acarreo del material retirado, cortes y reubicación de elementos arbóreos, demoliciones por medios mecánicos de muros y firmes de concreto.

Para la obra denominada "Construcción de barda de colindancia de la Escuela de Estudios Superiores de Atlatlahucan" se adjudicó con la persona moral SC Construcciones y Estructuras del Sur, S.A de C.V. mediante contrato 04-15032-OS-2025, realizando los trabajos de delimitación de área de trabajo, limpieza, trazo, nivelación de áreas, tala y poda de elementos arbóreos, trabajos de excavación, elaboración de plantillas de concreto, elaboración de cimientos de mampostería, suministro y colocación de acero de refuerzo en la estructura del muro, suministro y colocación de concreto, cimbra aparente y elaboración de muros de tabique de barro rojo recocido.

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: Universidad Autónoma del Estado de Morelos
Entidad federativa: Morelos
Clave 911: 17MSU0017P


Nombre: Dr. Juan Manuel Rivas González
Cargo: Responsable del Proyecto.
Teléfono: (777) 3 29 70 00 Ext. 7033 y 4312
Correo electrónico: cppyds@uaem.mx

Nombre: Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Cargo: Director General de Infraestructura
Teléfono: (777) 3 29 70 00 Ext. 3136
Correo electrónico: oscar.lastra@uaem.mx

Nombre del Proyecto		Clave del Proyecto		Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Monto		Monto Ejecutado		Monto Ejecutado		Monto Ejecutado		Monto Ejecutado		Monto Ejecutado	
Adecuaciones y mejoras en las fachadas y columnas del Centro de Investigaciones Químicas	x	\$ 2,900,000.00	02-15032-OS-2025	31/07/2025	01/12/2025	\$ 2,818,732.87	GREGORIO ALEXANDER BUSTOS GARCIA	\$ 81,267.13	\$ 118,202.78	\$ 2,781,797.22	\$2,700,530.09	28.00	816.50	1.- trabajos preliminares consistentes en delimitación del área de trabajo con tapial de madera, trazo y nivelación de la superficie a trabajar, desmantelamiento de estructura metálica, demoliciones, retiros de elementos a causa de la demolición y retiro de elementos de cristal como el vitrobloc y módulos de cristales templados	38.64%	31/07/25	2.- P-2 Adecuaciones y mejoras en las fachadas y columnas del Centro de Investigaciones Químicas, para este proyecto se recibió la cantidad de \$1,933,333.32 (un millón novecientos treinta y tres mil trescientos treinta y tres pesos 32/100 M.N) y se adjudicó la obra al C. Gregorio Alexander Bustos García mediante el contrato 02-15032-OS-2025; presentando avances en trabajos de: delimitación de área de trabajo, trabajos de desmontajes y retiro de piezas de vidrio y vitrobloc, trabajos de demolición de aplanado, liberación de capas de corrosión sobre perfiles metálicos, desmontaje y desmantelamiento de estructuras, trabajos de limpieza, retiro de elementos de los trabajos realizados, suministro y colocación de pintura de esmalte en estructura, muros y columnas.		
														2.- Aplicación de Pintura esmalte en estructura, muros y columnas					

REPORTES DESCRIPTIVO DEL INGRESO DE AVANCE TRIMESTRAL
DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: Universidad Autónoma del Estado de Morelos	Nombre de Área:
Entidad federativa: Morelos	
Clave 911: 17MSU0017P	



Nombre: Dr. Juan Manuel Rivas González
Cargo: Responsable del Proyecto.
Teléfono: (777) 3 29 70 00 Ext. 7033 y 4312
Correo electrónico: cgyds@uaem.mx

Nombre: Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Cargo: Director General de Infraestructura
Teléfono: (777) 3 29 70 00 Ext. 3136
Correo electrónico: oscar.lastra@uaem.mx

Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Proveedor	Fecha de Entrega	Fecha de Pago	Valor Pagado	Saldo	Observaciones
Aire acondicionado	9								0%
Anaqueles	9								0%
Archivero Tam-Mex	1								0%
Balanza de precisión	2								0%
Bancos madera y metálicos	81								0%
Butaca silla paleta	31								0%
Butaca auditorio	90								0%
Caballete de madera	18								0%
Centrifuga clínica	3								0%
Columna de destilación	1								0%
Computadoras	32								0%
Congeladores horizontales	2								0%
Empacadora alto vacío	1								0%
Equipo de manufactura tridimensional	3								0%
Equipo de termoformado	1								0%
Escritorios	17								0%
Espectrofotómetro	2								0%
Estante sencillo	7								0%
Estructura en aluminio anodizado	1								0%
Gabinete de acero	1								0%
Horno para pan	1								0%
Incubadora	2								0%
Sensor de fuerza	2								0%
Lector de microplacas	1								0%
Lentes de realidad virtual	2								0%
Librero	5								0%
Licudadora industrial	1								0%
Lockers	3								0%
Maniqui CPR	5								0%
Medidor de PH y MV	2								0%
Mesas salón y oc	3								0%
Mesa de exploración	1								0%
Mesa de trabajo	28								0%
Mesa rectangular	26								0%
Microscopios	12								0%
Monitor para CPU	35								0%
Mueble cajonera medicamentos	2								0%
Pantalla de proyección	12								0%
Pizarrones	2								0%
Plataforma de contacto	2								0%
Probador de suelos	2								0%
Vídeo proyector	9								0%
Router CNC	1								0%
Sillas	23								0%
Simulador de parto	2								0%
Sistema de iluminación	1								0%
Sistema de sonido empujable	1								0%
Termoblock (baño seco)	1								0%
Tsensors sistema integral para el registro y medición de variables del desempeño humano	1								0%
Wimu	1								0%
Pantallas inteligentes led y de plasma	4								0%

Adquirir el equipamiento necesario en los espacios académicos de los Campus Norte y Campus Oriente

x \$ 4,972,919.92 LP15/2025 16/06/2025 31/12/2025

\$ 3,185,468.35 \$ - \$ 4,972,919.92 \$ 1,787,451.57

4. P-4 Adquirir el equipamiento necesario en los espacios académicos de los Campus Norte y Campus Oriente. se recibió la cantidad de \$3,281,946.60 (tres millones doscientos ochenta y un mil novecientos cuarenta y seis pesos 60/100 M.N.), en cuanto a los avances físicos se reporta que la institución se encuentra en los procesos de adjudicación y entrega de los bienes, la información puede ser consultada en la página electrónica de la UAEM <https://www.uaem.mx/difusion-y-medios/informacion-oficial/licitaciones/direccion-de-recursos-materiales-2025/> Como parte de las gestiones realizadas para el uso eficiente del recurso y en atención a las necesidades de la institución, mediante oficio CGPyDS/788/2025 se solicitó el aval académico para el uso de los rendimientos financieros en el presente proyecto. En este contexto y mediante oficio 511/2025-3044 de la Dirección de Fortalecimiento Institucional autoriza el aval académico para utilizar los rendimientos financieros para la adquisición de 4 pantallas inteligentes led o plasma, es así que en el presente reporte se considera esta ampliación con los rendimientos financieros.

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL



Nombre: Universidad Autónoma del Estado de Morelos
Entidad federativa: Morelos
Clave 911: 17MSU0017P

Nombre: Dr. Juan Manuel Rivas González
Cargo: Responsable del Proyecto
Teléfono: (777) 3 29 70 00 Ext. 7033 y 4312
Correo electrónico: cgyyds@uaem.mx

Nombre: Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Cargo: Director General de Infraestructura
Teléfono: (777) 3 29 70 00 Ext. 3136
Correo electrónico: oscar.lastra@uaem.mx

Table with columns for project details, dates, and financial data. Includes a detailed description of the wastewater treatment plant construction project.

Construcción de la planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Escuela de Estudios Superiores del Jicarero

5. P-5 Construcción de la planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Escuela de Estudios Superiores del Jicarero, se adjudicó mediante el contrato 10-15032-OS-2025 con la persona moral Corporativo Ambiental Spartan S.A. de C.V. y se esta por iniciar los trabajos preliminares de delimitación y limpieza del área de trabajo. Como parte de las gestiones realizadas para el uso eficiente del recurso y en atención a las necesidades de la institución, mediante oficio CGPyDS/788/2025 se solicitó el aval académico para el uso de los rendimientos financieros en el presente proyecto. En este contexto y mediante oficio 511/2025-3044 la Dirección de Fortalecimiento Institucional autoriza el aval académico para utilizar los rendimientos financieros para la construcción de 75m2 de campo de oxidación y trabajos de instalación eléctrica, es así que en el presente reporte se considera esta ampliación con los rendimientos financieros. Actualmente la institución se encuentra en la gestión con Gobierno del Estados para la ministración de los rendimientos financieros.

\$22,570,275.18

\$3,644,197.20 \$1,647,355.03 \$20,922,920.15 \$17,278,722.95

12,785.20

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

Dra. Viridiana Aydes León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Dr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Tercer Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 30/09/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

6.97%




Nombre de la obra:

Construcción de talleres multidisciplinarios básicos para la formación práctica de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería y construcción de barda de colindancia de la Escuela de Estudios Superiores de Atlatlahucan (FCQel)

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

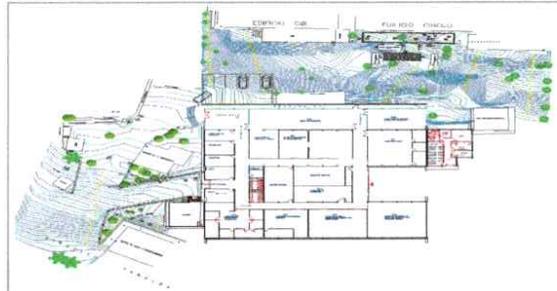


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal: Av. Universidad #1001, Col. Chamilpa, C.P. 62209, Cuernavaca, Morelos.

ANTES

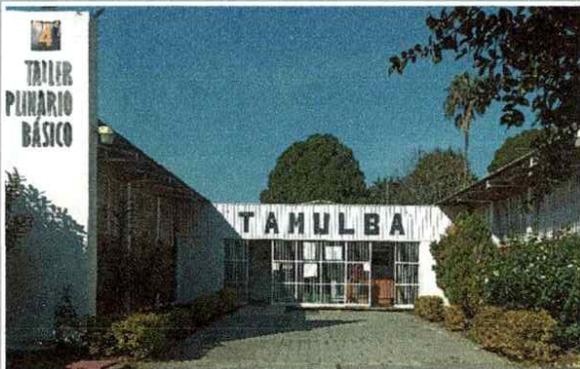

Fachada del Taller Multidisciplinario Básico (Tamulba) de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería



Vistas del sitio donde se realizarán trabajos: Preliminares que incluyen demolición, retiro de escombros, entre otros; para la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería (TAMULBA).

Observaciones:

Lo presentado en el Reporte Fotográfico del Tercer trimestre, corresponde a los espacios a intervenir mediante el fondo.

VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Tercer Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 30/09/2025

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

6.97%

PRIORIDAD

1

Nombre de la obra:

Construcción de talleres multidisciplinarios básicos para la formación práctica de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería y construcción de barda de colindancia de la Escuela de Estudios Superiores de Atlatlahucan (FCQeI)

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS




Dirección Postal: Av. Universidad #1001, Col. Chamilpa, C.P. 62209, Cuernavaca, Morelos.



Vistas del sitio donde se realizaran trabajos: Preliminares y Albañilerías (trazo, excavación, construcciones de concreto (zapatas, corridas, firmes, canal, etc.), muro de mamposteado de piedra y muros divisorios de panel prefabricado) , Acabados con pintura vinilica, entre otros; para la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería (TAMULBA).



Vistas del sitio donde se realizaran trabajos: Preliminares y Albañilerías (trazo, excavación, construcciones de concreto (zapatas, corridas, firmes, canal, etc.), muro de mamposteado de piedra y muros divisorios de panel prefabricado) , Acabados con pintura vinilica, entre otros; para la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería (TAMULBA).

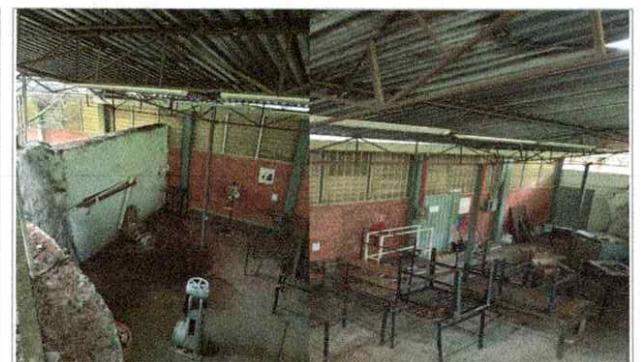

Vistas del sitio donde se realizaran trabajos: Instalacion de techumbre, canalones metálicos, columnas y estructuras metálicas, Así como instalaciones (eléctricas, voz y datos, pluvial) , Se instalara (canceleria de aluminio, protecciones, puertas, luminarias, señaléticas, etc.), para la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería (TAMULBA).

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Tercer Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 30/09/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

6.97%

PRIMORDIAL

1

Nombre de la obra:

Construcción de talleres multidisciplinarios básicos para la formación práctica de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería y construcción de barda de colindancia de la Escuela de Estudios Superiores de Atlatlahucan (FCQel)

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO




UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal: Av. Universidad #1001, Col. Chamilpa, C.P. 62209, Cuernavaca, Morelos.

DURANTE

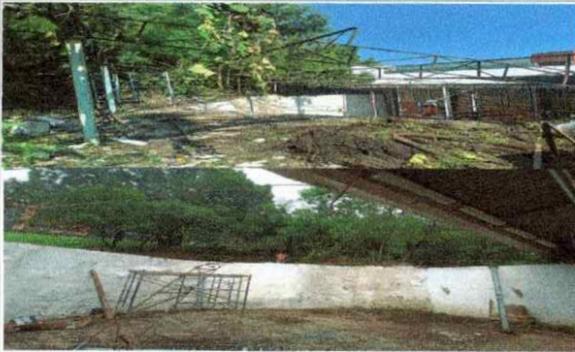

Trabajos de, Desmontaje y retiros de lámina galvanizada, Estructura Metálica existente, Luminarias existentes, Malla ciclónica, retiro de Barandal metálico (Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería).



Trabajos de, Suministro y colocacion de Malla delimitadora Naranja (Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería).



Trabajos de, Retiro de adocreto y Demolición de empedrado, en la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería.

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD

1 Nombre de la obra:

Construcción de talleres multidisciplinarios básicos para la formación práctica de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería y construcción de barda de colindancia de la Escuela de Estudios Superiores de Atlalahucan (FCQel)



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

6.97%

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal: Av. Universidad #1001, Col. Chamilpa, C.P. 62209, Cuernavaca, Morelos.




Trabajos de acarrees en camión de material retirado y desmontado (Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería)



Trabajos de demolición por medios mecánicos de muro de mampostería, en la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería.



Trabajos de reubicación de elemento arbóreo (Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería)

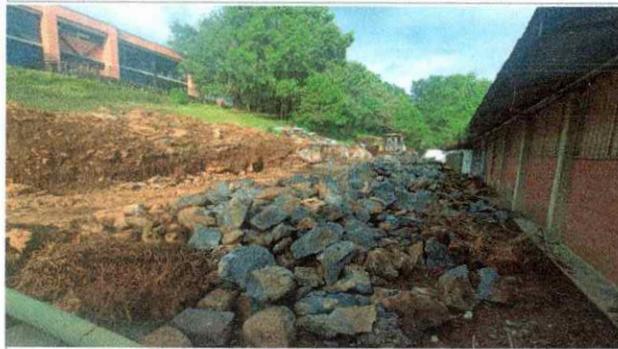

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Tercer Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 30/09/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

6.97%

PRIGRIDAD

1

Nombre de la obra:

Construcción de talleres multidisciplinarios básicos para la formación práctica de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería y construcción de barda de colindancia de la Escuela de Estudios Superiores de Atlalahucan (FCQeI)

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal: Av. Universidad #1001, Col. Chamilpa, C.P. 62209, Cuernavaca, Morelos.

Trabajos de demolición de empedrado en la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería.

Trabajos de demolición de empedrado en la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería.

Trabajos de demolición por medios mecánicos de firme de concreto, en la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería.

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

Dra. Viridiana Aydes León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Dr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

NOTA:

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Tercer Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 30/09/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

91.11%

PRIORIDAD

1


Nombre de la obra:

Construcción de talleres multidisciplinarios básicos para la formación práctica de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería y construcción de barda de colindancia de la Escuela de Estudios Superiores de Atlatlahucan (EES Atlatlahucan)


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

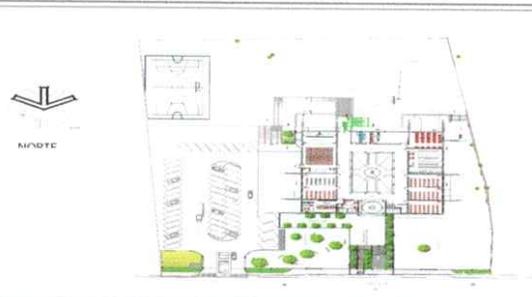

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

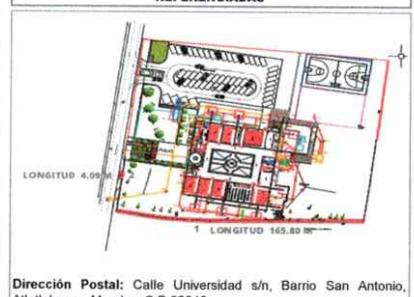


Dirección Postal: Calle Universidad s/n, Barrio San Antonio, Atlatlahucan, Morelos. C.P 62840.

ANTES



Fachada de la Escuela de Estudios Superiores de Atlatlahucan

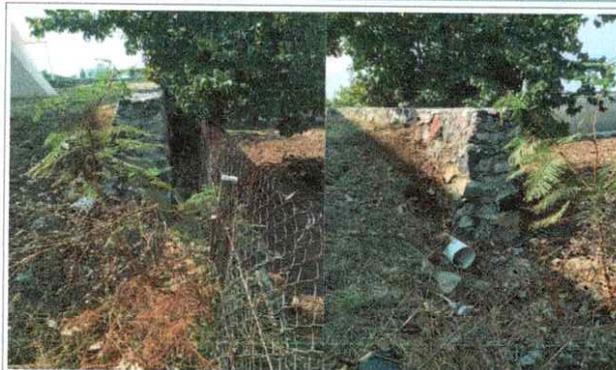

Vistas en donde se realizaran trabajos: Preliminares que incluyen limpieza, retiro de escombros, entre otros; para la Escuela de Estudios Superiores de Atlatlahucan.

Observaciones :

Lo presentado en el Reporte Fotográfico del Tercer trimestre, corresponde a los espacios a intervenir mediante el fondo.

VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Tercer Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 30/09/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

91.11%




Nombre de la obra:

Construcción de talleres multidisciplinarios básicos para la formación práctica de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería y construcción de barda de colindancia de la Escuela de Estudios Superiores de Atlatlahucan (EES Atlatlahucan)


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

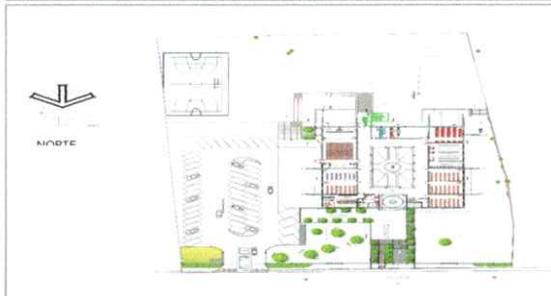

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal: Calle Universidad s/n, Barrio San Antonio, Atlatlahucan, Morelos, C.P 62840.



Vistas en donde se realizaron trabajos: Preliminares que incluyen limpieza, retiro de escombros, entre otros; para la Escuela de Estudios Superiores de Atlatlahucan.



Vistas en donde se realizaron los trabajos: Albañilería consistentes en trazo, excavación, mampostería, construcciones de concreto (plantillas, castillos, etc.), acabados con pintura vinílica entre otros; para la Escuela de Estudios Superiores de Atlatlahucan.



Vista en donde se realizaron trabajos de: Elaboración y colocación de reja de herrería con placas de acero y perfiles OC, OR con primer y pintura de esmalte, así como los trabajos de albañilería complementarios para la Escuela de Estudios Superiores de Atlatlahucan.

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Tercer Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 30/09/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

91.11%

PRIORIDAD

1

Nombre de la obra:

Construcción de talleres multidisciplinarios básicos para la formación práctica de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería y construcción de barda de colindancia de la Escuela de Estudios Superiores de Atlatlahucan (EES Atlatlahucan)


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

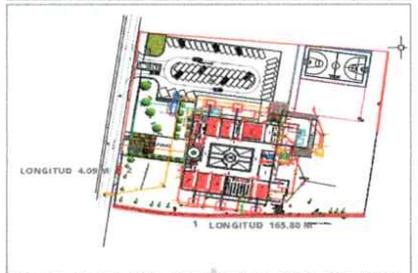

Dirección Postal: Calle Universidad s/n, Barrio San Antonio, Atlatlahucan, Morelos, C.P 62840.

Durante



Trabajos de, Suministro y colocación de Malla delimitadora Naranja, en la, (Escuela de Estudios Superior de Atlatlahucan).



Trabajos de, Limpieza, Trazo y Nivelación por medios mecánicos del área del terreno en la, (Escuela de Estudios Superior de Atlatlahucan).



Trabajos de, Tala y Poda de elementos arbóreos en la, (Escuela de Estudios Superior de Atlatlahucan).

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCUTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Tercer Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 30/09/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

91.11%

PRIORIDAD

1

Nombre de la obra:

Construcción de talleres multidisciplinarios básicos para la formación práctica de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería y construcción de barda de colindancia de la Escuela de Estudios Superiores de Atlatlahucan (EES Atlatlahucan)


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal: Calle Universidad s/n, Barrio San Antonio, Atlatlahucan, Morelos. C.P 62840.



Trabajos de excavación por medios mecánicos de material tipo I-II y cepa en material tipo II en la, (Escuela de Estudios Superior de Atlatlahucan).



Trabajos de afine, nivelación y compactación del fondo de cepas con placa vibratoria, así como hechura de plantilla de concreto y elaboración de muro de mampostería, (Escuela de Estudios Superior de Atlatlahucan).



Trabajos de suministro, armado y colocación de acero de refuerzo en la Escuela de Estudios Superior de Atlatlahucan.

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Tercer Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 30/09/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

91.11%

PRIORIDAD

1


Nombre de la obra:

Construcción de talleres multidisciplinarios básicos para la formación práctica de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería y construcción de barda de colindancia de la Escuela de Estudios Superiores de Atlatlahucan (EES Atlatlahucan)

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

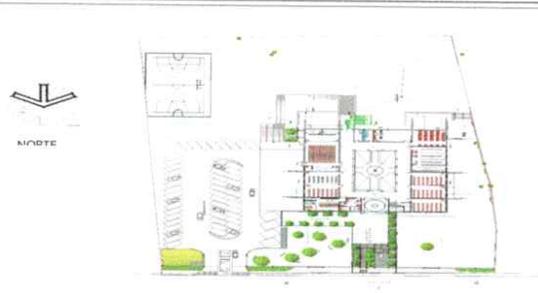


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal: Calle Universidad s/n, Barrio San Antonio, Atlatlahucan, Morelos. C.P 62840.



Trabajos de suministro y colocación de cimbra aparente para encofrado de elementos (cadenas, castillos), en la Escuela de Estudios Superior de Atlatlahucan).

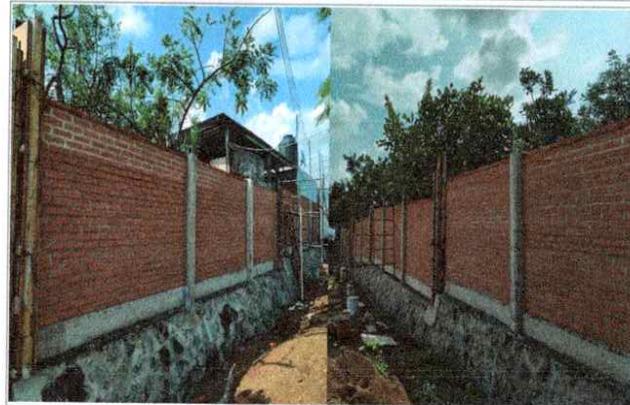

Trabajos de elaboración de muro de tabique de barro rojo recocido en la Escuela de Estudios Superior de Atlatlahucan).



Trabajos de elaboración de muro de tabique de barro rojo recocido en la Escuela de Estudios Superior de Atlatlahucan).

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Tercer Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 30/09/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

91.11%

PRIORIDAD
1


Nombre de la obra:

Construcción de talleres multidisciplinarios básicos para la formación práctica de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería y construcción de barda de colindancia de la Escuela de Estudios Superiores de Atlatlahucan (EES Atlatlahucan)


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

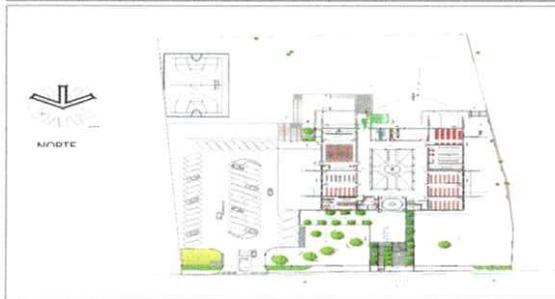

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

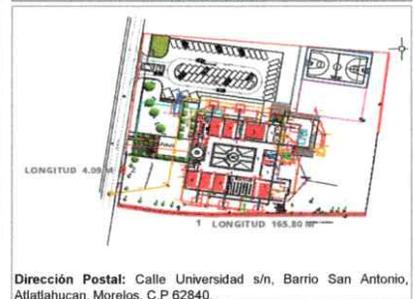

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

Dra. Viridiana Aydeé León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Dr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

NOTA:

Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Tercer Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 30/09/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD

2 Nombre de la obra: Adecuaciones y mejoras en las fachadas y columnas del Centro de Investigaciones Químicas



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS


Porcentaje de avance

38.64%


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

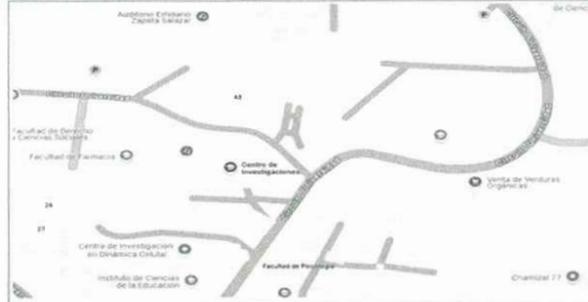

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

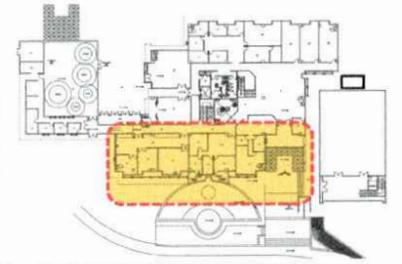

Dirección Postal: Av. Universidad #1001, Col. Chamilpa, C.P. 62209, Cuernavaca, Morelos.

ANTES



Adecuaciones y mejoras en las fachadas y columnas del Centro de Investigaciones Químicas



Vista del sitio donde se realizaran los trabajos de : Preliminares (delimitación del área, trazo, nivelación de la superficie, Así como el desmantelamiento de estructura metálica, demoliciones, retiros), para el Centro de Investigaciones Químicas (CIQ).

Observaciones :

Lo presentado en el Reporte Fotográfico del Tercer trimestre, corresponde a los espacios a intervenir mediante el fondo.

VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Tercer Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 30/09/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD

2 Nombre de la obra: Adecuaciones y mejoras en las fachadas y columnas del Centro de Investigaciones Químicas



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

38.64%


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

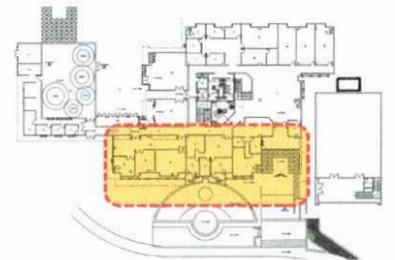

Dirección Postal: Av. Universidad #1001, Col. Chamilpa, C.P. 62209, Cuernavaca, Morelos.



Vista donde se realizaran los trabajos de: Colocacion de estructura en fachada, (celosia de lámina de acero y/o louver) Así como a la estructura nueva se sometera a tratamiento , en muros de acabado aparente o común se aplicara pintura vinilica , para el Centro de Investigaciones Químicas (CIQ).



Vista del sitio donde se realizaran los trabajos de: Retiro, reubicación y colocación de instalaciones eléctricas y equipos de aire acondicionado, Así como limpieza fina de obra para su entrega, en el Centro de Investigaciones Químicas (CIQ).

2025

FAM

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Tercer Trimestre
2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

Fecha de elaboración: 30/09/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD

2 Nombre de la obra: Adecuaciones y mejoras en las fachadas y columnas del Centro de Investigaciones Químicas



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS


Porcentaje de avance

38.64%


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

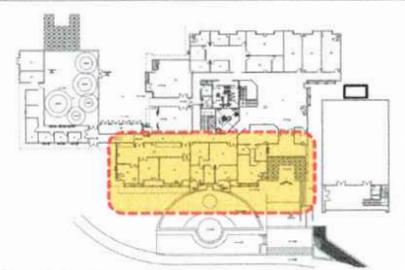

Dirección Postal: Av. Universidad #1001, Col. Chamilpa, C.P. 62209, Cuernavaca, Morelos.


Durante



Trabajos de delimitación del área de trabajo con tapial de triplay de pino y malla plástica color naranja, así como la protección de piso con tarimas de madera, en el Centro de Investigaciones Químicas.



Trabajos de desmontajes y retiro de piezas de vidrio - vidrio vitrobloc y desmantelamiento de fachada Integral (cristal - vidrio templado) con recuperación, en el Centro de Investigaciones Químicas.

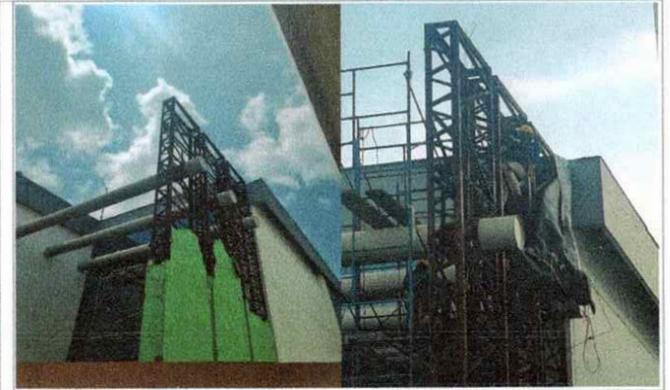

Trabajos de demolición de aplanado de 2.5 cm existente, y retiro y/o liberación de capas de corrosión sobre perfiles metálicos, en el Centro de Investigaciones Químicas.

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Tercer Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 30/09/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD

2

Nombre de la obra: Adecuaciones y mejoras en las fachadas y columnas del Centro de Investigaciones Químicas



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS


Porcentaje de avance

38.64%


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

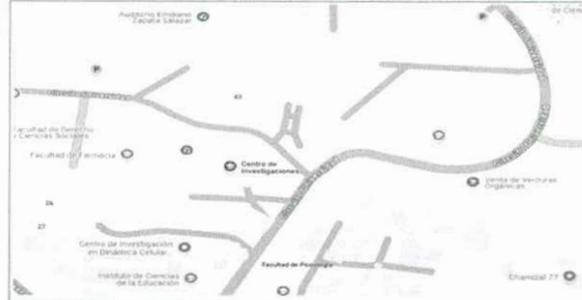


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

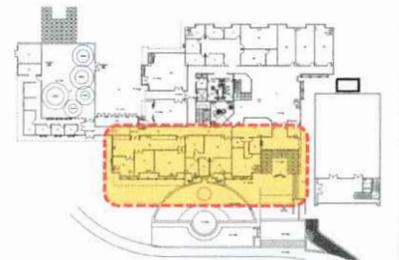

Dirección Postal: Av. Universidad #1001, Col. Chamilpa, C.P. 62209, Cuernavaca, Morelos.



Trabajos de desmontaje y desmantelamiento de estructura tipo tridilosa, en el Centro de Investigaciones Químicas.

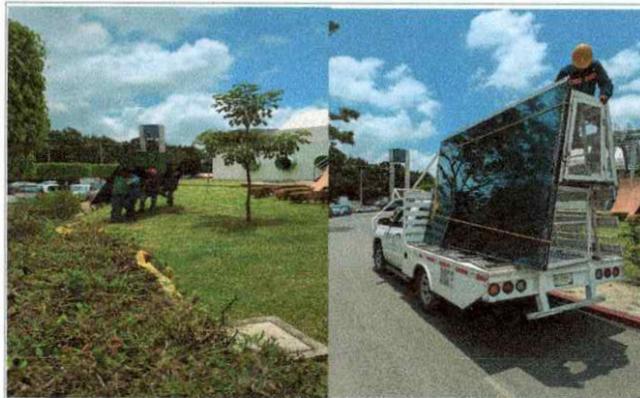

Trabajos de traslados de elementos retirados carga manual y acarreo producto de los trabajos realizados.



Trabajos de retiro de capas de corrosión sobre perfiles metálicos, en el Centro de Investigaciones Químicas (CIQ).

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Tercer Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 30/09/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD

2 Nombre de la obra: Adecuaciones y mejoras en las fachadas y columnas del Centro de Investigaciones Químicas



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS


Porcentaje de avance

38.64%


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

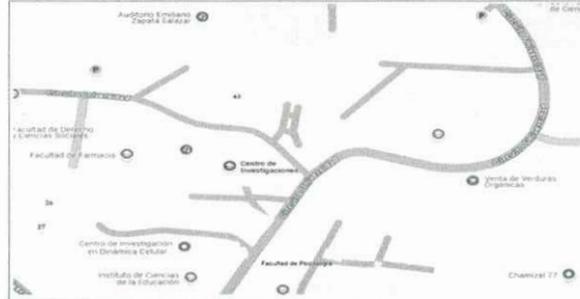

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

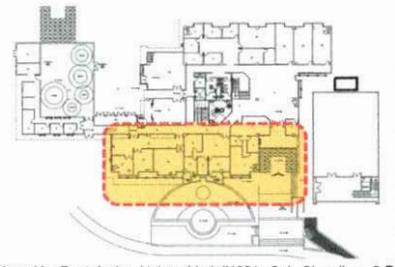


Dirección Postal: Av. Universidad #1001, Col. Chamilpa, C.P. 62209, Cuernavaca, Morelos.



Trabajos de suministro y colocación de pintura esmalte en estructura en el Centro de Investigaciones Químicas (CIQ).



Trabajos de aplicación de pintura en muros y columnas, en el Centro de Investigaciones Químicas (CIQ).

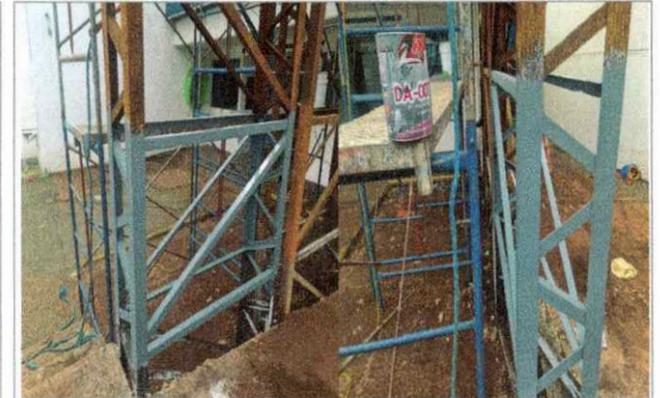

Suministro y colocación de Pintura esmalte en estructura

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

Dra. Viridiana Aydeé León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Dr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Tercer Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 30/09/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD

3

Nombre de la obra:

Mantenimiento a cuatro plantas de tratamiento, así como a espacios académicos y de actividad física y deportiva en el Campus Norte (Facultad de Contaduría, Administración e Informática)



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

5%


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

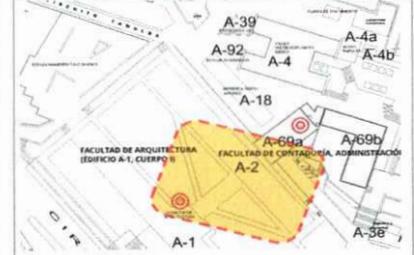

Dirección Postal: Av. Universidad #1001, Col. Chamilpa, C.P. 62209, Cuernavaca, Morelos.

ANTES



Fachada de la Facultad de Contaduría, Administración e Informática.



Vista del sitio en donde se realizaran los trabajos de: Limpieza de elementos, en la Facultad de Contaduría, Administración e Informática.

Observaciones :

Lo presentado en el Reporte Fotográfico del tercer trimestre, corresponde a los espacios a intervenir mediante el fondo.

VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Tercer Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 30/09/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

5%

PRIORIDAD

3


Nombre de la obra:

Mantenimiento a cuatro plantas de tratamiento, así como a espacios académicos y de actividad física y deportiva en el Campus Norte (Facultad de Contaduría, Administración e Informática)


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO




CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

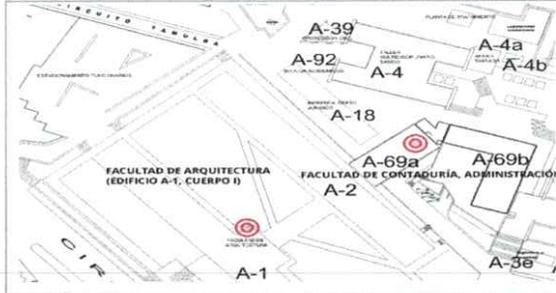

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

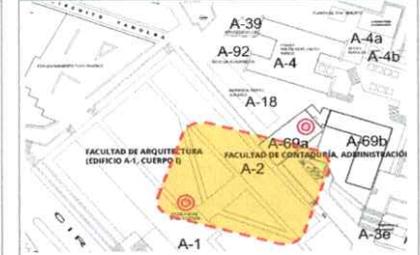

Dirección Postal: Av. Universidad #1001, Col. Chamilpa, C.P. 62209, Cuernavaca, Morelos.

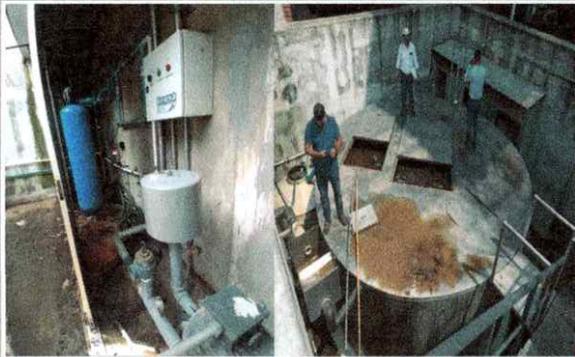

Vista del sitio en donde se realizarán los trabajos de: Revisión de equipos, así como caracterización del agua residual de acuerdo a parámetros de normas NOM aplicables, en la Facultad de Contaduría, Administración e Informática.



Vistas del sitio en donde se realizarán los trabajos de: Implementación de limpieza y/o desazolve, así como Albañilerías para optimización de sistemas, en la Facultad de Contaduría, Administración e Informática.



Vistas del sitio en donde se realizarán los trabajos de: Reparación o reposición de elementos eléctricos, mecánicos, electromecánicos, así como pruebas y entrega de laboratorio para acreditar el cumplimiento de la norma NOM correspondiente, en la Facultad de Contaduría, Administración e Informática.

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Tercer Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 30/09/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD

3

Nombre de la obra:

Mantenimiento a cuatro plantas de tratamiento, así como a espacios académicos y de actividad física y deportiva en el Campus Norte (Facultad de Contaduría, Administración e Informática)



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

5%


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

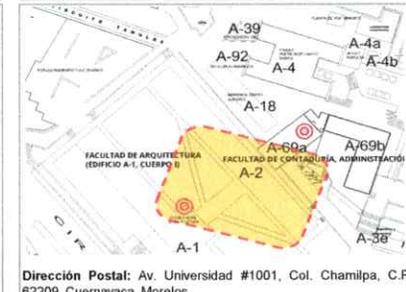

Dirección Postal: Av. Universidad #1001, Col. Chamilpa, C.P. 62209, Cuernavaca, Morelos.

Durante



Trabajos de desazolve de las cisternas existentes, en la Facultad de Contaduría Administración e Informática.



Trabajos de retiro de equipos para pruebas de funcionamiento, así como su respectivo mantenimiento, en la Facultad de Contaduría Administración e Informática.



Trabajos de retiro de equipos para pruebas de funcionamiento, así como su respectivo mantenimiento, en la Facultad de Contaduría Administración e Informática.

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

Dra. Viridiana Aydeé León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Dr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

NOTA

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Tercer Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 30/09/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

2%

PRIORIDAD

3

Nombre de la obra:

Mantenimiento a cuatro plantas de tratamiento, así como a espacios académicos y de actividad física y deportiva en el Campus Norte (Facultad de Psicología)


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal: Av. Universidad #1001, Col. Chamilpa, C.P. 62209, Cuernavaca, Morelos.

ANTES



Fachada de la Facultad de Psicología



Vistas del sitio en donde se realizaran los trabajos de: Limpieza de elementos, para la Facultad de Psicología.

Observaciones :

Lo presentado en el Reporte Fotográfico del tercer trimestre, corresponde a los espacios a intervenir mediante el fondo.

VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Tercer Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 30/09/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

2%

PRIMICIA

3

Nombre de la obra:

Mantenimiento a cuatro plantas de tratamiento, así como a espacios académicos y de actividad física y deportiva en el Campus Norte (Facultad de Psicología)


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal: Av. Universidad #1001, Col. Chamilpa, C.P. 62209, Cuernavaca, Morelos.



Vistas del sitio en donde se realizarán los trabajos de: Revisión de equipos eléctricos, así como Reparación o reposición de elementos eléctricos, mecánicos, electromecánicos, para la Facultad de Psicología.



Vistas del sitio en donde se realizarán los trabajos de: Caracterización del agua residual de acuerdo a parámetros de normas NOM aplicables, así como la limpieza y/o desazolve de tanques reactor, para la Facultad de Psicología.



Vista del sitio en donde se realizarán trabajos de: Pruebas y Entrega de laboratorio para acreditar el cumplimiento de la norma NOM correspondiente, para la Facultad de Psicología.

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Tercer Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 30/09/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD

3

Nombre de la obra:

Mantenimiento a cuatro plantas de tratamiento, así como a espacios académicos y de actividad física y deportiva en el Campus Norte (Facultad de Psicología)



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

2%


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal: Av. Universidad #1001, Col. Chamilpa, C.P. 62209, Cuernavaca, Morelos.

Durante



Trabajos de retiro de equipos para pruebas de funcionamiento, así como su respectivo mantenimiento, en la Facultad de Contaduría para la Facultad de Psicología.



Trabajos de retiro de equipos para pruebas de funcionamiento, así como su respectivo mantenimiento, en la Facultad de Contaduría para la Facultad de Psicología.



Trabajos de retiro de equipos para pruebas de funcionamiento, así como su respectivo mantenimiento, en la Facultad de Contaduría para la Facultad de Psicología.

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

Dra. Viridiana Aydeé León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Dr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

NOTA

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Tercer Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 30/09/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD

3

Nombre de la obra:

Mantenimiento a cuatro plantas de tratamiento, así como a espacios académicos y de actividad física y deportiva en el Campus Norte (Escuela de Turismo)



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

5%

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal: Av. Universidad #1001, Col. Chamilpa, C.P. 62209, Cuernavaca, Morelos.

ANTES



Fachada de la Escuela de Turismo



Vistas del sitio en donde se realizaran los trabajos de: Limpieza de elementos, Así como Albañilerías para optimización de sistemas, para la Escuela de Turismo.

Observaciones :

Lo presentado en el Reporte Fotográfico del tercer trimestre, corresponde a los espacios a intervenir mediante el fondo.

VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Tercer Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 30/09/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD

3

Nombre de la obra:

Mantenimiento a cuatro plantas de tratamiento, así como a espacios académicos y de actividad física y deportiva en el Campus Norte (Escuela de Turismo)



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

5%

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal: Av. Universidad #1001, Col. Chamilpa, C.P. 62209, Cuernavaca, Morelos.



Vista del sitio en donde se realizarán los trabajos de: Revisión de equipos eléctricos, mecánicos, electromecánicos, Así como la Reparación o reposición de elementos eléctricos, para la Escuela de Turismo.



Vistas del sitio en donde se realizarán los trabajos de: Caracterización del agua residual, Así como limpieza y/o desazolve de tanques reactor, cárcamos, registros, criba, ductos y sedimentadores, para la Escuela de Turismo.



Vista del sitio en donde se realizarán trabajos de: Pruebas y Entrega de laboratorio para acreditar el cumplimiento de la norma NOM correspondiente, para la Escuela de Turismo.

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Tercer Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 30/09/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD

3

Nombre de la obra:

Mantenimiento a cuatro plantas de tratamiento, así como a espacios académicos y de actividad física y deportiva en el Campus Norte (Escuela de Turismo)



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

5%


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

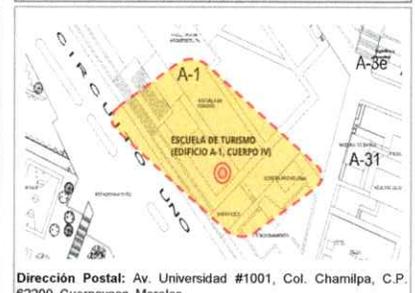

Dirección Postal: Av. Universidad #1001, Col. Chamilpa, C.P. 62209, Cuernavaca, Morelos.

Durante



Trabajos de retiro de equipos para pruebas de funcionamiento para la Escuela de Turismo.



Trabajos Preliminares revisiones e inspecciones de elementos existentes, para la Escuela de Turismo.



Trabajos Preliminares revisiones e inspecciones de elementos existentes, para la Escuela de Turismo.

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

Dra. Viridiana Aydeé León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Dr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

NOTA

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestañita, se podrán copiar tantas pestañitas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Tercer Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 30/09/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD

3

Nombre de la obra:

Mantenimiento a cuatro plantas de tratamiento, así como a espacios académicos y de actividad física y deportiva en el Campus Norte (Facultad de Ciencias Biológicas)




UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS


Porcentaje de avance

2%


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

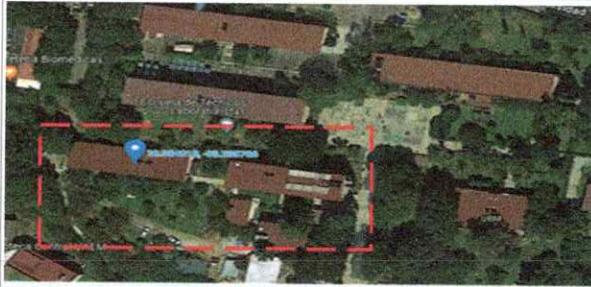

CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

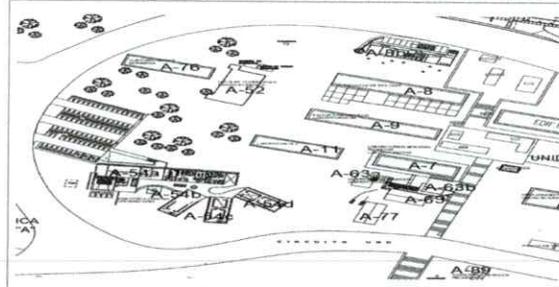

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

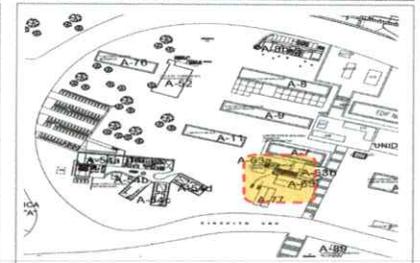


Dirección Postal: Av. Universidad #1001, Col. Chamilpa, C.P. 62209, Cuernavaca, Morelos.

ANTES



Fachada de la Facultad de Ciencias Biológicas

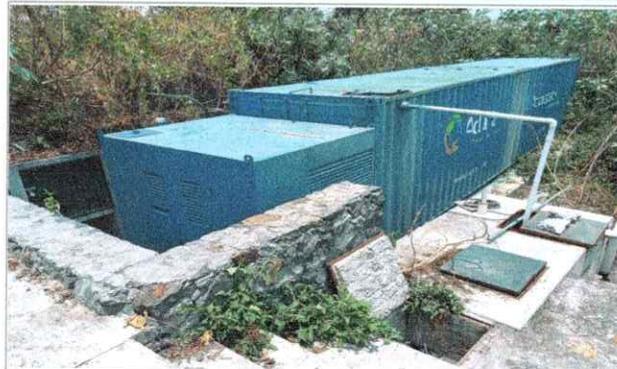

Vista del sitio en donde se realizaran los trabajos de: Limpieza de elementos, Así como Albañilerías para optimización de sistemas, para la Facultad de Ciencias Biológicas.

Observaciones :

Lo presentado en el Reporte Fotográfico del tercer trimestre, corresponde a los espacios a intervenir mediante el fondo.

VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Tercer Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 30/09/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD

3

Nombre de la obra:

Mantenimiento a cuatro plantas de tratamiento, así como a espacios académicos y de actividad física y deportiva en el Campus Norte (Facultad de Ciencias Biológicas)



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS


Porcentaje de avance

2%


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

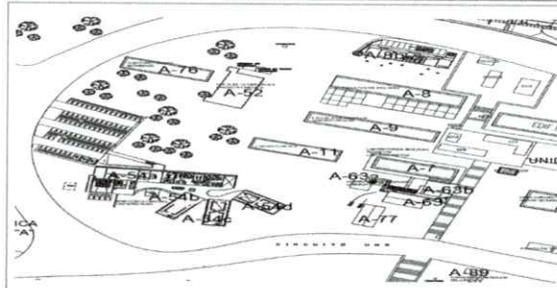

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

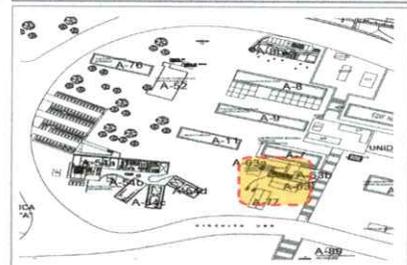


Dirección Postal: Av. Universidad #1001, Col. Chamilpa, C.P. 62209 Cuernavaca, Morelos.



Vista del sitio en donde se realizarán los trabajos de: Revisión de equipos eléctricos, mecánicos, electromecánicos y accesorios que la conforman, así como Reparación o reposición de elementos eléctricos, mecánicos, electromecánicos, para la Facultad de Ciencias Biológicas



Vista del sitio en donde se realizarán los trabajos de: Implementación de limpieza y/o desazolve de tanques reactor, cárcamos, registros, criba, ductos y sedimentadores, para la Facultad de Ciencias Biológicas

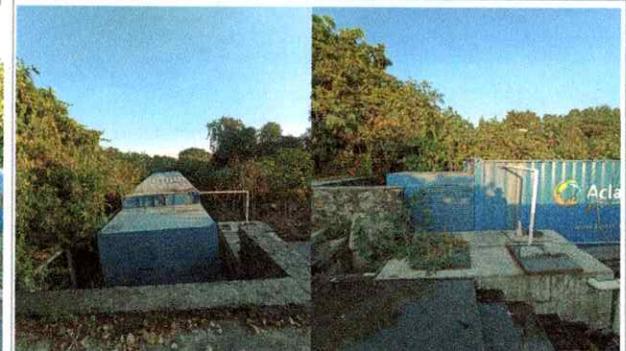

Vista del sitio en donde se realizarán trabajos de: Pruebas y Entrega de laboratorio para acreditar el cumplimiento de la norma NOM correspondiente, para la Facultad de Ciencias Biológicas

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Tercer Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 30/09/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD

3

Nombre de la obra:

Mantenimiento a cuatro plantas de tratamiento, así como a espacios académicos y de actividad física y deportiva en el Campus Norte (Facultad de Ciencias Biológicas)



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS


Porcentaje de avance

2%


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

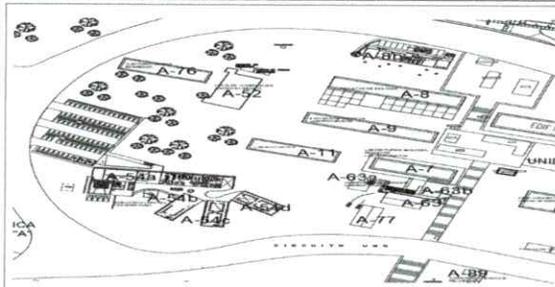

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

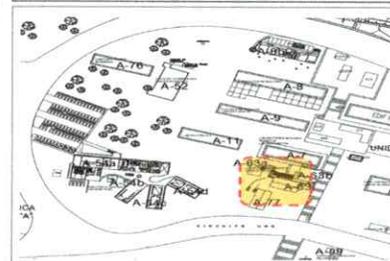

Dirección Postal: Av. Universidad #1001, Col. Chamilpa, C.P. 62209, Cuernavaca, Morelos.

Durante



Trabajos de retiro de equipos para pruebas de funcionamiento para la Facultad de Ciencias Biológicas



Trabajos de retiro de equipos para pruebas de funcionamiento para la Facultad de Ciencias Biológicas



Trabajos de retiro de equipos para pruebas de funcionamiento para la Facultad de Ciencias Biológicas

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

Dra. Viridiana Aydeé León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Dr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

NOTA

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Tercer Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 30/09/2025

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD

3

Nombre de la obra:

Mantenimiento a cuatro plantas de tratamiento, así como a espacios académicos y de actividad física y deportiva en el Campus Norte (Gimnasio auditorio)



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS


Porcentaje de avance

0%


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

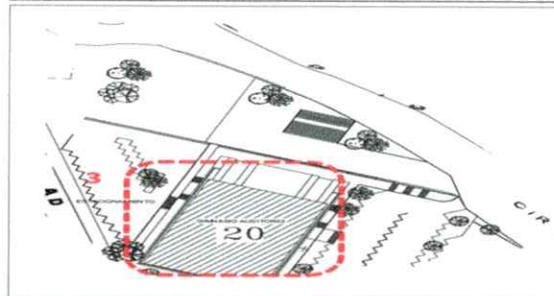


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal: Av. Universidad #1001, Col. Chamilpa, C.P. 62209, Cuemavaca, Morelos.

ANTES

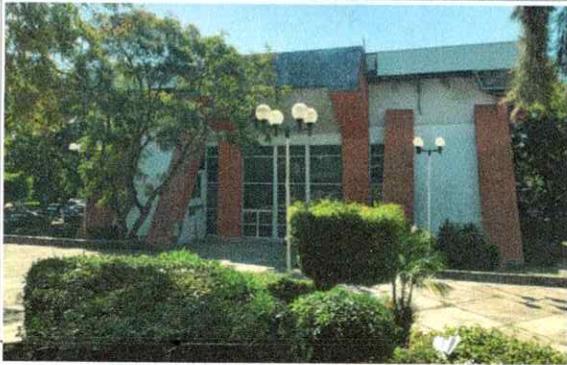

Fachada del Gimnasio Auditorio (Edif. A-20)



Vista del sitio en donde se realizaran los trabajos de: Mantenimiento al sistema de impermeabilizante en cubierta existente, para el edificio A-20 Gimnasio Auditorio.

Observaciones :

Lo presentado en el Reporte Fotográfico del tercer trimestre, corresponde a los espacios a intervenir mediante el fondo.

VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Tercer Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 30/09/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD

3

Nombre de la obra:

Mantenimiento a cuatro plantas de tratamiento, así como a espacios académicos y de actividad física y deportiva en el Campus Norte (Gimnasio auditorio)



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS


Porcentaje de avance

0%


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

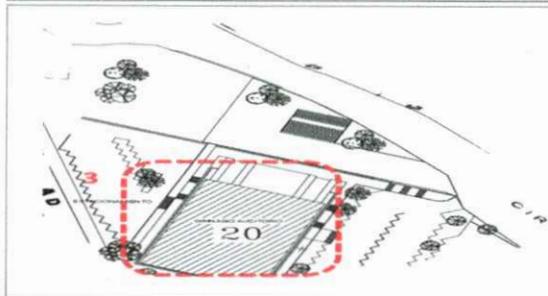


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal: Av. Universidad #1001, Col. Chamilpa, C.P. 62209, Cuernavaca, Morelos.



Vistas del sitio en donde se realizarán los trabajos de: Mantenimiento a la estructura metálica existente con pintura de esmalte, para el edificio A-20 Gimnasio Auditorio.

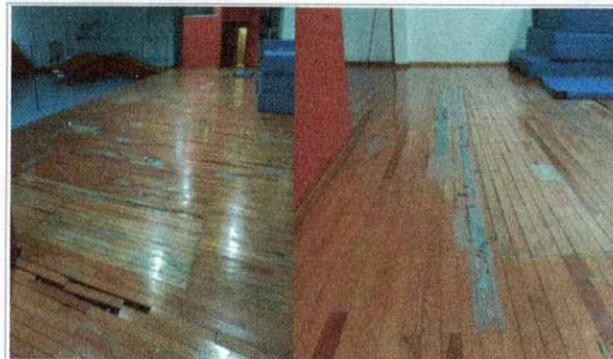

Vista del sitio en donde se realizarán los trabajos de: Rehabilitación del escenario existente, para el edificio A-20 Gimnasio Auditorio.



Vista del sitio en donde se realizarán los trabajos de: Reparación de elementos existentes de concreto en fachada, para el edificio A-20 Gimnasio Auditorio.

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

Dra. Viridiana Aydeé León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Dr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

NOTA

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Tercer Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 30/09/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD

3

Nombre de la obra:

Mantenimiento a cuatro plantas de tratamiento, así como a espacios académicos y de actividad física y deportiva en el Campus Norte (Polideportivo 1)



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS


Porcentaje de avance

5.87%


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

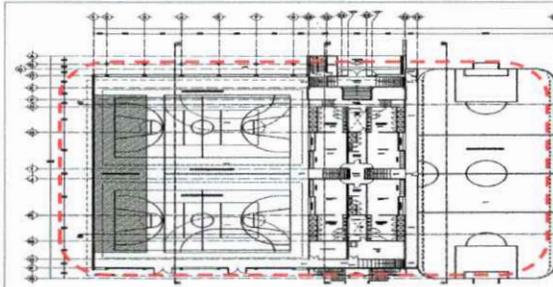


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

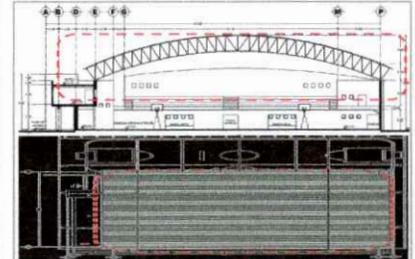

Dirección Postal: Av. Universidad #1001, Col. Chamilpa, C.P. 62209, Cuernavaca, Morelos.

ANTES

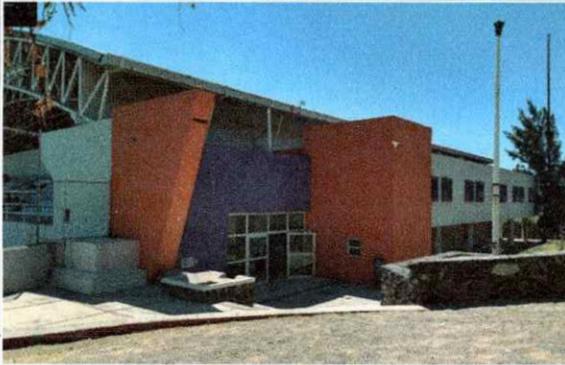

Fachada del Polideportivo 01 (edif. A-37)



Vistas del sitio en donde se realizaran los trabajos de: Mantenimiento a la Cubierta existente, para el edificio A-37 Polideportivo 01.

Observaciones:

Lo presentado en el Reporte Fotográfico del tercer trimestre, corresponde a los espacios a intervenir mediante el fondo.

VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Tercer Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 30/09/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD

3

Nombre de la obra:

Mantenimiento a cuatro plantas de tratamiento, así como a espacios académicos y de actividad física y deportiva en el Campus Norte (Polideportivo 1)



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS


Porcentaje de avance

5.87%


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO




CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

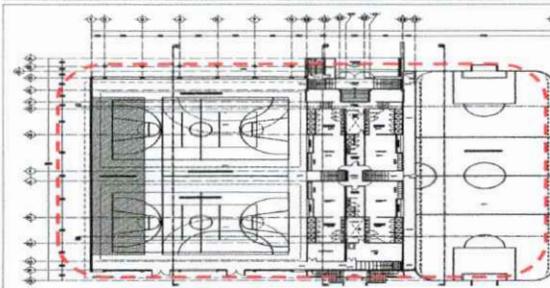

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

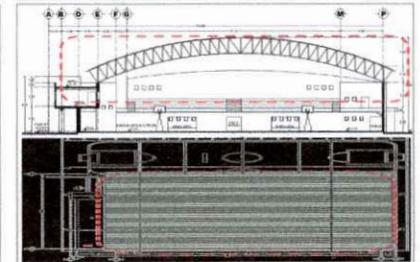


Dirección Postal: Av. Universidad #1001, Col. Chamilpa, C.P. 62209, Cuernavaca, Morelos.

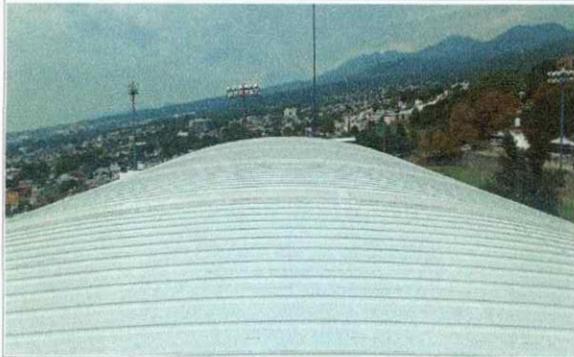

Vista del sitio en donde se realizarán los trabajos de: Mantenimiento a la Cubierta existente, para el edificio A-37 Polideportivo 01.



Vista del sitio en donde se realizarán los trabajos de: Mantenimiento a la estructura metálica existente con pintura de esmalte, para el edificio A-37 Polideportivo 01.

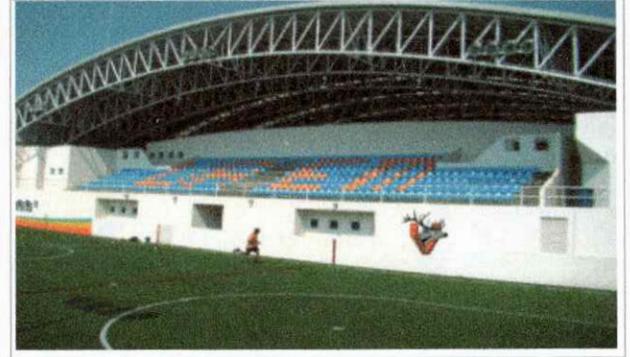

Vista del sitio en donde se realizarán los trabajos de: Mantenimiento a la estructura metálica existente con pintura de esmalte, para el edificio A-37 Polideportivo 01.

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Tercer Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 30/09/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD

3

Nombre de la obra:

Mantenimiento a cuatro plantas de tratamiento, así como a espacios académicos y de actividad física y deportiva en el Campus Norte (Polideportivo 1)



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS


Porcentaje de avance

5.87%


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

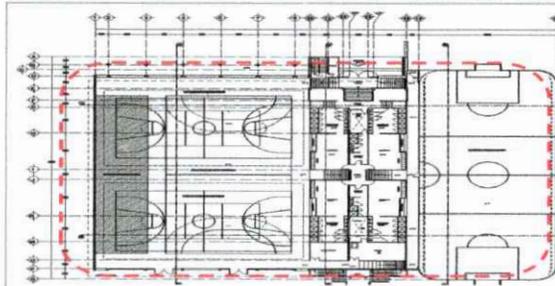

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

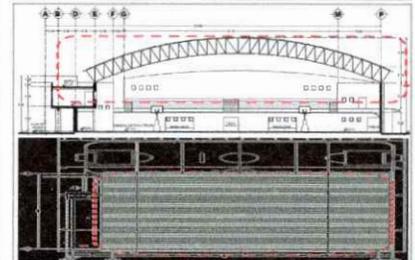


Dirección Postal: Av. Universidad #1001, Col. Chamilpa, C.P. 62209, Cuernavaca, Morelos.


Durante



Trabajos de sustitución de tornillos y pijas de cubierta, en el edificio A-37 Polideportivo 01.

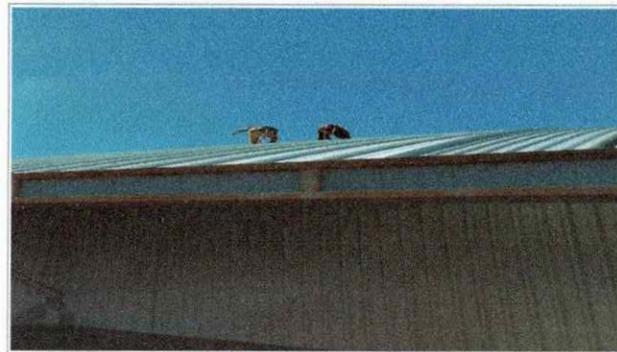

Trabajos de sustitución de tornillos y pijas de cubierta, en el edificio A-37 Polideportivo 01.

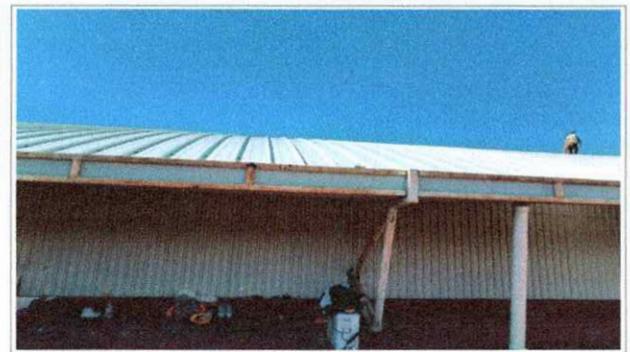

Trabajos de sustitución de tornillos y pijas de cubierta, en el edificio A-37 Polideportivo 01.

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

Dra. Viridiana Aydeé León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Dr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

NOTA

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Tercer Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 30/09/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRORIDAD

3

Nombre de la obra:

Mantenimiento a cuatro plantas de tratamiento, así como a espacios académicos y de actividad física y deportiva en el Campus Norte (Polideportivo 2)



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS


Porcentaje de avance

95%


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

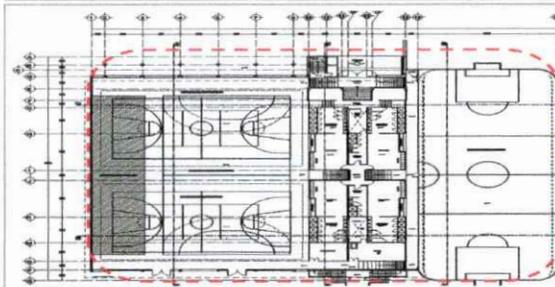

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

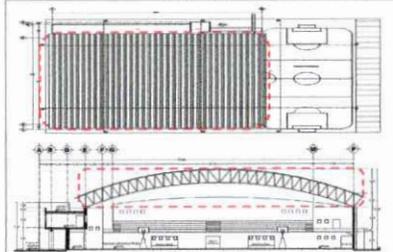

Dirección Postal: Av. Universidad #1001, Col. Chamilpa, C.P. 62209, Cuernavaca, Morelos.

ANTES



Fachada del Polideportivo 2 (edif. A-38)



Vistas del sitio en donde se realizaran los trabajos de: Mantenimiento a la Cubierta existente, en el edificio A-38 Polideportivo 02.

Observaciones :

Lo presentado en el Reporte Fotográfico del tercer trimestre, corresponde a los espacios a intervenir mediante el fondo.

VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGO EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Tercer Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 30/09/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIMORDIAL

3

Nombre de la obra:

Mantenimiento a cuatro plantas de tratamiento, así como a espacios académicos y de actividad física y deportiva en el Campus Norte (Polideportivo 2)



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS


Porcentaje de avance

95%


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

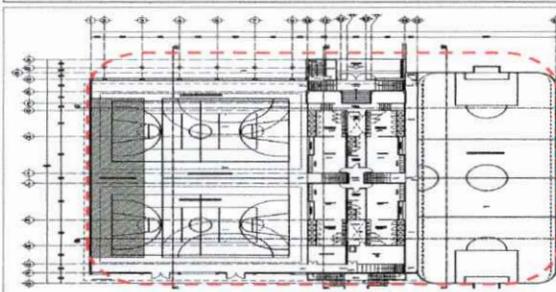

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal: Av. Universidad #1001, Col. Chamilpa, C.P. 62209, Cuernavaca, Morelos.



Vistas del sitio en donde se realizarán los trabajos de: Mantenimiento a la Cubierta existente, en el edificio A-38 Polideportivo 02.



Vista del sitio en donde se realizarán los trabajos de: Mantenimiento a la estructura metálica existente con pintura de esmalte, en el edificio A-38 Polideportivo 02.



Vista del sitio en donde se realizarán los trabajos de: Mantenimiento a la estructura metálica existente con pintura de esmalte, en el edificio A-38 Polideportivo 02.

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Tercer Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 30/09/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD

3

Nombre de la obra:

Mantenimiento a cuatro plantas de tratamiento, así como a espacios académicos y de actividad física y deportiva en el Campus Norte (Polideportivo 2)



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS


Porcentaje de avance

95%


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

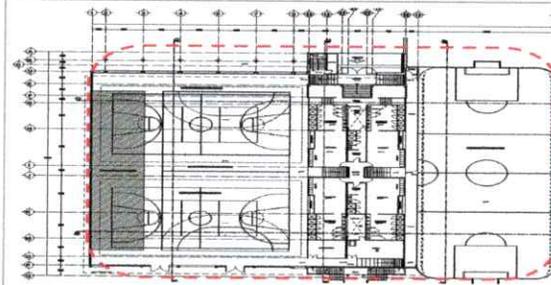

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal: Av. Universidad #1001, Col. Chamilpa, C.P. 62209, Cuernavaca, Morelos.


Durante



Trabajos de sustitucion de tornillos y pijas de cubierta, en el edificio A-38 Polideportivo 02



Trabajos de sustitucion de tornillos y pijas de cubierta, en el edificio A-38 Polideportivo 02

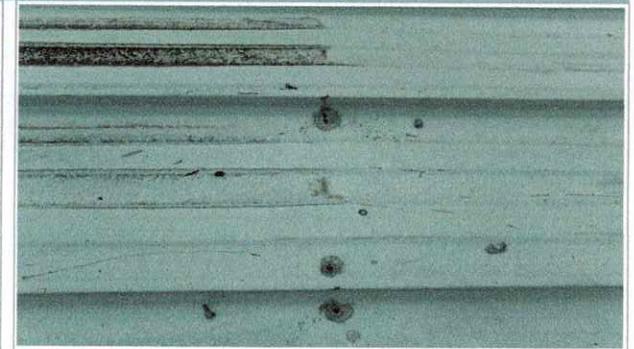

Trabajos de sustitucion de tornillos y pijas de cubierta, en el edificio A-38 Polideportivo 02

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

Dra. Viridiana Aydeé León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Dr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

NOTA:

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Tercer Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 30/09/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD

3

Nombre de la obra:

Mantenimiento a cuatro plantas de tratamiento, así como a espacios académicos y de actividad física y deportiva en el Campus Norte (Centro de lenguas)



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

88.78%


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO




UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

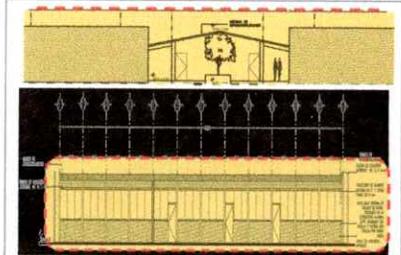


Dirección Postal: Av. Universidad #1001, Col. Chamilpa, C.P. 62209, Cuernavaca, Morelos.

ANTES

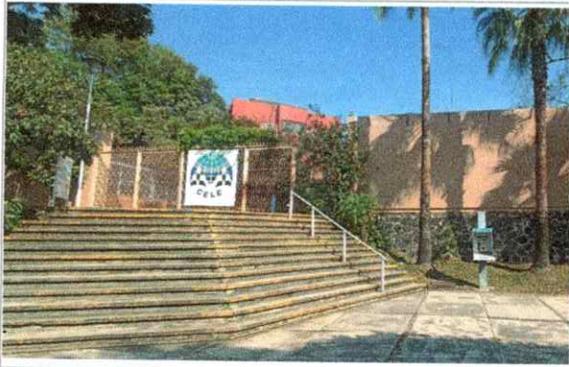

Fachada del Centro de Lenguas (CELE)

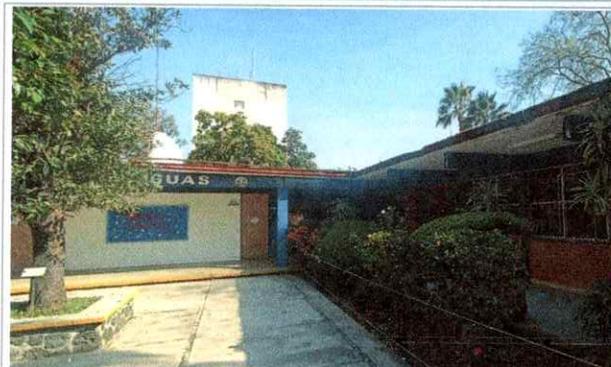

Vista del sitio en donde se relizaran los trabajos de Mantenimiento como : Preliminares y Albañilerías (Retiros Limpieza, Resanes entre otros), en el edificio A-5 Centro de Lenguas (CELE).

Observaciones :

Lo presentado en el Reporte Fotográfico del tercer trimestre, corresponde a los espacios a intervenir mediante el fondo.

VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Tercer Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 30/09/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD

3

Nombre de la obra:

Mantenimiento a cuatro plantas de tratamiento, así como a espacios académicos y de actividad física y deportiva en el Campus Norte (Centro de lenguas)



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS


Porcentaje de avance

88.78%


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

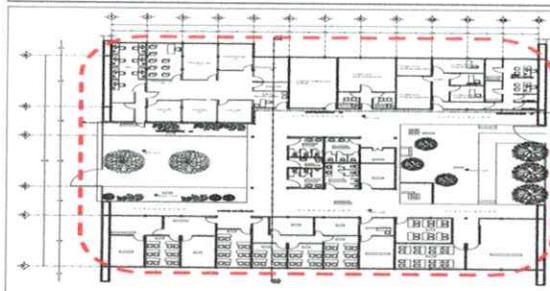

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

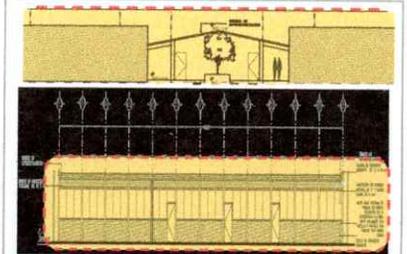

Dirección Postal: Av. Universidad #1001, Col. Chamilpa, C.P. 62209, Cuernavaca, Morelos.



Vista del sitio en donde se relizaran los trabajos de Mantenimiento como : Acabados (Aplicacion de pinturas) Así como limpieza fina, en el edificio A-5 Centro de Lenguas (CELE)



Vista del sitio en donde se relizaran los trabajos de Mantenimiento a ILuminacion, en el edificio A-5 Centro de Lenguas (CELE)



Vista del sitio en donde se relizaran los trabajos de Mantenimiento a ILuminacion, en el edificio A-5 Centro de Lenguas (CELE)

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Tercer Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 30/09/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD

3

Nombre de la obra:

Mantenimiento a cuatro plantas de tratamiento, así como a espacios académicos y de actividad física y deportiva en el Campus Norte (Centro de lenguas)



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS


Porcentaje de avance

88.78%


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

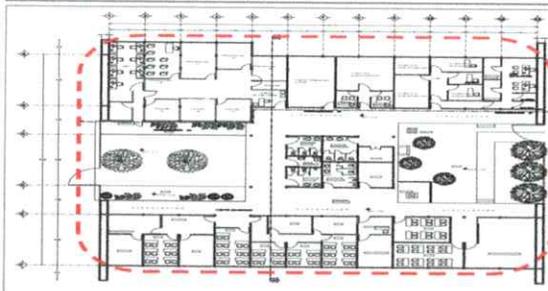

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

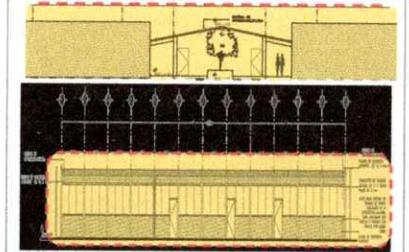

Dirección Postal: Av. Universidad #1001, Col. Chamilpa, C.P. 62209, Cuernavaca, Morelos.


Durante



Trabajos de preparación de la superficie, así como la colocación de pintura en muros exteriores existentes, en el edificio A-5 Centro de Lenguas (CELE).



Trabajos de suministro de pintura en barda exterior en el edificio A-5 Centro de Lenguas (CELE).

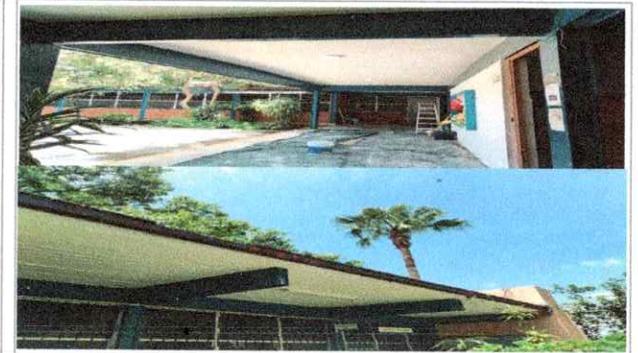

Trabajos de preparación de la superficie, así como la colocación de pintura en plafones exteriores, en el edificio A-5 Centro de Lenguas (CELE).

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Tercer Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 30/09/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD

3

Nombre de la obra:

Mantenimiento a cuatro plantas de tratamiento, así como a espacios académicos y de actividad física y deportiva en el Campus Norte (Centro de lenguas)



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

88.78%


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO




UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

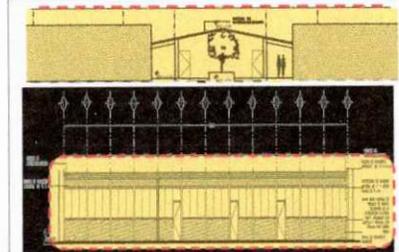

Dirección Postal: Av. Universidad #1001, Col. Chamilpa, C.P. 62209, Cuernavaca, Morelos.



Suministro y aplicación de pintura en interiores, en el edificio A-5 Centro de Lenguas (CELE).

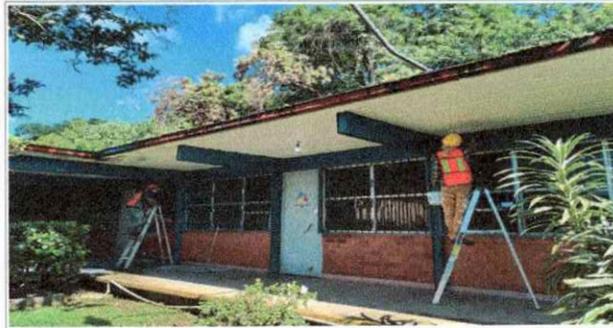

Suministro y aplicación de pintura en exteriores, en el edificio A-5 Centro de Lenguas (CELE).



Suministro y aplicación de pintura en exteriores, en el edificio A-5 Centro de Lenguas (CELE).

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

Dra. Viridiana Aydeé León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Dr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

NOTA

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Tercer Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 30/09/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

62.61%

PRIORIDAD

3


Nombre de la obra:

Mantenimiento a cuatro plantas de tratamiento, así como a espacios académicos y de actividad física y deportiva en el Campus Norte (Escuela de Teatro, Danza y Música)


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

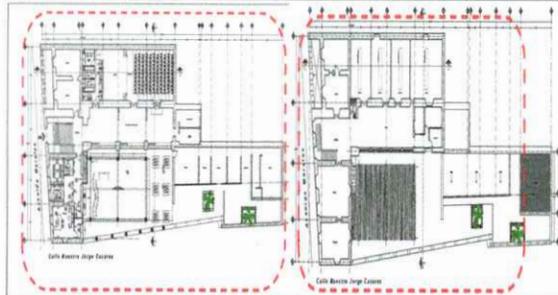

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

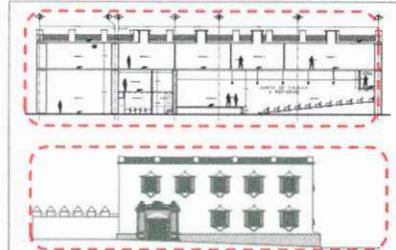


Dirección Postal: Av. Morelos Esq. Jorge Cázares # 180, Col. Centro C.P. 62000, Cuernavaca, Morelos.

ANTES



Fachada de la Escuela de Teatro, Danza y Música

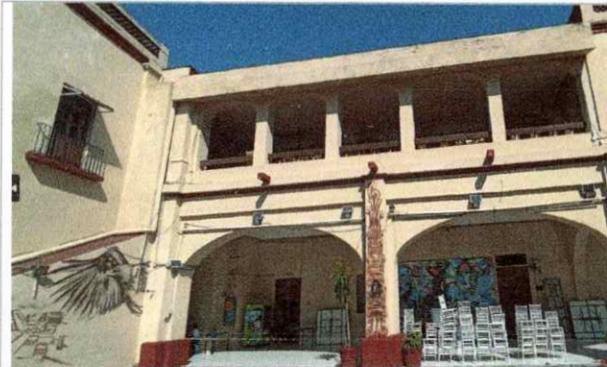

Vista del sitio en donde se relizaran los trabajos de Mantenimiento como : Preliminares y Albañilerías (Retiros, Colocacion de Protecciones, Resanes entre otros), para la Escuela de Teatro, Danza y Música.

Observaciones :

Lo presentado en el Reporte Fotográfico del Tercer trimestre, corresponde a los espacios a intervenir mediante el fondo.

VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Tercer Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 30/09/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD

3

Nombre de la obra:

Mantenimiento a cuatro plantas de tratamiento, así como a espacios académicos y de actividad física y deportiva en el Campus Norte (Escuela de Teatro, Danza y Música)



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS


Porcentaje de avance

62.61%


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO




CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

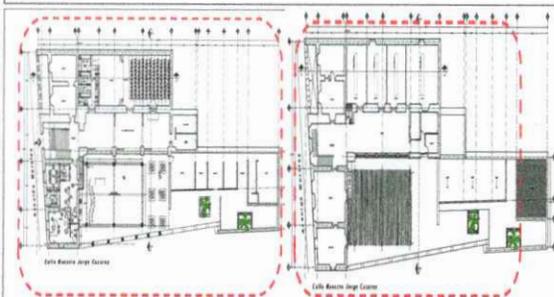

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

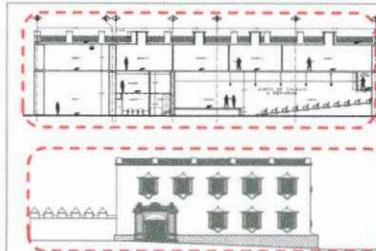

Dirección Postal: Av. Morelos Esq. Jorge Cáreres # 180, Col. Centro C.P. 62000, Cuernavaca, Morelos.

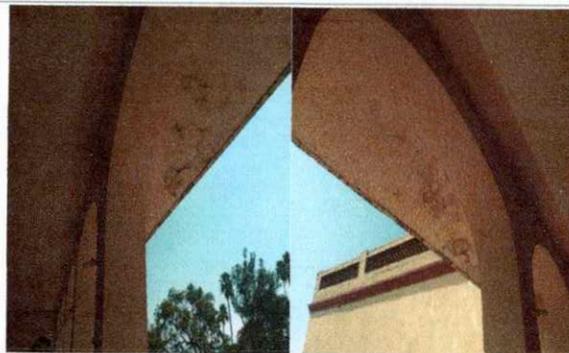

Vista del sitio en donde se relizaran los trabajos de Mantenimiento como : Preliminares y Albañilerías (Retiros, Colocacion de Protecciones, Resanes entre otros), para la Escuela de Teatro, Danza y Música.



Vista del sitio en donde se relizaran los trabajos de Mantenimiento como : Acabados (Aplicacion de pinturas) Asi como limpieza fina, para la Escuela de Teatro, Danza y Música.



Vista del sitio en donde se relizaran los trabajos de Mantenimiento como : Acabados (Aplicacion de pinturas) Asi como limpieza fina, para la Escuela de Teatro, Danza y Música.

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Tercer Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 30/09/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

62.61%

PRIORIDAD

3


Nombre de la obra:

Mantenimiento a cuatro plantas de tratamiento, así como a espacios académicos y de actividad física y deportiva en el Campus Norte (Escuela de Teatro, Danza y Música)


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

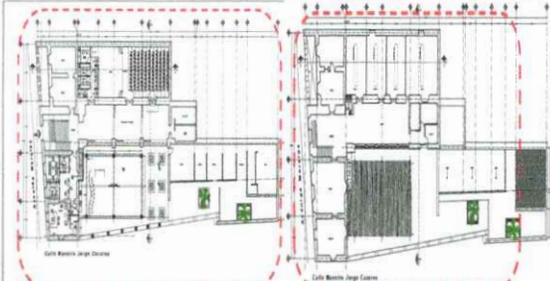

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal: Av. Morelos Esq. Jorge Cázares # 180, Col. Centro C.P. 62000, Cuernavaca, Morelos.

Durante



Trabajos de reparación de resanes para la Escuela de Teatro, Danza y Música.



Trabajos de reparación de emboquillados para la Escuela de Teatro, Danza y Música.



Trabajos de preparación de la superficie y colocación de plástico de uso rudo para la Escuela de Teatro, Danza y Música.

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Tercer Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 30/09/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIMORDIAL

3

Nombre de la obra:

Mantenimiento a cuatro plantas de tratamiento, así como a espacios académicos y de actividad física y deportiva en el Campus Norte (Escuela de Teatro, Danza y Música)



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS


Porcentaje de avance

62.61%


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

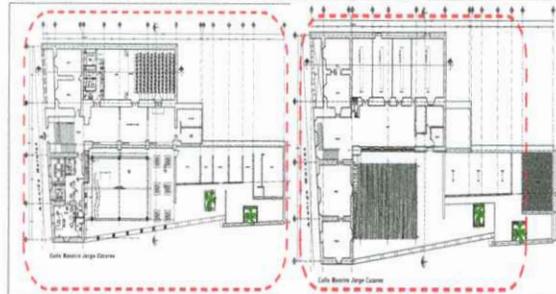

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal: Av. Morelos Esq. Jorge Cázares # 180, Col. Centro C.P. 62000, Cuernavaca, Morelos.



Trabajos de Suministro y aplicación de pintura, para la Escuela de Teatro, Danza y Música.



Trabajos de Suministro y aplicación de pintura, para la Escuela de Teatro, Danza y Música.

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Tercer Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 30/09/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

62.61%



3


Nombre de la obra

Mantenimiento a cuatro plantas de tratamiento, así como a espacios académicos y de actividad física y deportiva en el Campus Norte (Escuela de Teatro, Danza y Música)


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

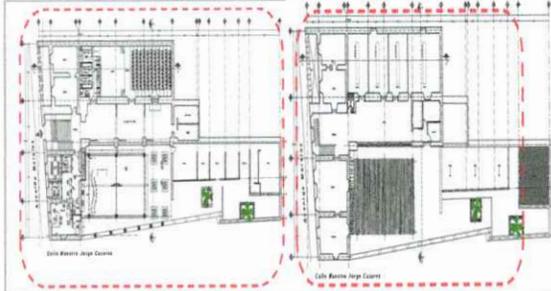

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal: Av. Morelos Esq. Jorge Cázares # 180, Col. Centro C.P. 62000, Cuernavaca, Morelos.

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

Dra. Viridiana Aydeé León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Dr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

NOTA:

Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD

4 Nombre de la obra: Adquirir el equipamiento necesario en los espacios académicos de los Campus Norte y Campus Oriente.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS


Porcentaje de avance

0%


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

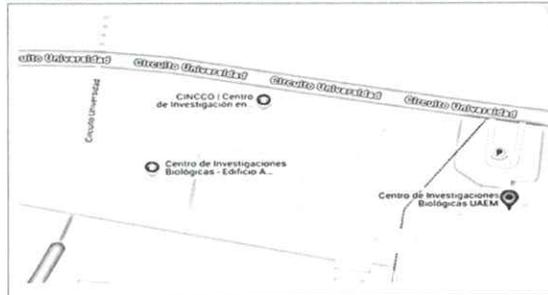


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

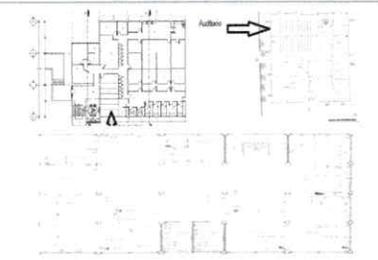

Dirección Postal: Av. Universidad #1001, Col. Chamilpa, C.P. 62209, Cuernavaca, Morelos.

ANTES

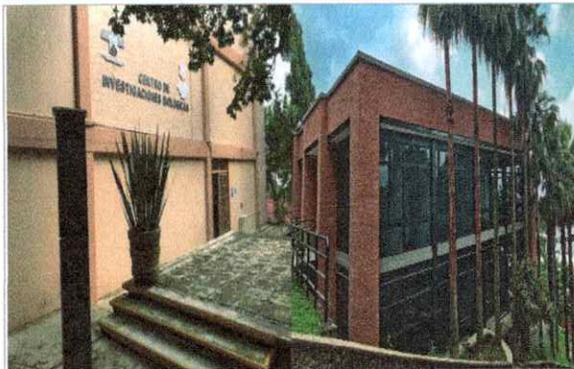

Fachada del Centro de Investigaciones Biológicas y edificio A



Se equipara Auditorio de usos múltiples 1 con 13 mesas rectangulares y 1 pizarrón blanco

Observaciones :

Lo presentado en el Reporte Fotográfico del segundo trimestre, corresponde a los espacios a intervenir mediante el fondo.

VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.



Se equipara Auditorio de usos múltiples 2 con 13 mesas rectangulares y 1 pizarrón blanco



Se equipará Auditorio con 2 aires acondicionados y 1 proyector



Se equipará Laboratorio con 1 congelador

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Tercer Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 30/09/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

0%

PRIORIDAD

4 Nombre de la obra: Adquirir el equipamiento necesario en los espacios académicos de los Campus Norte y Campus Oriente.


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

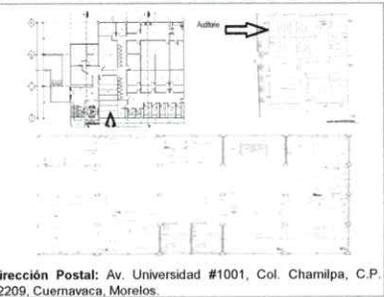

Dirección Postal: Av. Universidad #1001, Col. Chamilpa, C.P. 62209, Cuernavaca, Morelos.



Se equipará Biblioteca con 7 estantes sencillos de batería



Equipamiento de Centro de cómputo con 1 mesa y 11 sillas de visita

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

Dra. Viridiana Aydeé León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Dr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

NOTA

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Tercer Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 30/09/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD

4 Nombre de la obra: Adquirir el equipamiento necesario en los espacios académicos de los Campus Norte y Campus Oriente.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

0%


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

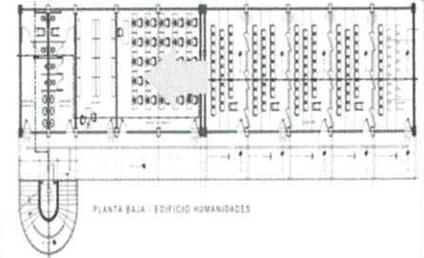

Dirección Postal: Av. Universidad #1001, Col. Chamilpa, C.P. 62209, Cuernavaca, Morelos.

ANTES



Fachada del Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Estudios Regionales



Se equipará Centro de cómputo con 9 piezas de Procesador AMD Ryzen y 14 piezas de Monitor para CPU

Observaciones :

Lo presentado en el Reporte Fotográfico del segundo trimestre, corresponde a los espacios a intervenir mediante el fondo.

VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

Dra. Viridiana Aydeé León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Dr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

NOTA:

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Tercer Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 30/09/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD

4 Nombre de la obra: Adquirir el equipamiento necesario en los espacios académicos de los Campus Norte y Campus Oriente.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

0%


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

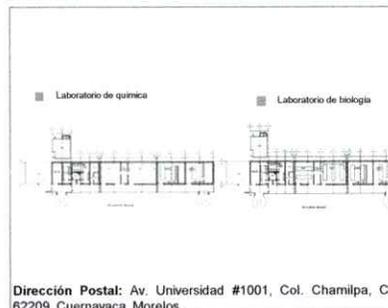

ANTES



Fachada del Centro de Investigación en Dinámica Celular



Equipamiento del Laboratorio de Química con 1 incubadora con agitación y 1 termoblock (baño seco)

Observaciones :

Lo presentado en el Reporte Fotográfico del segundo trimestre, corresponde a los espacios a intervenir mediante el fondo.

VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.



Equipamiento de Laboratorio de Biología con 1 incubadora y 1 lector de microplacas

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Tercer Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 30/09/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD

4

Nombre de la obra: Adquirir el equipamiento necesario en los espacios académicos de los Campus Norte y Campus Oriente.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

0%


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

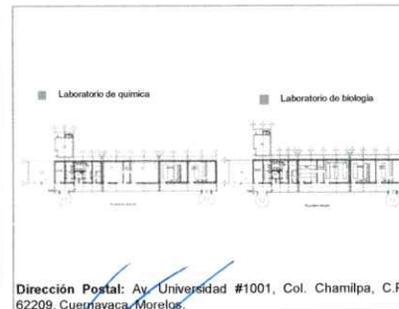

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

Dra. Viridiana Aydeé León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Dr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

NOTA:

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Tercer Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 30/09/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD

4

Nombre de la obra: Adquirir el equipamiento necesario en los espacios académicos de los Campus Norte y Campus Oriente.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

0%

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal: Av. Universidad #1001, Col. Chamilpa, C.P. 62209, Cuernavaca, Morelos.

ANTES



Fachada del Centro de Investigación Interdisciplinar para el Desarrollo Universitario



Se equipará el Aula de Usos Múltiples 1 con 1 aire acondicionado

Observaciones :

Lo presentado en el Reporte Fotográfico del segundo trimestre, corresponde a los espacios a intervenir mediante el fondo.

VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Tercer Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 30/09/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD

4 Nombre de la obra: Adquirir el equipamiento necesario en los espacios académicos de los Campus Norte y Campus Oriente.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

0%

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal: Av. Universidad #1001, Col. Chamilpa, C.P. 62209, Cuernavaca, Morelos.



Se equipará el Aula de Usos Múltiples 2 con 2 libreros y 7 mesas de trabajo multiusos



Se equipará Aula de Posgrado 1 (salón de clase) con 1 aire acondicionado



Se equipará Centro de cómputo con 1 proyector, 1 pantalla eléctrica para proyector, 15 mesas de trabajo multiusos, 3 libreros y 1 aire acondicionado

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

Dra. Viridiana Aydeé León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Dr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

NOTA:

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Tercer Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 30/09/2025

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

0%


PRIORIDAD

4 Nombre de la obra: Adquirir el equipamiento necesario en los espacios académicos de los Campus Norte y Campus Oriente.

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

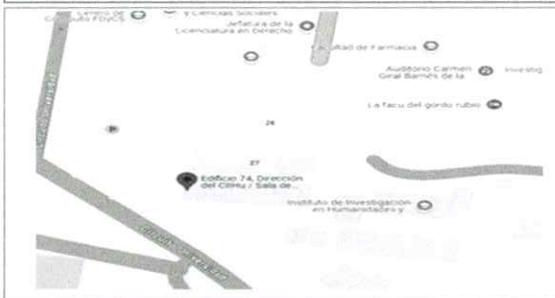


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal: Av. Universidad #1001, Col. Chamilpa, C.P. 62209, Cuernavaca, Morelos.

ANTES

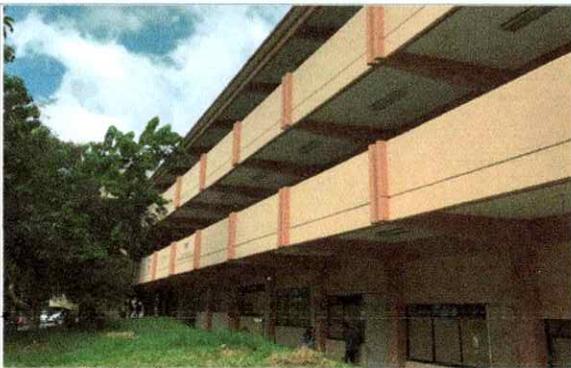

Fachada del Centro Interdisciplinario de Investigación en Humanidades



Se equipará Centro de cómputo con 1 aire acondicionado

Observaciones :

Lo presentado en el Reporte Fotográfico del segundo trimestre, corresponde a los espacios a intervenir mediante el fondo.

VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Tercer Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 30/09/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD

4 Nombre de la obra: Adquirir el equipamiento necesario en los espacios académicos de los Campus Norte y Campus Oriente.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS


Porcentaje de avance

0%

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

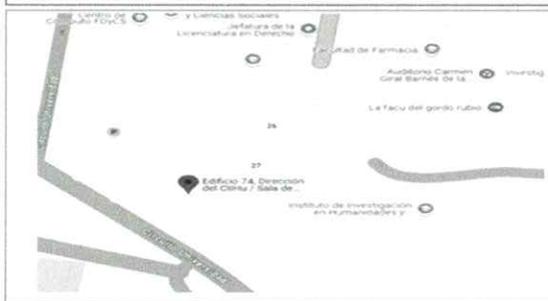

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal: Av. Universidad #1001, Col. Chamilpa, C.P. 62209, Cuernavaca, Morelos.



Se equipará Centro de cómputo de la MPE con 4 Procesadores AMD Ryzen, 4 monitores y 1 mesa para pc

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

Dra. Viridiana Aydeé León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Dr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

NOTA:

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Tercer Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 30/09/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD

4 Nombre de la obra: Adquirir el equipamiento necesario en los espacios académicos de los Campus Norte y Campus Oriente.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

0%


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO




UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS




Dirección Postal: Av. Miguel Hidalgo S/N Col. Ahuatlán, Totolapan Morelos, México, 62834.

ANTES



Fachada de la Escuela de Estudios Superiores de Atlatlahucan Subside Totolapan

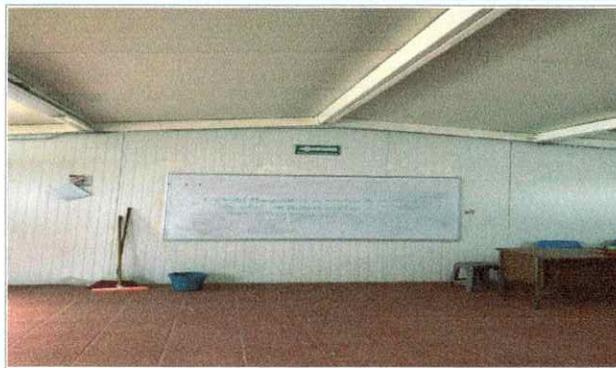

Se equipará Aula 4 con 31 butacas escolares

Observaciones :

Lo presentado en el Reporte Fotográfico del segundo trimestre, corresponde a los espacios a intervenir mediante el fondo.

VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Tercer Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 30/09/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD

4

Nombre de la obra: Adquirir el equipamiento necesario en los espacios académicos de los Campus Norte y Campus Oriente.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

0%


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO




CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal: Av. Miguel Hidalgo S/N Col. Ahuatlán, Tototlan Morelos, México, 62834.

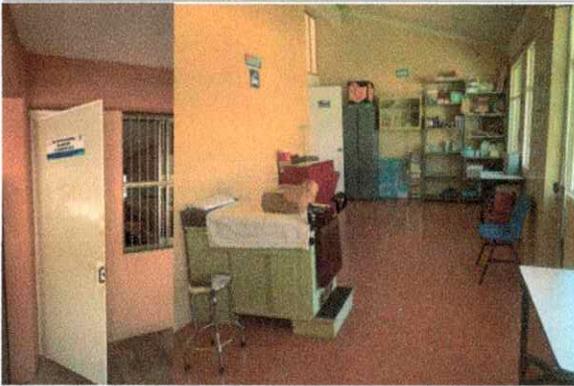

Se equipará Laboratorio de Ginecología con 2 simuladores de parto y 1 Locker de tres puertas de 9 casillas

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

Dra. Viridiana Aydeé León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Dr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

NOTA

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Tercer Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 30/09/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD

4 Nombre de la obra: Adquirir el equipamiento necesario en los espacios académicos de los Campus Norte y Campus Oriente.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

0%


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal: Avenida Nicolás S/N, Parque Industrial, en el municipio de Ayala, Morelos.

ANTES



Fachada de la Escuela de Estudios Superiores de Xalostoc



Se equipará Laboratorio de Operaciones unitarias con 1 columna de destilacion

Observaciones :

Lo presentado en el Reporte Fotográfico del segundo trimestre, corresponde a los espacios a intervenir mediante el fondo.

VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Tercer Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 30/09/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD

4 Nombre de la obra: Adquirir el equipamiento necesario en los espacios académicos de los Campus Norte y Campus Oriente.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

0%


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO




CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

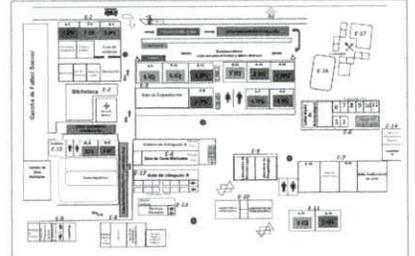

Dirección Postal: Avenida Nicolás S/N, Parque Industrial, en el municipio de Ayala, Morelos.

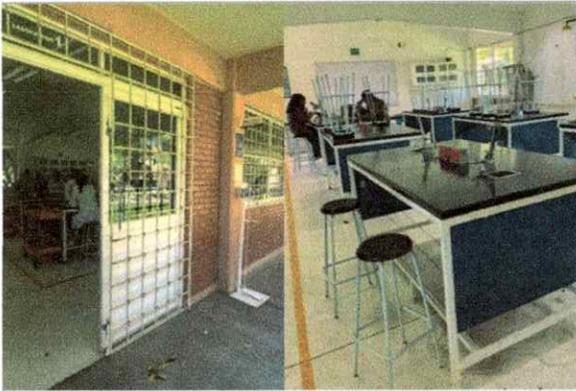

Se equipará Laboratorio de Química Básica con 1 microscopio binocular biológico y 1 microscopio estereoscópico



Se equipará Laboratorio de Análisis de Suelos con 2 probadores de suelo

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

Dra. Viridiana Aydeé León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Dr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

NOTA:

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Tercer Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 30/09/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD

4 Nombre de la obra: Adquirir el equipamiento necesario en los espacios académicos de los Campus Norte y Campus Oriente.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

0%


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal: Calle Ingeniero Felipe Rivera Crespo s/n Col. Buenavista, Yauatepec de Zaragoza, Morelos, C.P.62730.

ANTES



Fachada de la Escuela de Estudios Superiores de Yauatepec



Se equipará Auditorio con 90 butacas para auditorio

Observaciones :

Lo presentado en el Reporte Fotográfico del segundo trimestre, corresponde a los espacios a intervenir mediante el fondo.

VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

Dra. Viridiana Aydeé León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Dr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

NOTA

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Tercer Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 30/09/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD

4 Nombre de la obra: Adquirir el equipamiento necesario en los espacios académicos de los Campus Norte y Campus Oriente.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

0%


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO




CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO




UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

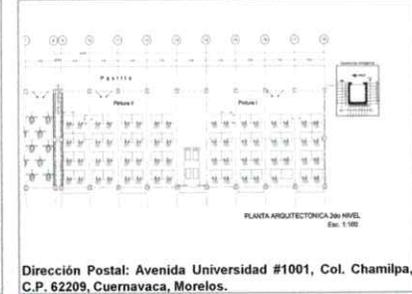

ANTES

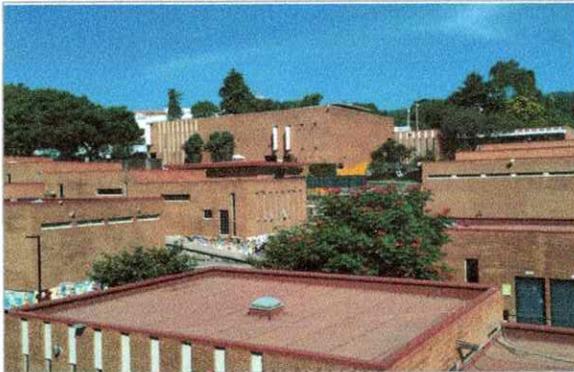

Fachada de la Facultad de Artes

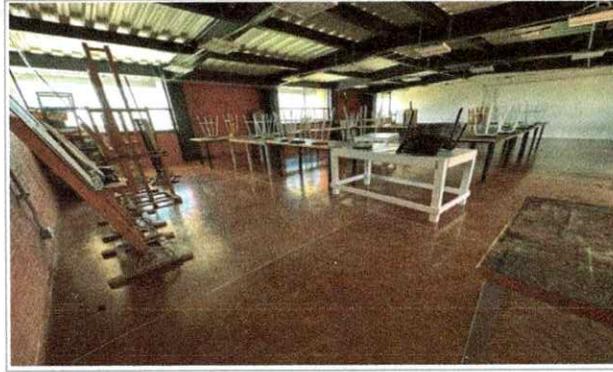

Se equipará Taller de pintura 1 con 18 caballetes de madera y 20 bancos de madera

Observaciones :

Lo presentado en el Reporte Fotográfico del segundo trimestre, corresponde a los espacios a intervenir mediante el fondo.

VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Tercer Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 30/09/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD

4 Nombre de la obra: Adquirir el equipamiento necesario en los espacios académicos de los Campus Norte y Campus Oriente.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

0%


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO




CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO




UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

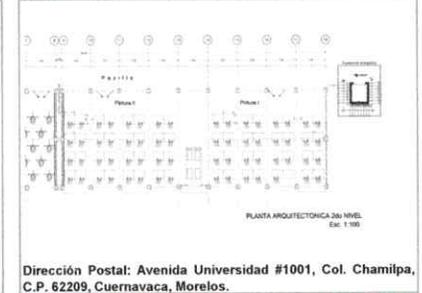

Se equipará Taller de pintura 2 con 20 bancos de madera



Se equipará Taller de escultura (modelado) con 4 mesas de trabajo de uso rudo, 21 bancos metálicos con asiento de madera y 1 gabinete de acero inoxidable



Se equipará Laboratorio de impresión digital con 2 Computadoras IMAC Apple Chip M4 512 gb

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

Dra. Viridiana Aydeé León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Dr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

NOTA

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Tercer Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 30/09/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD

4 Nombre de la obra: Adquirir el equipamiento necesario en los espacios académicos de los Campus Norte y Campus Oriente.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

0%

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO




UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal: Avenida Universidad #1001, Col. Chamilpa, C.P. 62209, Cuernavaca, Morelos.

ANTES

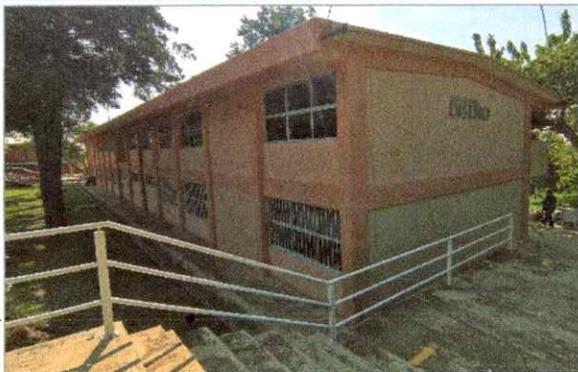

Fachada de la Facultad de Diseño



Se equipará Aula de usos múltiples con 1 sistema de sonido empotrable

Observaciones :

Lo presentado en el Reporte Fotográfico del segundo trimestre, corresponde a los espacios a intervenir mediante el fondo.

VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Tercer Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 30/09/2025

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD

4 Nombre de la obra: Adquirir el equipamiento necesario en los espacios académicos de los Campus Norte y Campus Oriente.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

0%

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal: Avenida Universidad #1001, Col. Chamilpa, C.P. 62209, Cuernavaca, Morelos.



Se equipará Laboratorio de Fotografía y Video con 1 Sistema de Iluminación semifija



Se equipará Laboratorio Industrial con 1 Equipo de termoformado, 1 Router CNC y 3 Equipos de manufactura tridimensional

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

Dra. Viridiana Aydeé León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Dr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

NOTA:

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestañita, se podrán copiar tantas pestañitas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Tercer Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 30/09/2025

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD

4 Nombre de la obra: Adquirir el equipamiento necesario en los espacios académicos de los Campus Norte y Campus Oriente.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

0%

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO




UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal: Pico de Orizaba #2, Col. Los Volcanes, C.P. 62350, Cuernavaca, Morelos.

ANTES

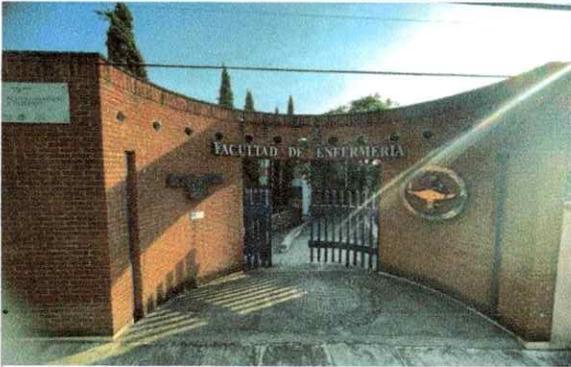

Fachada de la Facultad de Enfermería



Se equipará Aula Cuernavaca con 1Silla para docente, 1 pantalla para proyector, 1 proyector y 1 escritorio

Observaciones :

Lo presentado en el Reporte Fotográfico del segundo trimestre, corresponde a los espacios a intervenir mediante el fondo.

VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Tercer Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 30/09/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIMORDIAL

4 Nombre de la obra: Adquirir el equipamiento necesario en los espacios académicos de los Campus Norte y Campus Oriente.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

0%


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

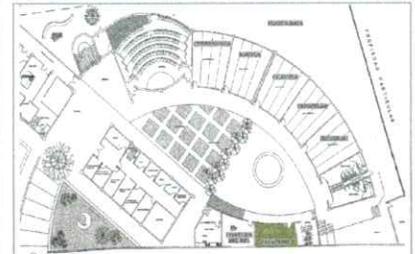


Dirección Postal: Pico de Orizaba #2, Col. Los Volcanes, C.P. 62350, Cuernavaca, Morelos.



Se equipará Aula Jojutta con 1 silla para docente, 1 pantalla para proyector, 1 proyector y 1 escritorio



Se equipará Aula Cuautla con 1 silla para docente, 1 pantalla para proyector, 1 proyector y 1 escritorio

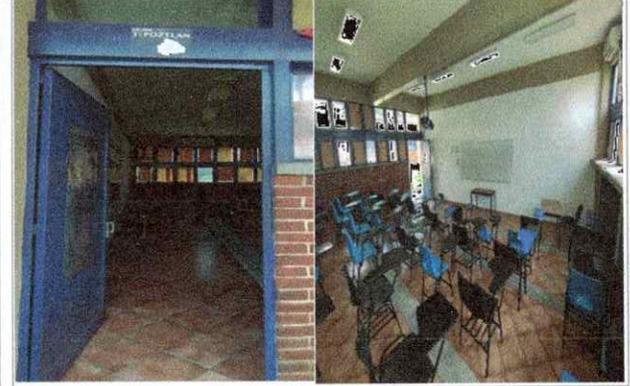

Se equipará Aula Tepoztlán con 1 silla para docente, 1 pantalla para proyector y 1 escritorio

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Tercer Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 30/09/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD

4 Nombre de la obra: Adquirir el equipamiento necesario en los espacios académicos de los Campus Norte y Campus Oriente.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

0%


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

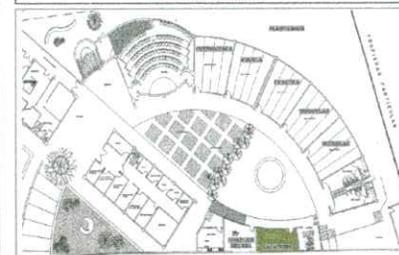

Dirección Postal: Pico de Orizaba #2, Col. Los Volcanes, C.P. 62350, Cuernavaca, Morelos.



Se equipará Aula Huitzilac con 1 silla para docente, 1 pantalla para proyector y 1 escritorio



Se equipará Aula Zacatepec con 1 silla para docente, 1 pantalla para proyector y 1 escritorio



Se equipará Aula Coatlán del Río con 1 silla para docente, 1 pantalla para proyector y 1 escritorio

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Tercer Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 30/09/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD

4 Nombre de la obra: Adquirir el equipamiento necesario en los espacios académicos de los Campus Norte y Campus Oriente.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

0%

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal: Pico de Orizaba #2, Col. Los Volcanes, C.P. 62350, Cuernavaca, Morelos.



Se equipará Aula Amacuzac con 1 silla para docente, 1 pantalla para proyector y 1 escritorio



Se equipará Aula Xochitepec con 1 silla para docente, 1 pantalla para proyector y 1 escritorio



Se equipará Aula Puente de Ixtla con 1 silla para docente, 1 pantalla para proyector y 1 escritorio

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Tercer Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 30/09/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD

4 Nombre de la obra: Adquirir el equipamiento necesario en los espacios académicos de los Campus Norte y Campus Oriente.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

0%

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal: Pico de Orizaba #2, Col. Los Volcanes, C.P. 62350, Cuernavaca, Morelos.



Se equipará Aula de Miacatán con 1 silla para docente y 1 escritorio



Se equipará Aula Yecapixtla con 1 escritorio y 1 silla para docente



Se equipará Centro de autoacceso 1 con 1 proyector

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Tercer Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 30/09/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD

4 Nombre de la obra: Adquirir el equipamiento necesario en los espacios académicos de los Campus Norte y Campus Oriente.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS


Porcentaje de avance

0%


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

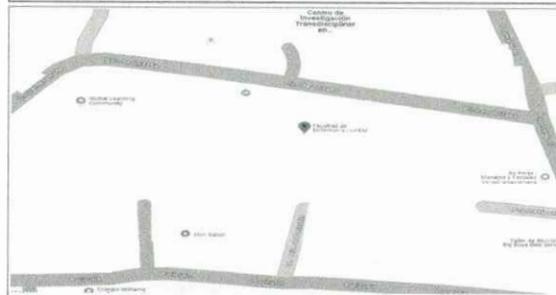


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

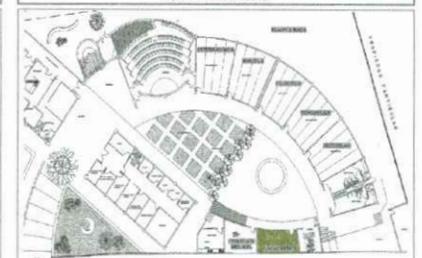

Dirección Postal: Pico de Orizaba #2, Col. Los Volcanes, C.P. 62350, Cuernavaca, Morelos.



Se equipará Centro de auto acceso 2 con 1 proyector

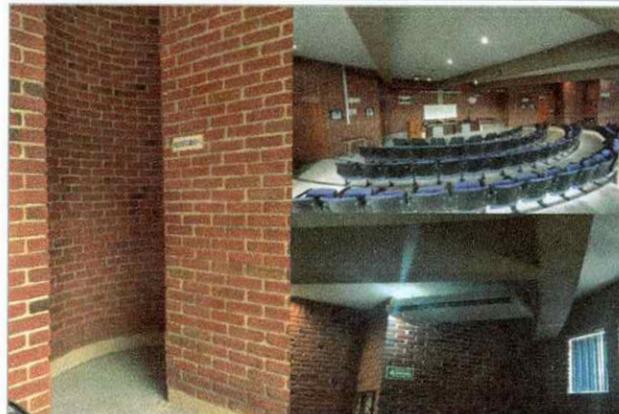

Se equipará Auditorio con 1 aire acondicionado

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

Dra. Viridiana Aydeé León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Dr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

NOTA

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Tercer Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 30/09/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD

4 Nombre de la obra: Adquirir el equipamiento necesario en los espacios académicos de los Campus Norte y Campus Oriente.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS


Porcentaje de avance

0%

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

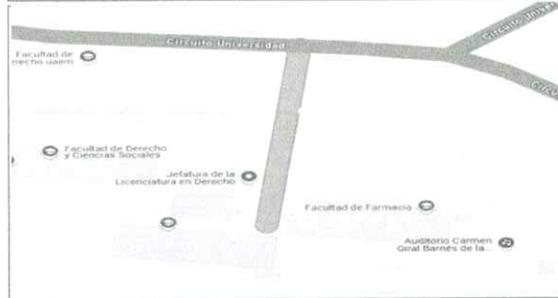


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal: Av. Universidad #1001, Colonia Chamilpa, Cuernavaca, Morelos, CP, 62209.

ANTES

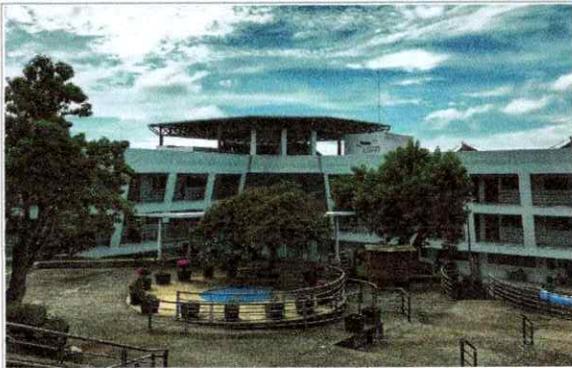

Fachada de la Facultad de Farmacia



Se equipará Laboratorio Farmacia Comunitaria con 2 escritorios recepción y 1 góndola a pared de 60 x 40 x 220 cm, 1 mueble cajonera para medicamentos, 2 anaqueles Farmacia, 3 anaqueles con medidas generales, 3 escritorios ejecutivos, 1 mueble cajonero para medicamentos, 1 estructura en aluminio anodizado, 2 lockers metálico en tándem, 1 mesa con doble repisa, 2 balanzas de precisión, 1 archivero Tam-Mex y 1 minisplit

Observaciones :

Lo presentado en el Reporte Fotográfico del segundo trimestre, corresponde a los espacios a intervenir mediante el fondo.

VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Tercer Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 30/09/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

0%




4

Nombre de la obra: Adquirir el equipamiento necesario en los espacios académicos de los Campus Norte y Campus Oriente.

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

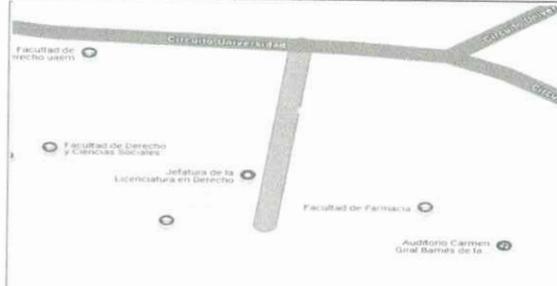

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS




Dirección Postal: Av. Universidad #1001, Colonia Chamilpa, Cuernavaca, Morelos, CP, 62209.





Se equipará Laboratorio de Docencia con 3 centrifugas clinicas para 6 tubos y 2 medidor de pH y mV de mesa



Se equipará Laboratorio de Simulación con 1 Espectrofotómetro UV Vis


Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura


Dra. Viridiana Ayde León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos


Dr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

NOTA

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Tercer Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 30/09/2025

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRICIDAD

4

Nombre de la obra: Adquirir el equipamiento necesario en los espacios académicos de los Campus Norte y Campus Oriente.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

0%


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal: Calle Iztaccihuatl #100, Col. Volcanes, C.P. 62350, Cuernavaca, Morelos.

ANTES



Fachada de la Facultad de Medicina



Se equipará Laboratorio de Fisiología y Farmacología con 1 Espectrofotómetro y 1 mesa de exploración con pierneras

Observaciones :

Lo presentado en el Reporte Fotográfico del segundo trimestre, corresponde a los espacios a intervenir mediante el fondo.

VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Tercer Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 30/09/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD

4 Nombre de la obra: Adquirir el equipamiento necesario en los espacios académicos de los Campus Norte y Campus Oriente.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS


Porcentaje de avance

0%


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

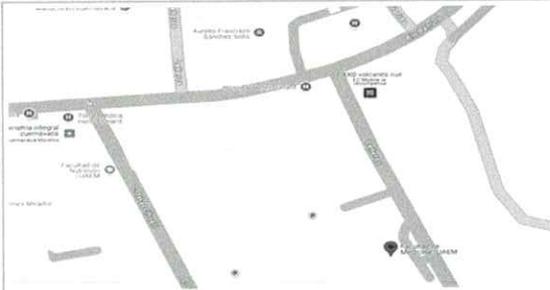

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal: Calle Iztaccihuatl #100, Col. Volcanes, C.P. 62350, Cuernavaca, Morelos.



Se equipará Laboratorio de Histología y Embriología con 5 microscopios binoculares



Se equipará Laboratorio de habilidades con 3 Maniqués paquete CPR y 2 maniqués paquete CPR Little junior.

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

Dra. Viridiana Aydeé León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Dr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

NOTA

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Tercer Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 30/09/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRICIDAD

4 Nombre de la obra: Adquirir el equipamiento necesario en los espacios académicos de los Campus Norte y Campus Oriente.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS


Porcentaje de avance

0%


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

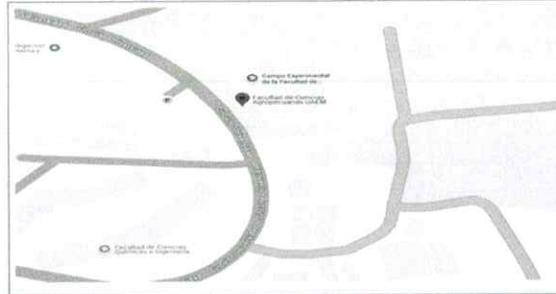

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal: Av. Universidad #1001, Col. Chamilpa, C.P. 62209, Cuernavaca, Morelos.

ANTES



Fachada de la Facultad de Ciencias Agropecuarias



Se equipará Laboratorio de Docencia Edificio 71 planta primer nivel con 5 Microscopios y 2 Anaqueles Metálicos

Observaciones :

Lo presentado en el Reporte Fotográfico del segundo trimestre, corresponde a los espacios a intervenir mediante el fondo.

VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Tercer Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 30/09/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIMORDIAL

4 Nombre de la obra Adquirir el equipamiento necesario en los espacios académicos de los Campus Norte y Campus Oriente.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS


Porcentaje de avance

0%


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

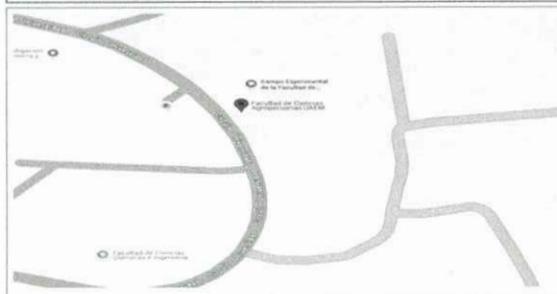

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS




Dirección Postal: Av. Universidad #1001, Col. Chamilpa, C.P. 62209, Cuernavaca, Morelos.



Se equipará Laboratorio de alimentos - Edificio 71 planta primer nivel con 1 Licuadora industrial, 1 empacadora al alto vacío, 1 horno para pan 4 charoitas tipo gaveta, 1 congelador horizontal, 2 mesas de trabajo



Se equipará Laboratorio 2 Producción Agrícola - Edificio 71 planta baja con 20 Bancos para laboratorio y 2 Anaqueles metálicos

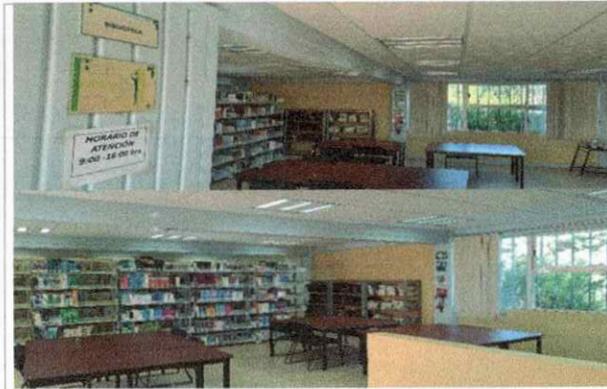

Se equipará Biblioteca - Edificio 72 planta baja con 1 Aire acondicionado

Arg. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

Dra. Viridiana Aydeé León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Dr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

NOTA

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Tercer Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 30/09/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD

4 Nombre de la obra: Adquirir el equipamiento necesario en los espacios académicos de los Campus Norte y Campus Oriente.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

0%

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal: Av. Universidad #1001, Col. Chamilpa, C.P. 62209, Cuernavaca, Morelos.

ANTES



Fachada de la Facultad de Ciencias del Deporte



Se equipará Laboratorio de Evaluación del Rendimiento con 1 tsensor, 3 plataformas de contacto DIN-A2, 2 sensores de fuerza y 1 WimU

Observaciones :

Lo presentado en el Reporte Fotográfico del segundo trimestre, corresponde a los espacios a intervenir mediante el fondo.

VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Tercer Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 30/09/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD

4 Nombre de la obra: Adquirir el equipamiento necesario en los espacios académicos de los Campus Norte y Campus Oriente.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

0%

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO




UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal: Av. Universidad #1001, Col. Chamilpa, C.P. 62209, Cuernavaca, Morelos.



Se equipará Laboratorio de Cognición y Psicología Deportiva con 2 Meta Quest 3 512gb 4k Lente de Realidad Virtual

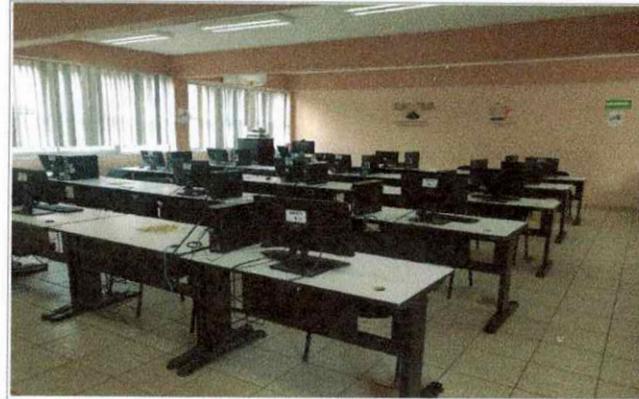

Se equipará Centro de Cómputo con 11 monitores, 11 CPU y 1 proyector

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

Dra. Viridiana Aydeé León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Dr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Tercer Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 30/09/2025

REPORTÉ FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD

5

Nombre de la obra: Construcción de la planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Escuela de Estudios Superiores del Jicarero



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS


Porcentaje de avance

5%


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

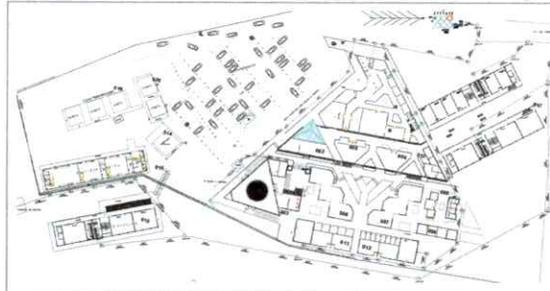

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

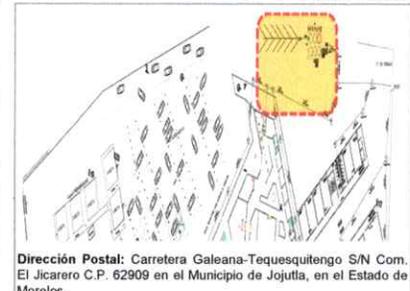

ANTES



Fachada de la Escuela de Estudios Superiores del Jicarero



Vista del sitio en donde se relizaran los trabajos de: Preliminares (Delimitar, Nivelacion, despalmes de terreno, excavaciones, compataciones entre otras), en la Escuela de Estudios Superiores del Jicarero.

Observaciones :

Lo presentado en el Reporte Fotográfico del tercer trimestre, corresponde a los espacios a intervenir mediante el fondo.

VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Tercer Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 30/09/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD

5

Nombre de la obra:

Construcción de la planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Escuela de Estudios Superiores del Jicarero



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS


Porcentaje de avance

5%


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

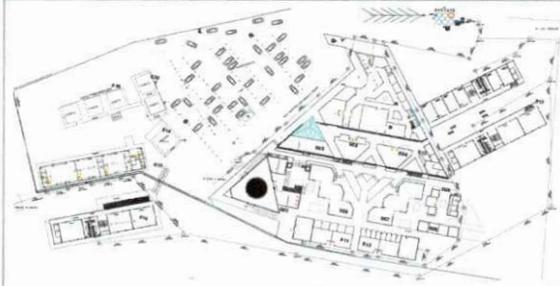

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal: Carretera Galeana-Tequesquitengo S/N Com. El Jicarero C.P. 62909 en el Municipio de Jojutla, en el Estado de Morelos.



Vista del sitio en donde se relizaran los trabajos de: Suministro y colocacion de Planta de tratamiento y Colocacion de rellenos,



Vista del sitio en donde se relizaran los trabajos de: Construccion de cuarto de maquina, Así, como la Construccion de Campo de Oxidacion, en la Escuela de Estudios Superiores del Jicarero.



Vista del sitio en donde se relizaran los trabajos de: Limpiezas en areas de trabajo, en la Escuela de Estudios Superiores del Jicarero.

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

Dra. Viridiana Aydeé León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Dr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

NOTA:

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.
