

2018

AÑO



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Octubre 2018

FECHA DE CORTE: 31/10/2018

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Entidad federativa: Morelos

Clave Inst 911: 17MSU0017P

RESPONSABLES

Planeación

Nombre: Álvaro Zamudio Lara  
Cargo: Coordinador General de Planeación y Administración  
Teléfono: (777) 3 29 70 00 Ext. 7033 y 4312  
Correo electrónico: azamudio@uaem.mx

Obras y Mantenimiento

Nombre: Filberto Suárez Díaz  
Cargo: Encargado de Despacho de la Dirección General de Infraestructura  
Teléfono: (777) 3 29 70 00 Ext. 3136  
Correo electrónico: fsuarez@uaem.mx



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Escudo de la universidad

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto <sup>1</sup>			Acciones que sustentan el avance <sup>2</sup>	Acciones por realizar	% de avance	Fechas <sup>3</sup>		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas		
		Obras de continuidad	Equipamiento	Adecuaciones y mejoras	Mantenimiento				Proyecto sustantiable	Espacio/equipo	cantidad				metros cuadrados	Inicio			Término	¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega- Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega- Recepción
1	Mantenimiento de espacios académicos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos				X	\$ 23,942,675.22		\$ 23,942,675.22									GLOBAL DEL PROYECTO	Mediante oficio CGPyA/044/2018 signado por el Dr. Álvaro Zamudio Lara, Coordinador General de Planeación y Administración de la UAEM, se comunica que a la fecha del presente aún no es ministrado el recurso a la institución, sin embargo se están haciendo las gestiones pertinentes, se adjunta oficio enviado por el C.P. Luis Antonio Gutiérrez Aguilar, Director General de Proyectos de Inversión de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno del Estado de Morelos, en el cual me notifica que para la asignación y liberación del recurso se deberá registrar el proyecto en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión en el Sistema de la Unidad de Inversión Estatal (SUIE), lo cual ha sido atendido.					
									TOTAL	0	0.00						GLOBAL DEL PROYECTO	Mediante oficio CGPyA/044/2018 signado por el Dr. Álvaro Zamudio Lara, Coordinador General de Planeación y Administración de la UAEM, se comunica que a la fecha del presente aún no es ministrado el recurso a la institución, sin embargo se están haciendo las gestiones pertinentes, se adjunta oficio enviado por el C.P. Luis Antonio Gutiérrez Aguilar, Director General de Proyectos de Inversión de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno del Estado de Morelos, en el cual me notifica que para la asignación y liberación del recurso se deberá registrar el proyecto en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión en el Sistema de la Unidad de Inversión Estatal (SUIE), lo cual ha sido atendido.					
3	Adecuación y mejoras de espacios académicos del Campus Oriente				X	\$ 1,873,895.22		\$ 1,873,895.22									GLOBAL DEL PROYECTO	Mediante oficio CGPyA/044/2018 signado por el Dr. Álvaro Zamudio Lara, Coordinador General de Planeación y Administración de la UAEM, se comunica que a la fecha del presente aún no es ministrado el recurso a la institución, sin embargo se están haciendo las gestiones pertinentes, se adjunta oficio enviado por el C.P. Luis Antonio Gutiérrez Aguilar, Director General de Proyectos de Inversión de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno del Estado de Morelos, en el cual me notifica que para la asignación y liberación del recurso se deberá registrar el proyecto en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión en el Sistema de la Unidad de Inversión Estatal (SUIE), lo cual ha sido atendido.					
						\$25,816,570.44	\$0.00	\$25,816,570.44															

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán  
Rector


C.P. Filberto Suárez Díaz  
Encargado de Despacho de la Dirección General de Infraestructura

<sup>1</sup> Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta filas como sea necesario.  
<sup>2</sup> En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.  
<sup>3</sup> Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD **1** Nombre de la obra: **Mantenimiento de espacios académicos de Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

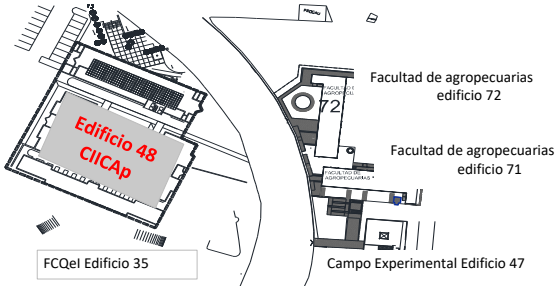

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Avenida Universidad # 1001 Colonia Chamilpa, Código Postal 62209, Cuernavaca, Morelos



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Escudo de la universidad

Porcentaje de avance

0%

FOTOGRAFÍAS (EL ANTES)



F1: Fachada principal



F2: lateral

Comentarios de los trabajos realizados:

Trabajos pendientes a realizarse:

1. Fachada principal (F1)
2. Fachada lateral (F2)
3. Impermeabilización de azoteas (F3)
4. Impermeabilización de azoteas (F4)

Mediante oficio **CGPyA/944/2018** signado por el Dr. Álvaro Zamudio Lara, Coordinador General de Planeación y Administración de la UAEM, se comunica que a la fecha del presente aún no es ministrado el recurso a la institución, sin embargo se están haciendo las gestiones pertinentes, se adjunta oficio enviado por el C.P. Luis Antonio Gutiérrez Aguilar, Director General de Proyectos de Inversión de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno del Estado de Morelos, en el cual me notifica que para la asignación y liberación del recurso se deberá registrar el proyecto en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión en el Sistema de la Unidad de Inversión Estatal (SUIE), lo cual ha sido atendido.



F3: Fachada posterior



F4: Entrada

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán  
Rector

C.P. Filiberto Suárez Díaz  
Encargado de Despacho de la Dirección General de Infraestructura

\*Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD **1** Nombre de la obra: **Mantenimiento de espacios académicos del Centro de Investigaciones Químicas**





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Escudo de la universidad

Porcentaje de avance

0%

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

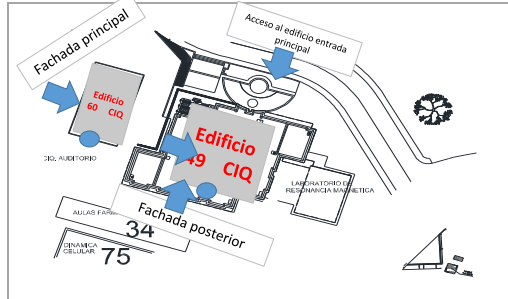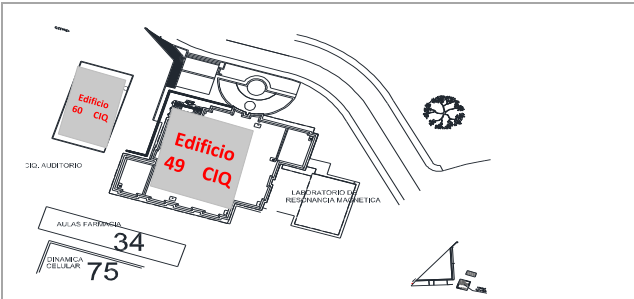

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Avenida Universidad # 1001 Colonia Chamilpa, Código Postal 62209, Cuernavaca, Morelos

FOTOGRAFÍAS (EL ANTES)



F1: Fachada principal edif. 49



F2: Fachada Principal del Edificio 60

Comentarios de los trabajos realizados:

Trabajos pendientes a realizarse:

1. Impermeabilización edificio 49 (F1, F3 y F4).
2. Impermeabilización edificio 60 (F2 y F5).

Mediante oficio **CGPyA/944/2018** signado por el Dr. Álvaro Zamudio Lara, Coordinador General de Planeación y Administración de la UAEM, se comunica que a la fecha del presente aún no es ministrado el recurso a la institución, sin embargo se están haciendo las gestiones pertinentes, se adjunta oficio enviado por el C.P. Luis Antonio Gutiérrez Aguilar, Director General de Proyectos de Inversión de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno del Estado de Morelos, en el cual me notifica que para la asignación y liberación del recurso se deberá registrar el proyecto en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión en el Sistema de la Unidad de Inversión Estatal (SUIE), lo cual ha sido atendido.



F3: Techo Edificio 49



F4: Techo Edificio 49



F5: Techo edificio 60

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán  
Rector

C.P. Filiberto Suárez Díaz  
Encargado de Despacho de la Dirección General de Infraestructura

\*Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.



REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL


PRIORIDAD

1

Nombre de la obra:


Mantenimiento de espacios académicos del Centro de Investigación en Ciencias (CInC)

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

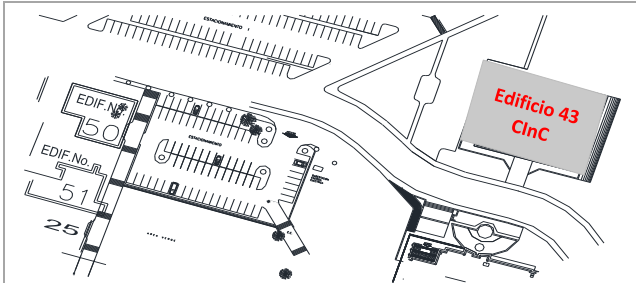

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Avenida Universidad # 1001 Colonia Chamilpa,  
Código Postal 62209, Cuernavaca, Morelos

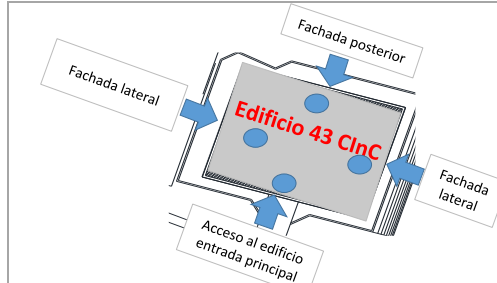

Escudo de la universidad

Porcentaje de avance

0%

FOTOGRAFÍAS (EL ANTES)



F1: Tableros eléctricos actuales



F2: Conductores eléctricos

Comentarios de los trabajos realizados:

Trabajos pendientes a realizarse:

1. Cambio de tableros eléctricos (F1)
2. Reacomodo general de conductores eléctricos y balanceo de cargas (F2)
3. Reubicación y mantenimiento de aires acondicionados del edificio (F3)
4. Mantenimiento y remodelación de sanitarios (F4)
5. Sustitución de lámparas fluorescentes por tecnología led (F5)

Mediante oficio **CGPyA/944/2018** signado por el Dr. Álvaro Zamudio Lara, Coordinador General de Planeación y Administración de la UAEM, se comunica que a la fecha del presente aún no es ministrado el recurso a la institución, sin embargo se están haciendo las gestiones pertinentes, se adjunta oficio enviado por el C.P. Luis Antonio Gutiérrez Aguilar, Director General de Proyectos de Inversión de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno del Estado de Morelos, en el cual me notifica que para la asignación y liberación del recurso se deberá registrar el proyecto en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión en el Sistema de la Unidad de Inversión Estatal (SUIE), lo cual ha sido atendido.



F3: Aires acondicionados



F4: Sanitarios



F5: Lámparas

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán  
Rector

C.P. Filiberto Suárez Díaz  
Encargado de Despacho de la Dirección General de Infraestructura

\*Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.



2018

AÑO

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Octubre 2018

FECHA DE CORTE: 31/10/2018

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL


PRIORIDAD

1

Nombre de la obra:

Mantenimiento de espacios académicos del Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAp)

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

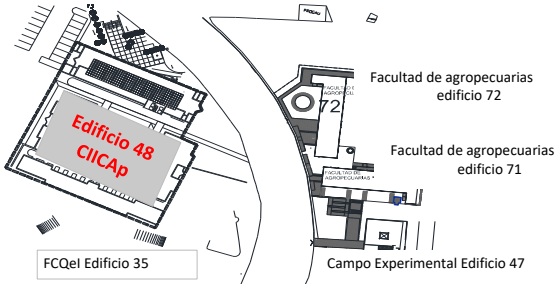

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Avenida Universidad # 1001 Colonia Chamilpa, Código Postal 62209, Cuernavaca, Morelos



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Escudo de la universidad

Porcentaje de avance

0%

FOTOGRAFÍAS (EL ANTES)



F1: Planta de emergencia



F2: Instalaciones Eléctricas

Comentarios de los trabajos realizados:

Trabajos pendientes a realizarse:

1. Mantenimiento a planta de emergencia (F1).
2. Normalización de las instalaciones eléctrica (F2).
3. Instalación de sistema de tierras para las nuevas instalaciones (F3).
4. Mantenimiento y aplicación de pintura en laboratorios de investigación (F4).
5. Pavimentación y fabricación de muro con puerta de acceso para adecuación de espacio para laboratorio e instalación de servicios de luz y agua (F5).

Mediante oficio **CGPyA/944/2018** signado por el Dr. Álvaro Zamudio Lara, Coordinador General de Planeación y Administración de la UAEM, se comunica que a la fecha del presente aún no es ministrado el recurso a la institución, sin embargo se están haciendo las gestiones pertinentes, se adjunta oficio enviado por el C.P. Luis Antonio Gutiérrez Aguilar, Director General de Proyectos de Inversión de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno del Estado de Morelos, en el cual me notifica que para la asignación y liberación del recurso se deberá registrar el proyecto en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión en el Sistema de la Unidad de Inversión Estatal (SUIE), lo cual ha sido atendido.



F3: Instalación sistema de tierras



F4: Laboratorios de investigación



F5: Interior de aula (laboratorio)

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán  
Rector

C.P. Filiberto Suárez Díaz  
Encargado de Despacho de la Dirección General de Infraestructura

\*Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



PRIORIDAD

1

Nombre de la obra:

Mantenimiento de espacios académicos del Centro de Investigaciones Químicas (CIQ)

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

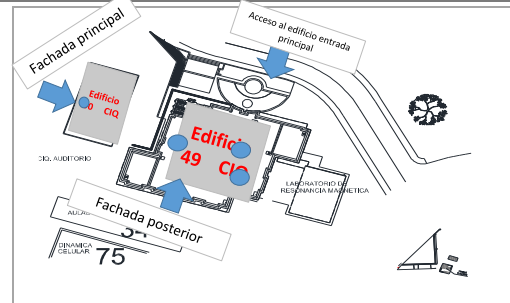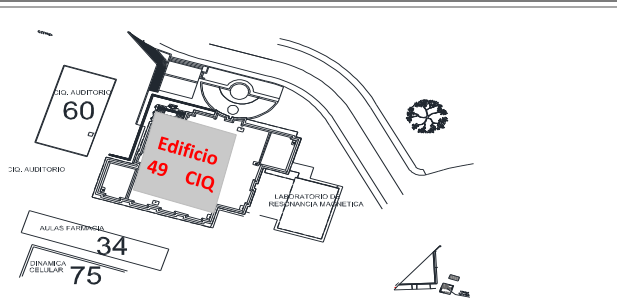

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Avenida Universidad # 1001 Colonia Chamilpa,  
Código Postal 62209, Cuernavaca, Morelos



Escudo de la universidad

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Escudo de la universidad

Porcentaje de avance

0%

FOTOGRAFÍAS (EL ANTES)



F1: Edificio 49 (exterior)



F2: Edificio 60 (interior)

Comentarios de los trabajos realizados:

Trabajos pendientes a realizarse:

1. Mantenimiento de pintura general de edificios 49 y 60 (interior y exterior) (F1 y F2).
2. Mantenimiento preventivo y correctivo para equipos especializados de laboratorio (F3).
3. Mantenimiento y remodelación de sanitarios (F4).
4. Mantenimiento a bomba general de vacío (F5).

Mediante oficio **CGPyA/944/2018** signado por el Dr. Álvaro Zamudio Lara, Coordinador General de Planeación y Administración de la UAEM, se comunica que a la fecha del presente aún no es ministrado el recurso a la institución, sin embargo se están haciendo las gestiones pertinentes, se adjunta oficio enviado por el C.P. Luis Antonio Gutiérrez Aguilar, Director General de Proyectos de Inversión de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno del Estado de Morelos, en el cual me notifica que para la asignación y liberación del recurso se deberá registrar el proyecto en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión en el Sistema de la Unidad de Inversión Estatal (SUIE), lo cual ha sido atendido.



F3: Equipos especializados de laboratorio



F4: Sanitarios



F5: Bomba General de vacío

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán  
Rector

C.P. Filiberto Suárez Díaz  
Encargado de Despacho de la Dirección General de Infraestructura

\*Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.



2018

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Octubre 2018

FECHA DE CORTE: 31/10/2018

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL


PRIORIDAD

1

Nombre de la obra:

Mantenimiento de espacios académicos del Centro de Investigación en Dinámica Celular

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Avenida Universidad # 1001 Colonia Chamilpa,  
Código Postal 62209, Cuernavaca, Morelos



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Escudo de la universidad

Porcentaje de avance

0%

FOTOGRAFÍAS (EL ANTES)



F1: Pintura de Edificio (interior y exterior)



F2: Sistema de tierras físicas

Comentarios de los trabajos realizados:

Trabajos pendientes a realizarse:

1. Mantenimiento de pintura del edificio (interior y exterior). (F1)
2. Mantenimiento al edificio para complementar al sistema de tierras. (F2)
3. Adecuación de entradas del inmueble. (F3)
4. Iluminación exterior del edificio. (F4)
5. Mantenimiento a equipos de refrigeración y aires acondicionados. (F5)
6. Remodelación de sanitarios. (F6)

Mediante oficio **CGPyA/944/2018** signado por el Dr. Álvaro Zamudio Lara, Coordinador General de Planeación y Administración de la UAEM, se comunica que a la fecha del presente aún no es ministrado el recurso a la institución, sin embargo se están haciendo las gestiones pertinentes, se adjunta oficio enviado por el C.P. Luis Antonio Gutiérrez Aguilar, Director General de Proyectos de Inversión de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno del Estado de Morelos, en el cual me notifica que para la asignación y liberación del recurso se deberá registrar el proyecto en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión en el Sistema de la Unidad de Inversión Estatal (SUIE), lo cual ha sido atendido.



F3: Entrada del inmueble



F4: Exterior del edificio

F5: Equipos de refrigeración y aires acondicionados



F6: Sanitarios

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán  
Rector

C.P. Filiberto Suárez Díaz  
Encargado de Despacho de la Dirección General de Infraestructura

\*Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.



2018

AÑO

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

**Octubre 2018**

FECHA DE CORTE: 31/10/2018

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD

1

Nombre de la obra:

**Mantenimiento de espacios académicos del Centro de Investigaciones Biológicas (CIB)**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Avenida Universidad # 1001 Colonia Chamilpa,  
Código Postal 62209, Cuernavaca, Morelos



Escudo de la universidad


Porcentaje de avance

0%

FOTOGRAFÍAS (EL ANTES)



F1: Puerta de acceso (exterior)

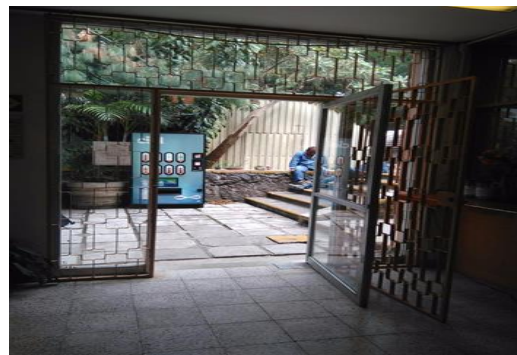

F2: lateral (interior)

Comentarios de los trabajos realizados:

Trabajos pendientes a realizarse:

1. Mantenimiento correctivo a 1 puerta de acceso del Centro de Investigaciones Biológicas estructura en mal estado (F1 y F2)
2. Mantenimiento correctivo a puertas de laboratorios y puertas de baños en mal estado del edificio 14 del CIB (F3,F4 y F5)

Mediante oficio **CGPyA/944/2018** signado por el Dr. Álvaro Zamudio Lara, Coordinador General de Planeación y Administración de la UAEM, se comunica que a la fecha del presente aún no es ministrado el recurso a la institución, sin embargo se están haciendo las gestiones pertinentes, se adjunta oficio enviado por el C.P. Luis Antonio Gutiérrez Aguilar, Director General de Proyectos de Inversión de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno del Estado de Morelos, en el cual me notifica que para la asignación y liberación del recurso se deberá registrar el proyecto en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión en el Sistema de la Unidad de Inversión Estatal (SUIE), lo cual ha sido atendido.



F3: Puertas



F4: Puertas



F5: Puertas

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán  
Rector

C.P. Filiberto Suárez Díaz  
Encargado de Despacho de la Dirección General de Infraestructura

\*Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2018

AÑO

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Octubre 2018

FECHA DE CORTE: 31/10/2018

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL


PRIORIDAD

1

Nombre de la obra:

Impermeabilización del techo de la Escuela de Estudios Superiores de Miacatlán

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

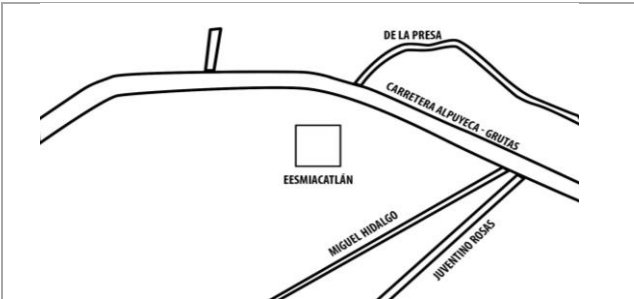

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Alpuyeca - Grutas S/N, Col. La toma, Miacatlán, Mor.



Escudo de la universidad

Porcentaje de avance

0%

FOTOGRAFÍAS DEL ANTES



F1: Fachada principal




F2: Techo del edificio

Comentarios de los trabajos realizados:

Trabajos pendientes a realizarse:

- 1.- Impermeabilización del edificio (F1,F2, F3, F4 y F5)

Mediante oficio **CGPyA/944/2018** signado por el Dr. Álvaro Zamudio Lara, Coordinador General de Planeación y Administración de la UAEM, se comunica que a la fecha del presente aún no es ministrado el recurso a la institución, sin embargo se están haciendo las gestiones pertinentes, se adjunta oficio enviado por el C.P. Luis Antonio Gutiérrez Aguilar, Director General de Proyectos de Inversión de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno del Estado de Morelos, en el cual me notifica que para la asignación y liberación del recurso se deberá registrar el proyecto en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión en el Sistema de la Unidad de Inversión Estatal (SUIE), lo cual ha sido atendido.

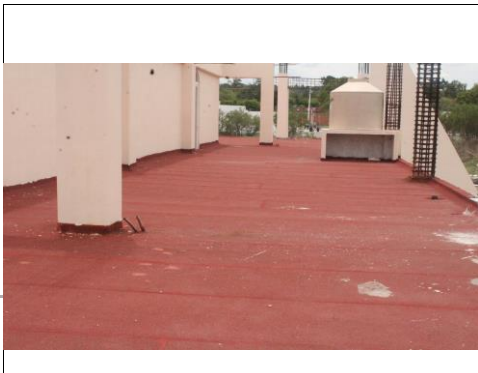

F3: Techo del edificio



F4: Techo del edificio



F5: Techo del edificio

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán  
Rector

C.P. Filiberto Suárez Díaz  
Encargado de Despacho de la Dirección General de Infraestructura

\*Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.



2018

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Octubre 2018

FECHA DE CORTE: 31/10/2018

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD

1

Nombre de la obra:

Mantenimiento de espacios académicos de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería (Impermeabilizante para el Laboratorio de Operaciones Unitarias y Tamulba)





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Escudo de la universidad

Porcentaje de avance

0%

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

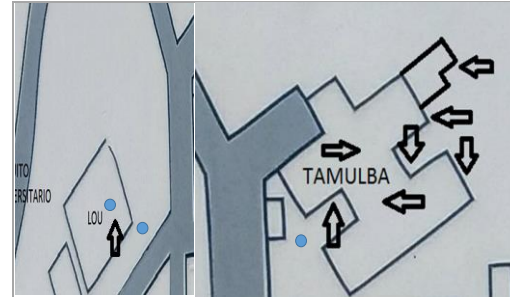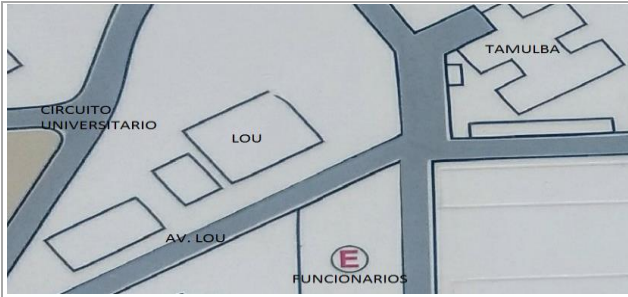

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Avenida LOU esquina Circuito Universitario, Edificio No15, Colonia Chamilpa, C.P. 62209, Cuernavaca, Morelos. Edificio 15 LOU, EDIFICIO 4 TAMULBA

FOTOGRAFÍAS (EL ANTES)



F1: Fachada principal LOU



F2: lateral LOU

Comentarios de los trabajos realizados:

Trabajos pendientes a realizarse:

1. Impermeabilizado de 1,310 m2 en techo de lamina LOU (F1,F2 y F5).
2. Impermeabilizado de 1,200 m2 en techo de lamina de Tamulba (F3 y F4).

Mediante oficio CGPyA/944/2018 signado por el Dr. Álvaro Zamudio Lara, Coordinador General de Planeación y Administración de la UAEM, se comunica que a la fecha del presente aún no es ministrado el recurso a la institución, sin embargo se están haciendo las gestiones pertinentes, se adjunta oficio enviado por el C.P. Luis Antonio Gutiérrez Aguilar, Director General de Proyectos de Inversión de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno del Estado de Morelos, en el cual me notifica que para la asignación y liberación del recurso se deberá registrar el proyecto en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión en el Sistema de la Unidad de Inversión Estatal (SUIE), lo cual ha sido atendido.



F3: Techo TAMULBA



F4: Entrada TAMULBA



F5: Interior de aula LOU

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán  
Rector

C.P. Filiberto Suárez Díaz  
Encargado de Despacho de la Dirección General de Infraestructura

\*Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.



**REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL**



PRIORIDAD

1

Nombre de la obra:

**Mantenimiento de espacios académicos de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería FCQel**

**CROQUIS DE LOCALIZACIÓN**

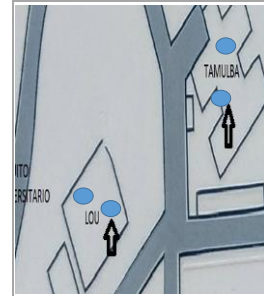

**UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO**

Avenida Universidad # 1001 Colonia Chamilpa,  
Código Postal 62209, Cuernavaca, Morelos



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Estado de la universidad

Porcentaje de avance

0%

**FOTOGRAFÍAS (EL ANTES)**



F1: Sanitarios



F2: TAMULBA (Interior y Exterior)

**Comentarios de los trabajos realizados:**

Trabajos pendientes a realizarse:

1. Cambio de muebles sanitarios por ahorradores. 12 pzas (F1)
2. Aplicación de pintura blanca, gris y azul marino para Tamulba. Salones, laboratorios, mezzanine, fachada principal y oficinas (F2)
3. Suministro y colocación de luminarias para TAMULBA y FCQel 15 de 120-led/20w, luz de día, tipo base g5. 200 piezas (F3)
4. Cambio de 20 mezcladoras cuello de ganso con doble llave para tarja de laboratorio (F4)
5. Pintura de 13 sadineles con 200 m2 y Pintura de 9 almacenes temporales de residuos con 100 m2 (F5)

Mediante oficio **CGPyA/944/2018** signado por el Dr. Álvaro Zamudio Lara, Coordinador General de Planeación y Administración de la UAEM, se comunica que a la fecha del presente aún no es ministrado el recurso a la institución, sin embargo se están haciendo las gestiones pertinentes, se adjunta oficio enviado por el C.P. Luis Antonio Gutiérrez Aguilar, Director General de Proyectos de Inversión de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno del Estado de Morelos, en el cual me notifica que para la asignación y liberación del recurso se deberá registrar el proyecto en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión en el Sistema de la Unidad de Inversión Estatal (SUIE), lo cual ha sido atendido.



F3: TAMULBA-FCQel



F4: FCQel-LOU



F5: FCQel-LOU

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán  
Rector

C.P. Filiberto Suárez Díaz  
Encargado de Despacho de la Dirección General de Infraestructura

2018

AÑO

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Octubre 2018

FECHA DE CORTE: 31/10/2018

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



PRIORIDAD

1

Nombre de la obra:

Mantenimiento de espacios académicos del Instituto de Ciencias de la Educación ICE

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

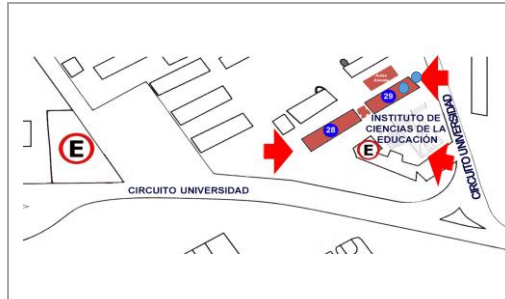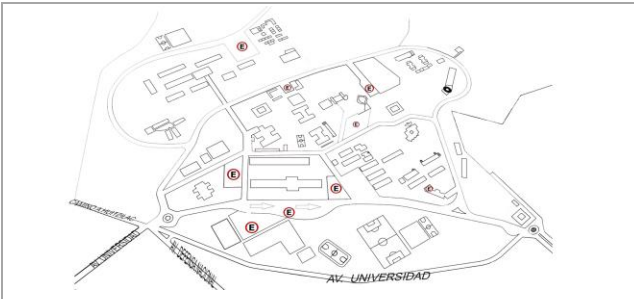

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Avenida Universidad #1001, colonia Chamilpa, Cuernavaca, Morelos; México. Edificios 28 y 29



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Escudo de la universidad

Porcentaje de avance

0%

FOTOGRAFÍAS (EL ANTES)



F1: Fachada principal



F2: Techo edificio 29

Comentarios de los trabajos realizados:

Trabajos pendientes a realizarse:

1.- Impermeabilización de azotea del edificio 29 del Instituto de Ciencias de la Educación. (F1, F2, F3, F4 y F5)

Mediante oficio **CGPyA/944/2018** signado por el Dr. Álvaro Zamudio Lara, Coordinador General de Planeación y Administración de la UAEM, se comunica que a la fecha del presente aún no es ministrado el recurso a la institución, sin embargo se están haciendo las gestiones pertinentes, se adjunta oficio enviado por el C.P. Luis Antonio Gutiérrez Aguilar, Director General de Proyectos de Inversión de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno del Estado de Morelos, en el cual me notifica que para la asignación y liberación del recurso se deberá registrar el proyecto en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión en el Sistema de la Unidad de Inversión Estatal (SUIE), lo cual ha sido atendido.



F3: Techo edificio 29



F4: Techo edificio 29



F5: Techo edificio 29

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán  
Rector

C.P. Filiberto Suárez Díaz  
Encargado de Despacho de la Dirección General de Infraestructura

\*Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.



REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



PRIORIDAD

1

Nombre de la obra:

Mantenimiento de espacios académicos del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE)

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

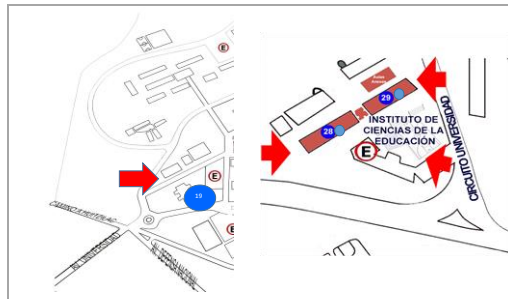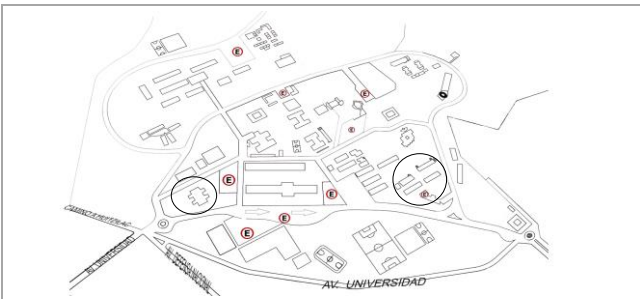

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Avenida Universidad # 1001 Colonia Chamilpa,  
 Código Postal 62209, Cuernavaca, Morelos




UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Escudo de la universidad

Porcentaje de avance

0%

FOTOGRAFÍAS (EL ANTES)

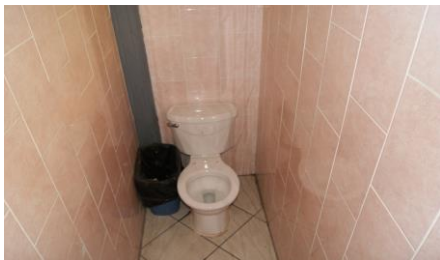

F1: Escusados



F2: Escusados

Comentarios de los trabajos realizados:

Trabajos pendientes a realizarse:

1. Baños del edificio 28 y 29 que se requieren reemplazar excusados por escusados ahorradores de agua (F1 y F2).
2. Baños del edificio 28 y 29 que requieren reemplazar mingitorios de carga de agua por mingitorios secos (ecológicos) (F3).
3. Cambiar las lámpara obsoletas por lámpara ahorradoras de energía de aulas de los edificios 28, 29 y 19 de posgrado (F4).
4. Cambio de cableado eléctrico (F5).


Mediante oficio **CGPyA/944/2018** signado por el Dr. Álvaro Zamudio Lara, Coordinador General de Planeación y Administración de la UAEM, se comunica que a la fecha del presente aún no es ministrado el recurso a la institución, sin embargo se están haciendo las gestiones pertinentes, se adjunta oficio enviado por el C.P. Luis Antonio Gutiérrez Aguilar, Director General de Proyectos de Inversión de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno del Estado de Morelos, en el cual me notifica que para la asignación y liberación del recurso se deberá registrar el proyecto en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión en el Sistema de la Unidad de Inversión Estatal (SUIE), lo cual ha sido atendido.



F3: Mingitorios



F4: Aulas

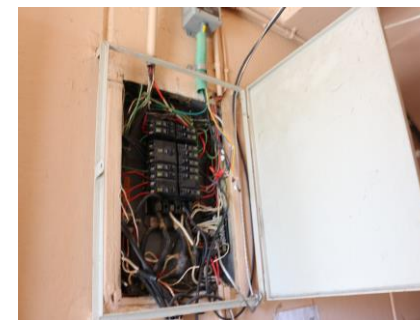

F5: Cableado Eléctrico

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán  
 Rector

C.P. Filiberto Suárez Díaz  
 Encargado de Despacho de la Dirección General de Infraestructura

\*Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.



2018

AÑO

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

**Octubre 2018**

FECHA DE CORTE: 31/10/2018

**REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL**



PRIORIDAD

1

Nombre de la obra:

**Mantenimiento de espacios académicos de la Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec**

**CROQUIS DE LOCALIZACIÓN**

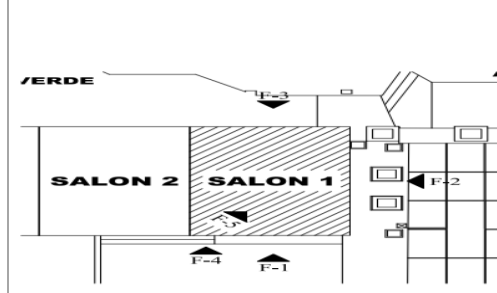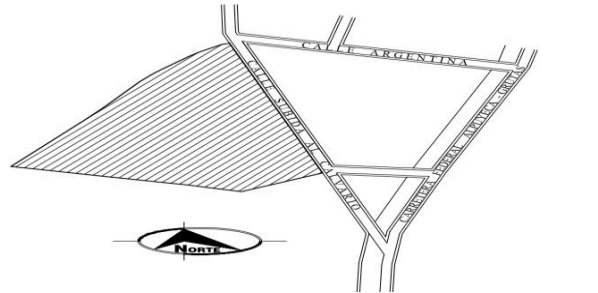

**UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO**

SUBIDA AL CALVARIO S/N, COLONIA JUSTO SIERRA, MAZATEPEC, MORELOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Escudo de la universidad

Porcentaje de avance

0%

**FOTOGRAFÍAS (EL ANTES)**



F1: Exterior de aula



F2: Interior de aula

**Comentarios de los trabajos realizados:**

Trabajos pendientes a realizarse:

- 1.- Suministro y aplicación de pintura vinílica, esmalte o impermeabilizante a muros en el interior y exterior de las aulas. (F1 y F2).
- 2.- Suministro y aplicación de pintura vinílica a herrerías como puertas y ventanas. (F3 y F4).
- 3.- Suministro y aplicación de pintura vinílica al plafón y techos de las aulas. (F5).


Mediante oficio **CGPyA/944/2018** signado por el Dr. Álvaro Zamudio Lara, Coordinador General de Planeación y Administración de la UAEM, se comunica que a la fecha del presente aún no es ministrado el recurso a la institución, sin embargo se están haciendo las gestiones pertinentes, se adjunta oficio enviado por el C.P. Luis Antonio Gutiérrez Aguilar, Director General de Proyectos de Inversión de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno del Estado de Morelos, en el cual me notifica que para la asignación y liberación del recurso se deberá registrar el proyecto en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión en el Sistema de la Unidad de Inversión Estatal (SUIE), lo cual ha sido atendido.



F3: Interior, ventanas aula



F4: Herrerías

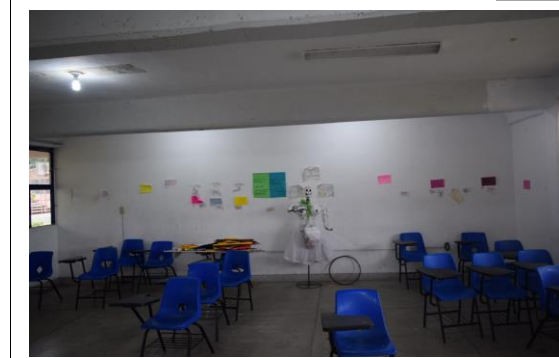

F5: Interior de aula

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán  
Rector

C.P. Filiberto Suárez Díaz  
Encargado de Despacho de la Dirección General de Infraestructura

\*Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



PRIORIDAD

3

Nombre de la obra:

**Mantenimiento de espacios académicos de la Escuela de Estudios Superiores de Tetela del Volcán EESTEVL**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

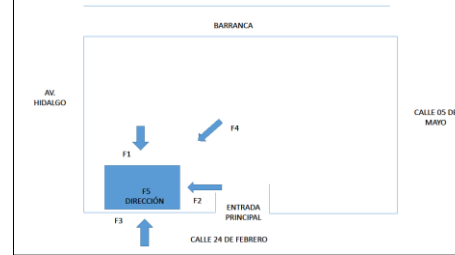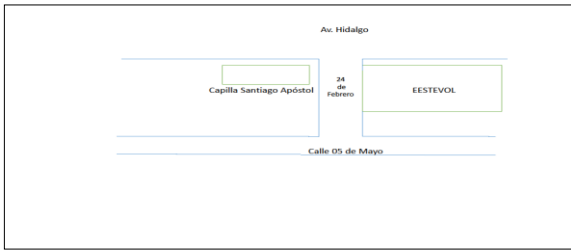

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Calle 24 de Febrero , Barrio Santiago S/N, Tetela del Volcán, Morelos, C.P. 62800.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

0%

FOTOGRAFÍAS (EL ANTES)



F1: Edificio de Dirección



F2: Edificio Principal



F3: Edificio Principal



F4: Centro de Cómputo



F5: Centro de Cómputo

Comentarios de los trabajos realizados:

Trabajos pendientes a realizarse:

1. Impermeabilización del Edificio de dirección (F1)
2. Impermeabilización del Edificio principal (F2) y (F3)
3. Impermeabilización del Centro de cómputo (F4) y (F5)

Mediante oficio **CGPyA/944/2018** signado por el Dr. Álvaro Zamudio Lara, Coordinador General de Planeación y Administración de la UAEM, se comunica que a la fecha del presente aún no es ministrado el recurso a la institución, sin embargo se están haciendo las gestiones pertinentes, se adjunta oficio enviado por el C.P. Luis Antonio Gutiérrez Aguilar, Director General de Proyectos de Inversión de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno del Estado de Morelos, en el cual me notifica que para la asignación y liberación del recurso se deberá registrar el proyecto en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión en el Sistema de la Unidad de Inversión Estatal (SUIE), lo cual ha sido atendido.

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán  
 Rector

C.P. Filiberto Suárez Díaz  
 Encargado de Despacho de la Dirección General de Infraestructura



2018

AÑO

FAM  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Octubre 2018

FECHA DE CORTE: 31/10/2018

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL


PRIORIDAD

3

Nombre de la obra:

Mantenimiento de espacios académicos de la Escuela de Estudios Superiores de Tetela del Volcán.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

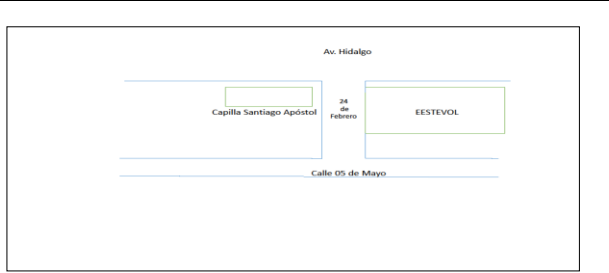

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Calle 24 de Febrero, Barrio Santiago S/N, Tetela del Volcán, Morelos, C.P. 62800.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

0%

FOTOGRAFÍAS (EL ANTES)



F1: Edificio Principal



F2: Edificio Dirección

Comentarios de los trabajos realizados:

Trabajos pendientes a realizarse:

1. Pintado de edificio principal, aplicación de pintura acrílica en: muros, columnas, traves y plafones (F1)
2. Pintado de edificio de dirección, aplicación de pintura acrílica en: muros, columnas, traves y plafones (F2)
3. Cambio de 12 muebles sanitarios por ecológicos; cambio de 1 mijitorio colectivo por 6 mijitorios individuales y cambio de 4 lavabos con llaves (F3)
4. Pintado de edificio de cómputo, aplicación de pintura acrílica, en muros, columnas, traves y plafones (F4)
5. Colocación de piso de pasillo de planta alta (F5)

Mediante oficio **CGPyA/944/2018** signado por el Dr. Álvaro Zamudio Lara, Coordinador General de Planeación y Administración de la UAEM, se comunica que a la fecha del presente aún no es ministrado el recurso a la institución, sin embargo se están haciendo las gestiones pertinentes, se adjunta oficio enviado por el C.P. Luis Antonio Gutiérrez Aguilar, Director General de Proyectos de Inversión de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno del Estado de Morelos, en el cual me notifica que para la asignación y liberación del recurso se deberá registrar el proyecto en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión en el Sistema de la Unidad de Inversión Estatal (SUIE), lo cual ha sido atendido.



F3: Sanitarios



F4: Centro de Cómputo



F5: Pasillo planta alta

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán  
Rector

C.P. Filiberto Suárez Díaz  
Encargado de Despacho de la Dirección General de Infraestructura

\*Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.



**REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL**



PRIORIDAD

**3**

Nombre de la obra:

**Mantenimiento de espacios académicos de la Escuela de Estudios Superiores de Tetela del Volcán EESTEVOI**

**CROQUIS DE LOCALIZACIÓN**

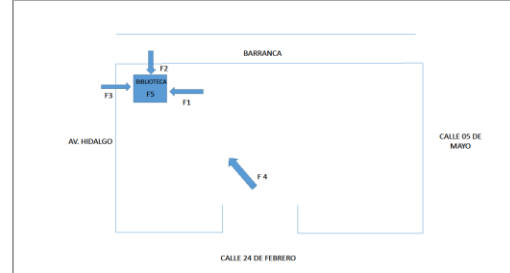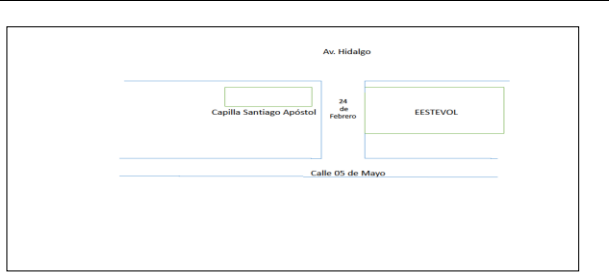

**UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO**

Calle 24 de Febrero, Barrio Santiago S/N, Tetela del Volcán, Morelos, C.P. 62800.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

0%

**FOTOGRAFÍAS (EL ANTES)**



F1: Biblioteca



F2: Centro de Cómputo



**Comentarios de los trabajos realizados:**

Obras pendientes a realizarse:

1. Colocación de piso en la biblioteca (F1)
2. Colocación de piso en el centro de cómputo (F2)
3. Colocación de piso para 4 aulas (F3)
4. Colocación de piso para el salón de usos múltiples, pasillo planta alta y escaleras (F4 Y F5) .

Mediante oficio **CGPyA/944/2018** signado por el Dr. Álvaro Zamudio Lara, Coordinador General de Planeación y Administración de la UAEM, se comunica que a la fecha del presente aún no es ministrado el recurso a la institución, sin embargo se están haciendo las gestiones pertinentes, se adjunta oficio enviado por el C.P. Luis Antonio Gutiérrez Aguilar, Director General de Proyectos de Inversión de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno del Estado de Morelos, en el cual me notifica que para la asignación y liberación del recurso se deberá registrar el proyecto en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión en el Sistema de la Unidad de Inversión Estatal (SUIE), lo cual ha sido atendido.



F3: Aulas



F4: Salón de Usos Múltiples



F5: Salón de Usos Múltiples

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán  
Rector

C.P. Filiberto Suárez Díaz  
Encargado de Despacho de la Dirección General de Infraestructura

\*Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2018

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Octubre 2018

FECHA DE CORTE: 31/10/2018

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD

3


Nombre de la obra:

Adecuación de la cisterna hidráulica de la Escuela de Estudios Superiores de Atlatlahucan

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



Calle Universidad

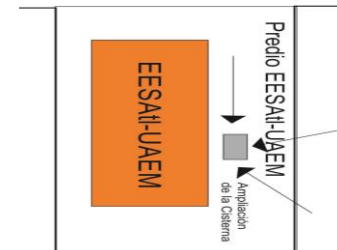

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Calle Universidad S/N Barrio San Antonio Atlatlahucan, Morelos C.P. 62840



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Escudo de la universidad

Porcentaje de avance

0%

FOTOGRAFÍAS (EL ANTES)



F1: Sistema hidráulico



F2: Sistema hidráulico

Comentarios de los trabajos realizados:

Trabajos pendientes a realizarse:

1.- Adecuación del sistema hidráulico que incluye una cisterna y la adquisición de 2 tinacos para la distribución del suministro de agua. (F1, F2, F3, F4 Y F5)

Mediante oficio CGPyA/944/2018 signado por el Dr. Álvaro Zamudio Lara, Coordinador General de Planeación y Administración de la UAEM, se comunica que a la fecha del presente aún no es ministrado el recurso a la institución, sin embargo se están haciendo las gestiones pertinentes, se adjunta oficio enviado por el C.P. Luis Antonio Gutiérrez Aguilar, Director General de Proyectos de Inversión de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno del Estado de Morelos, en el cual me notifica que para la asignación y liberación del recurso se deberá registrar el proyecto en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión en el Sistema de la Unidad de Inversión Estatal (SUIE), lo cual ha sido atendido.



F3: Sistema hidráulico



F4: Sistema hidráulico



F5: Interior de cisterna

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán  
Rector

C.P. Filiberto Suárez Díaz  
Encargado de Despacho de la Dirección General de Infraestructura

\*Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.



2018

AÑO

FAM  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Octubre 2018

FECHA DE CORTE: 31/10/2018

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



PRIORIDAD

3

Nombre de la obra:

Mantenimiento de espacios académicos de la Escuela de Estudios Superiores de Xalostoc

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

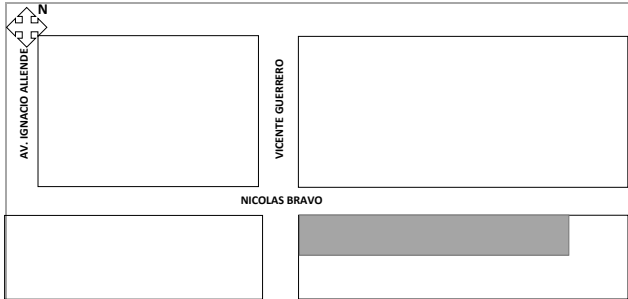

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

AV Nicolas Bravo S/N, Parque Industrial Cuautla,  
C.P. 62715



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Escudo de la universidad

Porcentaje de avance

0%

FOTOGRAFÍAS (EL ANTES)



F1: Laboratorio E-5



F2: Laboratorio E-6 y E-7

Comentarios de los trabajos realizados:


Trabajos pendientes a realizarse:

1. Mantenimiento de impermeabilizante de concreto con remoción de carpeta existente y aplicación de carpeta elastomero neoflex 7100, de los edificios E-5, E6 y E7, incluye 4 laboratorios, 3 salones, 1 aula audiovisual y 10 cubículos de investigación. (F1 y F2).
2. Reparación de piso firme de concreto e instalación de piso cerámico de uso rudo para 3 laboratorios: 2 laboratorios en edificio E-5 y 1 laboratorio en edificio E-6. (F3 y F4).
3. Mantenimiento correctivo a 2 módulos de baños con cambio de 4 muebles sanitarios con descarga ecológica, cambio de 2 muebles migitorios por migitorios secos ecológicos, cambio de 4 sistemas de regaderas, cambio de 4 muebles de lavamanos con llaves ahorradoras tipo pusch, cambio de 156 m2 de loseta, cambio de 8 puertas de aluminio por puertas abatibles de 2x1.60m. (F5).


Mediante oficio CGPyA/944/2018 signado por el Dr. Álvaro Zamudio Lara, Coordinador General de Planeación y Administración de la UAEM, se comunica que a la fecha del presente aún no es ministrado el recurso a la institución, sin embargo se están haciendo las gestiones pertinentes, se adjunta oficio enviado por el C.P. Luis Antonio Gutiérrez Aguilar, Director General de Proyectos de Inversión de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno del Estado de Morelos, en el cual me notifica que para la asignación y liberación del recurso se deberá registrar el proyecto en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión en el Sistema de la Unidad de Inversión Estatal (SUIE), lo cual ha sido atendido.



F3: Interior laboratorio E-5

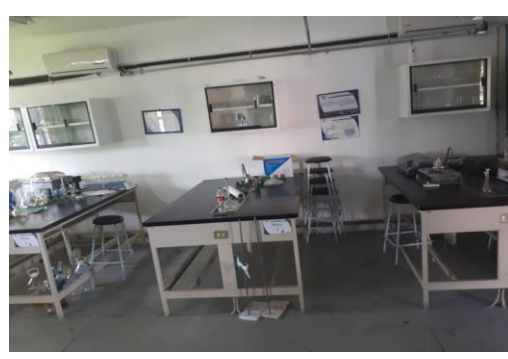

F4: Interior Laboratorio E-6

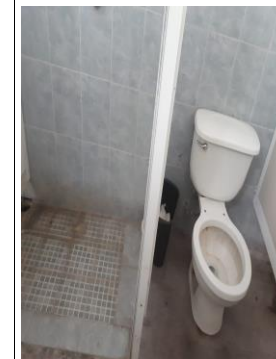

F5: Sanitarios



Dr. Gustavo Urquiza Beltrán  
Rector

C.P. Filiberto Suárez Díaz  
Encargado de Despacho de la Dirección General de Infraestructura

\*Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.
