

2018

AÑO



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**Septiembre 2018**  
FECHA DE CORTE: 30/09/2018

**REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL**

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: **Universidad Autónoma del Estado de Morelos**  
Entidad federativa: Morelos  
Clave Inst 911: 17MSU0017P

RESPONSABLES

Planeación  
Nombre: Álvaro Zamudio Lara  
Cargo: Coordinador General de Planeación y Administración  
Teléfono: (777) 3 29 70 00 Ext. 7033 y 4312  
Correo electrónico: azamudio@uaem.mx

Obras y Mantenimiento  
Nombre: Filiberto Suárez Díaz  
Cargo: Encargado de Despacho de la Dirección General de Infraestructura  
Teléfono: (777) 3 29 70 00 Ext. 3136  
Correo electrónico: fsuarez@uaem.mx



DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto <sup>1</sup>			Acciones que sustentan el avance <sup>2</sup>	Acciones por realizar	% de avance	Fechas <sup>3</sup>		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada				
		Obras de continuidad	Equipamiento	Adecuaciones y mejoras	Mantenimiento				Proyecto sustentable	Espacio/equipo	cantidad				metros cuadrados	Inicio			Término	¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega- Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega- Recepción
1	Mantenimiento de espacios académicos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos			X		\$ 23,942,675.22	\$ 23,942,675.22										Mediante oficio CGPA/882/2018 signado por el Dr. Álvaro Zamudio Lara, Coordinador General de Planeación y Administración de la UAEM, de fecha 21 de septiembre de 2018, se solicita a la Lic. Beatriz Ramírez Velázquez, Secretaria de Educación en Morelos le indique el procedimiento a seguir para la ministración de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2018, por un monto de \$25,816,570.44 (veinticinco millones ochocientos dieciséis mil quinientos setenta pesos 44/100 M.N.), (se adjunta).						
									TOTAL	0	0.00	GLOBAL DEL PROYECTO											
3	Adecuación y mejoras de espacios académicos del Campus Oriente			X		\$ 1,873,895.22	\$ 1,873,895.22										Mediante oficio CGPA/882/2018 signado por el Dr. Álvaro Zamudio Lara, Coordinador General de Planeación y Administración de la UAEM, de fecha 21 de septiembre de 2018, se solicita a la Lic. Beatriz Ramírez Velázquez, Secretaria de Educación en Morelos le indique el procedimiento a seguir para la ministración de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2018, por un monto de \$25,816,570.44 (veinticinco millones ochocientos dieciséis mil quinientos setenta pesos 44/100 M.N.), (se adjunta).						
									TOTAL	0	0.00	GLOBAL DEL PROYECTO											
						\$25,816,570.44	\$0.00	\$25,816,570.44															

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán  
Rector


C.P. Filiberto Suárez Díaz  
Encargado de Despacho de la Dirección General de Infraestructura

1 Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta filas como sea necesario.  
2 En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.  
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD **1** Nombre de la obra: **Mantenimiento de espacios académicos de Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

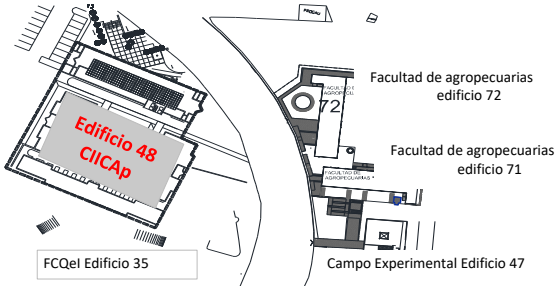

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Avenida Universidad # 1001 Colonia Chamilpa,  
Código Postal 62209, Cuernavaca, Morelos



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Escudo de la universidad

Porcentaje de avance

0%

FOTOGRAFÍAS (EL ANTES)



F1: Fachada principal



F2: lateral

Comentarios de los trabajos realizados:

Trabajos pendientes a realizarse:

1. Fachada principal (F1)
2. Fachada lateral (F2)
3. Impermeabilización de azoteas (F3)
4. Impermeabilización de azoteas (F4)

Mediante oficio **CGPA/882/2018** signado por el Dr. Álvaro Zamudio Lara, Coordinador General de Planeación y Administración de la UAEM, de fecha 21 de septiembre de 2018, se solicita a la Lic. Beatriz Ramírez Velázquez, Secretaria de Educación en Morelos le indique el procedimiento a seguir para la ministración de los recursos del **Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2018**, por un monto de \$25,816,570.44 (veinticinco millones ochocientos dieciséis mil quinientos setenta pesos 44/100 M.N.), (se adjunta).



F3: Fachada posterior



F4: Entrada

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán  
Rector

C.P. Filiberto Suárez Díaz  
Encargado de Despacho de la Dirección General de Infraestructura

\*Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD **1** Nombre de la obra: **Mantenimiento de espacios académicos del Centro de Investigaciones Químicas**





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Escudo de la universidad

Porcentaje de avance

0%

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

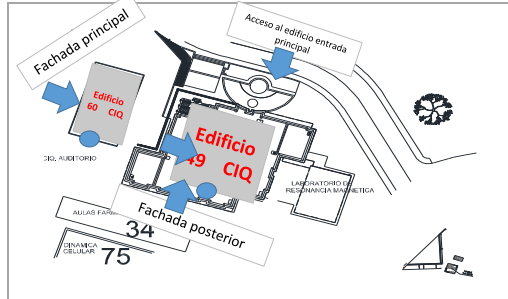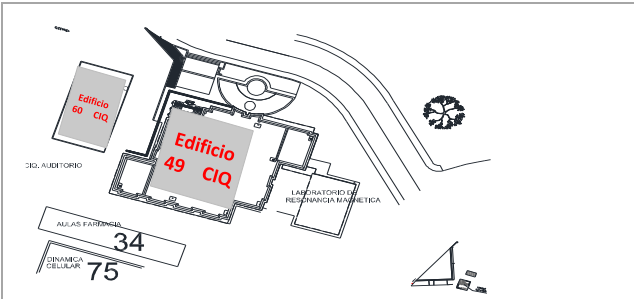

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Avenida Universidad # 1001 Colonia Chamilpa, Código Postal 62209, Cuernavaca, Morelos

FOTOGRAFÍAS (EL ANTES)



F1: Fachada principal edif. 49



F2: Fachada Principal del Edificio 60

Comentarios de los trabajos realizados:

Trabajos pendientes a realizarse:

1. Impermeabilización edificio 49 (F1,F3 y F4).
2. Impermeabilización edificio 60 (F2 y F5).

Mediante oficio **CGPA/882/2018** signado por el Dr. Álvaro Zamudio Lara, Coordinador General de Planeación y Administración de la UAEM, de fecha 21 de septiembre de 2018, se solicita a la Lic. Beatriz Ramírez Velázquez, Secretaria de Educación en Morelos le indique el procedimiento a seguir para la ministración de los recursos del **Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2018**, por un monto de \$25,816,570.44 (veinticinco millones ochocientos dieciséis mil quinientos setenta pesos 44/100 M.N.). (se adjunta).



F3: Techo Edificio 49



F4: Techo Edificio 49



F5: Techo edificio 60

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán  
Rector



C.P. Filiberto Suárez Díaz  
Encargado de Despacho de la Dirección General de Infraestructura

\*Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD **1** Nombre de la obra: **Mantenimiento de espacios académicos del Centro de Investigación en Ciencias (CInC)**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

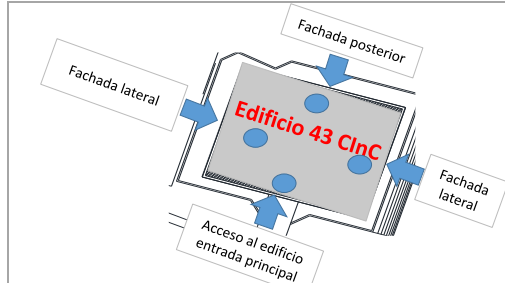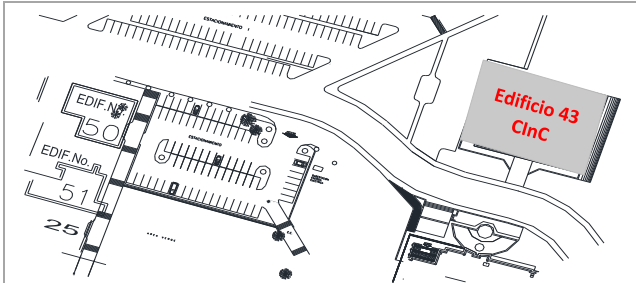

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Avenida Universidad # 1001 Colonia Chamilpa,  
Código Postal 62209, Cuernavaca, Morelos



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Escudo de la universidad

Porcentaje de avance

0%

FOTOGRAFÍAS (EL ANTES)



F1: Tableros eléctricos actuales



F2: Conductores eléctricos

Comentarios de los trabajos realizados:

Trabajos pendientes a realizarse:

1. Cambio de tableros eléctricos (F1)
2. Reacomodo general de conductores eléctricos y balanceo de cargas (F2)
3. Reubicación y mantenimiento de aires acondicionados del edificio (F3)
4. Mantenimiento y remodelación de sanitarios (F4)
5. Sustitución de lámparas fluorescentes por tecnología led (F5)


Mediante oficio **CGPA/882/2018** signado por el Dr. Álvaro Zamudio Lara, Coordinador General de Planeación y Administración de la UAEM, de fecha 21 de septiembre de 2018, se solicita a la Lic. Beatriz Ramírez Velázquez, Secretaria de Educación en Morelos le indique el procedimiento a seguir para la ministración de los recursos del **Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2018**, por un monto de \$25,816,570.44 (veinticinco millones ochocientos dieciséis mil quinientos setenta pesos 44/100 M.N.). (se adjunta).



F3: Aires acondicionados



F4: Sanitarios

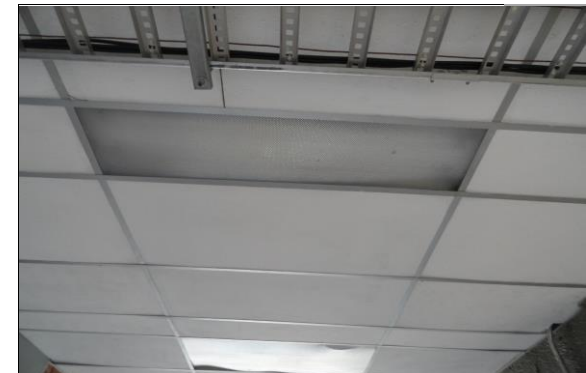

F5: Lámparas

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán  
Rector


C.P. Filiberto Suárez Díaz  
Encargado de Despacho de la Dirección General de Infraestructura

\*Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD **1** Nombre de la obra: **Mantenimiento de espacios académicos del Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAp)**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

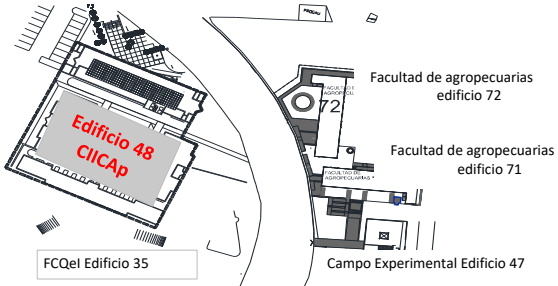

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Avenida Universidad # 1001 Colonia Chamilpa,  
Código Postal 62209, Cuernavaca, Morelos



Escudo de la universidad

Porcentaje de avance

0%

FOTOGRAFÍAS (EL ANTES)



F1: Planta de emergencia



F2: Instalaciones Eléctricas

Comentarios de los trabajos realizados:

Trabajos pendientes a realizarse:

1. Mantenimiento a planta de emergencia (F1).
2. Normalización de las instalaciones eléctrica (F2).
3. Instalación de sistema de tierras para las nuevas instalaciones (F3).
4. Mantenimiento y aplicación de pintura en laboratorios de investigación (F4).
5. Pavimentación y fabricación de muro con puerta de acceso para adecuación de espacio para laboratorio e instalación de servicios de luz y agua (F5).

Mediante oficio **CGPA/882/2018** signado por el Dr. Álvaro Zamudio Lara, Coordinador General de Planeación y Administración de la UAEM, de fecha 21 de septiembre de 2018, se solicita a la Lic. Beatriz Ramírez Velázquez, Secretaria de Educación en Morelos le indique el procedimiento a seguir para la ministración de los recursos del **Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2018**, por un monto de \$25,816,570.44 (veinticinco millones ochocientos dieciséis mil quinientos setenta pesos 44/100 M.N.) (se adjunta).



F3: Instalación sistema de tierras



F4: Laboratorios de investigación



F5: Interior de aula (laboratorio)

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán  
Rector

C.P. Filiberto Suárez Díaz  
Encargado de Despacho de la Dirección General de Infraestructura



\*Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.



REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD **1** Nombre de la obra: **Mantenimiento de espacios académicos del Centro de Investigación en Dinámica Celular**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

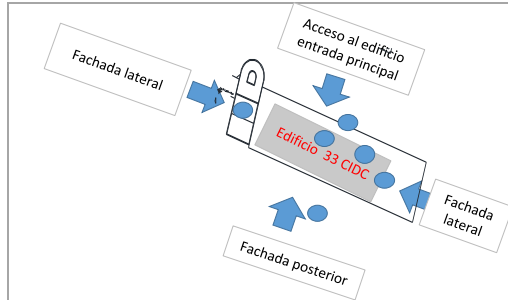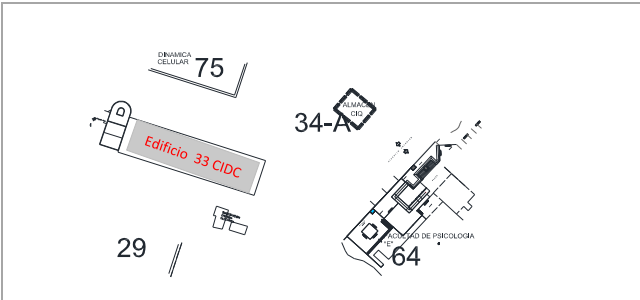

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Avenida Universidad # 1001 Colonia Chamilpa,  
Código Postal 62209, Cuernavaca, Morelos



Escudo de la universidad

Porcentaje de avance

0%

FOTOGRAFÍAS (EL ANTES)



F1: Pintura de Edificio (interior y exterior)



F2: Sistema de tierras físicas

Comentarios de los trabajos realizados:

Trabajos pendientes a realizarse:

1. Mantenimiento de pintura del edificio (interior y exterior). (F1)
2. Mantenimiento al edificio para complementar al sistema de tierras. (F2)
3. Adecuación de entradas del inmueble. (F3)
4. Iluminación exterior del edificio. (F4)
5. Mantenimiento a equipos de refrigeración y aires acondicionados. (F5)
6. Remodelación de sanitarios. (F6)

Mediante oficio **CGPA/882/2018** signado por el Dr. Álvaro Zamudio Lara, Coordinador General de Planeación y Administración de la UAEM, de fecha 21 de septiembre de 2018, se solicita a la Lic. Beatriz Ramírez Velázquez, Secretaria de Educación en Morelos le indique el procedimiento a seguir para la ministración de los recursos del **Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2018**, por un monto de \$25,816,570.44 (veinticinco millones ochocientos dieciséis mil quinientos setenta pesos 44/100 M.N.). (se adjunta).



F3: Entrada del inmueble



F4: Exterior del edificio

F5: Equipos de refrigeración y aires acondicionados



F6: Sanitarios

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán  
Rector

C.P. Filiberto Suárez Díaz  
Encargado de Despacho de la Dirección General de Infraestructura

\*Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2018

AÑO

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**Septiembre 2018**

FECHA DE CORTE: 30/09/2018

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD

1

Nombre de la obra:

**Mantenimiento de espacios académicos del Centro de Investigaciones Biológicas (CIB)**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Avenida Universidad # 1001 Colonia Chamilpa,  
Código Postal 62209, Cuernavaca, Morelos



Escudo de la universidad


Porcentaje de avance

0%

FOTOGRAFÍAS (EL ANTES)



F1: Puerta de acceso (exterior)

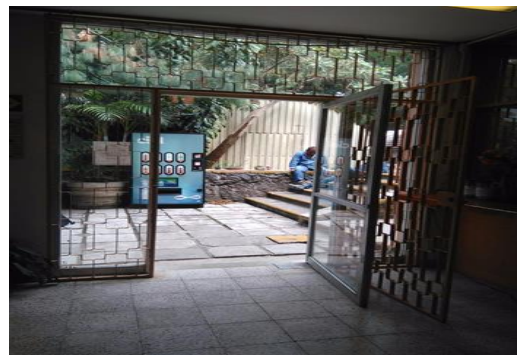

F2: lateral (interior)

Comentarios de los trabajos realizados:

Trabajos pendientes a realizarse:

1. Mantenimiento correctivo a 1 puerta de acceso del Centro de Investigaciones Biológicas estructura en mal estado (F1 y F2)
2. Mantenimiento correctivo a puertas de laboratorios y puertas de baños en mal estado del edificio 14 del CIB (F3,F4 y F5)


Mediante oficio **CGPA/882/2018** signado por el Dr. Álvaro Zamudio Lara, Coordinador General de Planeación y Administración de la UAEM, de fecha 21 de septiembre de 2018, se solicita a la Lic. Beatriz Ramírez Velázquez, Secretaria de Educación en Morelos le indique el procedimiento a seguir para la ministración de los recursos del **Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2018**, por un monto de \$25,816,570.44 (veinticinco millones ochocientos dieciséis mil quinientos setenta pesos 44/100 M.N.). (se adjunta).



F3: Puertas



F4: Puertas

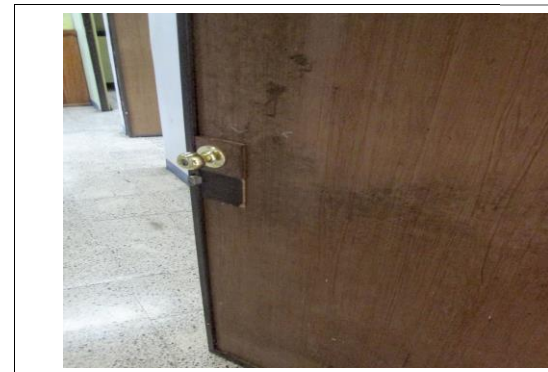

F5: Puertas

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán  
Rector

C.P. Filiberto Suárez Díaz  
Encargado de Despacho de la Dirección General de Infraestructura

\*Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.



REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD

1

Nombre de la obra:

**Mantenimiento de espacios académicos de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería (Impermeabilizante para el Laboratorio de Operaciones Unitarias y Tamulba)**





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Escudo de la universidad

Porcentaje de avance

0%

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

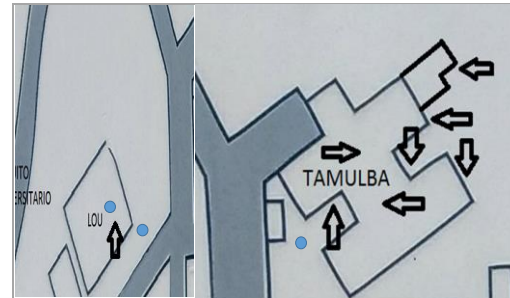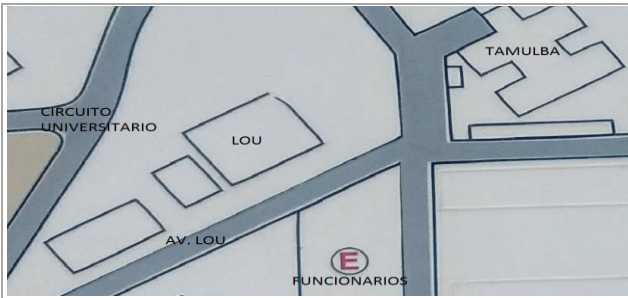

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Avenida LOU esquina Circuito Universitario,  
Edificio No15, Colonia Chamilpa, C.P. 62209,  
Cuernavaca, Morelos. Edificio 15 LOU,  
EDIFICIO 4 TAMULBA

FOTOGRAFÍAS (EL ANTES)



F1: Fachada principal LOU



F2: lateral LOU

Comentarios de los trabajos realizados:

Trabajos pendientes a realizarse:

1. Impermeabilizado de 1,310 m2 en techo de lamina LOU (F1,F2 y F5).
2. Impermeabilizado de 1,200 m2 en techo de lamina de Tamulba (F3 y F4).

Mediante oficio CGPA/882/2018 signado por el Dr. Álvaro Zamudio Lara, Coordinador General de Planeación y Administración de la UAEM, de fecha 21 de septiembre de 2018, se solicita a la Lic. Beatriz Ramírez Velázquez, Secretaria de Educación en Morelos le indique el procedimiento a seguir para la ministración de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2018, por un monto de \$25,816,570.44 (veinticinco millones ochocientos dieciséis mil quinientos setenta pesos 44/100 M.N.). (se adjunta).



F3: Techo TAMULBA



F4: Entrada TAMULBA




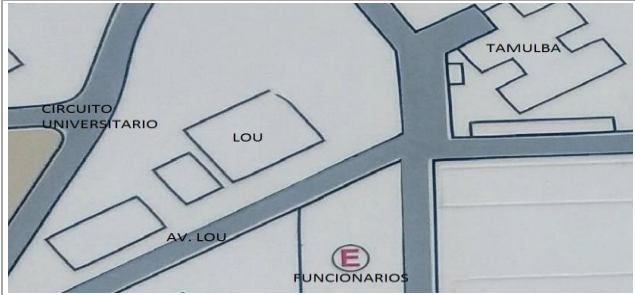

F5: Interior de aula LOU

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán  
Rector

C.P. Filiberto Suárez Díaz  
Encargado de Despacho de la Dirección General de Infraestructura

\*Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.


REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

 Escudo de la universidad Porcentaje de avance  <b>0%</b>	PRIORIDAD <b>1</b> Nombre de la obra: <b>Mantenimiento de espacios académicos de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería FCQel</b>	CROQUIS DE LOCALIZACIÓN 	UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO Avenida Universidad # 1001 Colonia Chamilpa, Código Postal 62209, Cuernavaca, Morelos
	Detalle de la planta (edificio) con flechas 		

FOTOGRAFÍAS (EL ANTES)



F1: Sanitarios




F2: TAMULBA (Interior y Exterior)

Comentarios de los trabajos realizados:


Trabajos pendientes a realizarse:

1. Cambio de muebles sanitarios por ahorradores. 12 pzas (F1)
2. Aplicación de pintura blanca, gris y azul marino para Tamulba. Salones, laboratorios, mezzanine, fachada principal y oficinas (F2)
3. Suministro y colocación de luminarias para TAMULBA y FCQel t5 de 120led/20w, luz de día, tipo base g5. 200 piezas (F3)
4. Cambio de 20 mezcladoras cuello de ganso con doble llave para tarja de laboratorio (F4)
5. Pintura de 13 sadineles con 200 m2 y Pintura de 9 almacenes temporales de residuos con 100 m2 (F5)


Mediante oficio **CGPA/882/2018** signado por el Dr. Álvaro Zamudio Lara, Coordinador General de Planeación y Administración de la UAEM, de fecha 21 de septiembre de 2018, se solicita a la Lic. Beatriz Ramírez Velázquez, Secretaria de Educación en Morelos le indique el procedimiento a seguir para la ministración de los recursos del **Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2018**, por un monto de \$25,816,570.44 (veinticinco millones ochocientos dieciséis mil quinientos setenta pesos 44/100 M.N.). (se adjunta).



F3: TAMULBA-FCQel



F4: FCQel-LOU



F5: FCQel-LOU

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán  
Rector

C.P. Filiberto Suárez Díaz  
Encargado de Despacho de la Dirección General de Infraestructura
