

- ACUSE -



COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS



0554

Cuernavaca, Morelos, 09 abril de 2025
CGPyDS/334/2025

SEP SEMS
RECIBIDO

10 ABR 2025
12:55
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN TÉCNICA
Lillian
con Formatos anexos




ARQ. HUGO ENRIQUE DE LUCIO TORRES
DIRECTOR DE OPRACION TECNICA Y DE GESTION
SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

PRESENTE

En el marco del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Regular, en su componente de Nivel Medio Superior, adjunto al presente en versión impresa y electrónica (USB), el "Formato de Seguimiento para Acciones de Infraestructura" correspondiente al Primer Trimestre (enero, febrero, marzo) de 2025, de las siguientes obras:

- FAM 2014 Preparatoria Núm. 5 "Construcción de módulos sanitarios de Escuela Preparatoria Núm. 5 Puente de Ixtla".
- FAM 2015 Preparatoria Núm. 1 "Construcción de módulos sanitarios y área de convivencia de la Escuela Preparatoria Núm. 1 Lic. Bernabé L. de Elías".
- FAM 2017 Escuela Técnicos Laboratoristas "Construcción de segunda etapa de laboratorio para la Escuela de Técnicos Laboratoristas de la UAEM".
- FAM 2018 Escuela Preparatoria Comunitaria de Tres Marías "Construcción de dos aulas en estructura U-1C de 2 EE para la Preparatoria Comunitaria de Tres Marías".
- FAM 2019 Preparatoria Núm. 1 Lic. Bernabé L. de Elías "Equipamiento de Laboratorio y Rehabilitación de pisos en exterior", Preparatoria Núm. 3 Cuautla Prof. Luis Ríos Alvarado "Equipamiento de Laboratorio".
- FAM 2023 Escuela Preparatoria Núm. 2 Prof. Antonio L. Mora del Castillo "Estabilización de talud", Escuela Preparatoria Núm. 6 Tlaltizapán "Construcción de andador principal para la intercomunicación y estabilización de talud en área de exteriores".

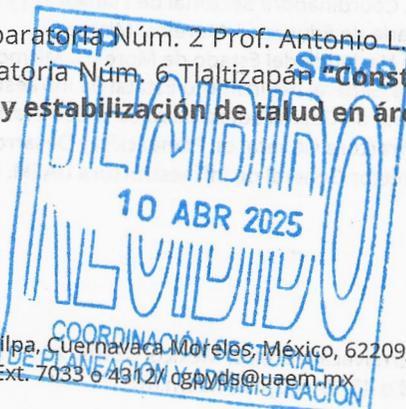

RECIBIDO
MCC 11 ABR 2025
CORA: 1054 FOLIO: 161





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE

0224

- FAM 2024 Escuela Preparatoria Núm. 2 Prof. Antonio L. Mora del Castillo **"Estabilización de talud en área exterior de la Escuela Preparatoria Núm. 2"**.
- FAM 2025 **"Formato de Seguimiento para Acciones de Infraestructura"**.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

UAEM



COORDINACIÓN GENERAL DE
PLANEACIÓN Y DESARROLLO
SUSTENTABLE

Atentamente

Por una humanidad culta

DR. JUAN MANUEL RIVAS GONZÁLEZ

Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

- C.i.p. Dra. Tania Rodríguez Mora. Subsecretaria de Educación Media Superior. Para su conocimiento.
Dra. Viridiana Aydeé León Hernández. Rectora de la UAEM. Mismo fin.
Lic. María Alejandra Carreón Capuchino. Coordinadora Sectorial de Planeación y Administración de la SEMS. Mismo fin.
Mtra. Karla Aline Herrera Alonso. Secretaria de Educación Morelos. Mismo fin.
Mtra. Mirna Zavala Zuñiga. Secretaria de Hacienda del Estado de Morelos. Mismo fin.
Arq. Erika Hilda Salgado Patiño. Directora General del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos. Mismo fin.
C.P. Rosa Bahena Juárez. Directora General de Gasto Federalizado de la Secretaría de Hacienda. Mismo fin.
Dra. María del Carmen Torres Salazar. Directora General de Planeación y Desarrollo Institucional UAEM. Mismo fin.
Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández. Director General de Infraestructura UAEM. Mismo fin.
✓ Archivo.

JMRG/MCTS/



Av. Universidad 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca Morelos, México, 62209, 2do. Piso Torre de Rectoría,
Tel. (777) 329 7033, 329 70, 00, Ext. 7033 o 4312/ cgpyds@uaem.mx

UAEM
RECTORÍA
2023-2024



AÑO	FONDO	CCT	SUBSISTEMA	NOMBRE DEL PLANTEL	SOSTENIMIENTO	TIPO EDUCATIVO	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN Y META POR REALIZAR	CONSTRUCCIÓN		MANTENIMIENTO		REHABILITACIÓN		MOBILIARIO Y/O EQUIPO		MONTO TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE CONCLUSIÓN	AVANCE FÍSICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	MONTO EJERCIDO (B)	NÚMERO DE ALUMNOS BENEFICIARIOS	PROBLEMÁTICA ATENDIDA	FECHA DE VERIFICACIÓN	SEÑALIZACIÓN	ACTA ENTREGA	OBSERVACIONES	
											TIPO DE ESPACIO	MONTO ASIGNADO	TIPO DE ESPACIO	MONTO ASIGNADO	TIPO DE ESPACIO	MONTO ASIGNADO	TIPO DE ESPACIO	MONTO ASIGNADO													
2025	FAM Regular		Universidades Autónomas Estatales (UAE)		Autónomo	Media Superior	Morelos							\$ -																	
											\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -												

Nota:

Mediante el oficio No. SEP/SEMS/0272/2025, con fecha 7 de febrero del 2025, signado por la Dra. Tania Rodríguez Mora Subsecretaria de Educación Media Superior; se notifica al Gobierno del Estado de Morelos la asignación y distribución de los recursos correspondientes al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) en sus componentes de Infraestructura Educativa Básica, Media Superior y Superior correspondiente al ejercicio fiscal 2025. Y en donde se detalla que la asignación disponible para la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) es de **\$1, 524,961** pesos. En este sentido, es importante mencionar que la Dirección General de Infraestructura de la UAEM se encuentra realizando el proyecto correspondiente así como los proyectos ejecutivos de la obra a realizarse con estos recursos.

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
Mtro. Guillermo Pérez Hernández Director de Desarrollo de Infraestructura.	Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández Director General de Infraestructura.	Dra. Viridiana Aydeé León Hernández Rectora UAEM.

