



COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Cuernavaca, Morelos, 07 de julio de 2025
CGPyDS/520/2025

Recibo
13:20
11 JUL 2025 U.A.E.M.

Acuse

RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

UAEM DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

MCB 11 JUL 2025

RECIBIDO
HORA: 12:41 FOLIO: 313

MTRA. CYNTHIA RUANO MÉNDEZ
DIRECTORA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL (DGESUI)

PRESENTE

En el marco del **Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) ejercicio fiscal 2025**, se adjunta en versión electrónica (USB) en formato Excel y PDF debidamente firmados los reportes correspondientes al **segundo trimestre** (abril, mayo y junio) 2025 de los proyectos apoyados con los recursos del fondo en comento, como a continuación se describe:

1. Reporte descriptivo del informe de avance trimestral.
2. Reporte fotográfico del informe de avance trimestral.

UAEM 153
RECIBIDO
11 JUL 2025
RECTORIA
2023 - 2029

S.E.P.
SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR
RECIBIDO
10 JUL 2025
copias
DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.



Atentamente
Por una humanidad culta

DR. JUAN MANUEL RIVAS GONZÁLEZ

Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

S.E.P.
DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
RECIBIDO
10 JUL 2025
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Recibi 1 USB.
Claudia DUEÑAS

- C.i.p. Dr. Carlos Iván Moreno Arellano. Director General de Educación Superior Universitaria e Intercultural. Para su conocimiento.
Dra. Viridiana Aydeé León Hernández. Rectora. UAEM. Mismo fin.
Dra. María del Carmen Torres Salazar. Directora General de Planeación y Desarrollo Institucional. UAEM. Mismo fin.
Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández. Director General de Infraestructura. UAEM. Mismo fin.
Archivo.

JMRG/MCTS/ANPM*eez

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"



Av. Universidad 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca Morelos, México, 62209, 2do. Piso Torre de Rectoría,
Tel. (777) 329 7033, 329 70, 00, Ext. 7033 o 4312 / cgpyds@uaem.mx

UAEM
RECTORÍA
2023-2029

2025

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta
Segundo Trimestre 2025

Fecha de elaboración: 30/06/2025

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: **Universidad Autónoma del Estado de Morelos**

Entidad federativa: **Morelos**

Clave 911: **17MSU0017P**

Nombre: **Dr. Juan Manuel Rivas González**
Cargo: **Responsable del Proyecto**
Teléfono: **(777) 3 29 70 00 Ext. 7033 y 4312**
Correo electrónico: **cgpyds@uaem.mx**

Nombre: **Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández**
Cargo: **Director General de Infraestructura**
Teléfono: **(777) 3 29 70 00 Ext. 3136**
Correo electrónico: **oscar.lastra@uaem.mx**



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto	Monto Rectificado (A)	(17) CONTRATO Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA				(13) Monto ejercido (D)	REMANENTES		Espacios físicos/equipamiento (programado/autorizado)			(16) Acciones que sustentan el avance	(17) % de avance	(18) Fechas Rápidas (DD/MM/AA)		(19) Observaciones	(20) Retiro a la TESOFE			(21) Actas					
				No. (s) de Contrato (s)	Fechas Programadas		Monto Contratado (B)		Contralista	Monto de Contratado (C) Diferencia entre rectificado y Contratado C-A-B	(E1) Diferencia entre Monto Rectificado y Monto ejercido E1-A-D	(E2) Diferencia entre Monto contratado y Monto ejercido E2-B-D	Nombre del Espacio/equipo			Cantidad	Metros Cuadrados (m²)		Inicio	Termino	Línea de Captura	Fecha de Ingreso	Importe	Entrega-Recepción (Acta finalizado) MONTO	Fecha	Acta Administrativa de Entrega-Recepción (formato DDESUR) MONTO	Fecha
					INICIO	TERMINO																					
1	Construcción de talleres multidisciplinares básicos para la formación práctica de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería y construcción de barda de colindancia de la Escuela de Estudios Superiores de Atlatlahucan	x	\$ 5,700,000.00						\$ 5,700,000.00	\$ -	Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería	9.00	657.70	0%				En el marco del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) ejercicio fiscal 2025 la institución recibió mediante oficio 511/2025-1347-34 de fecha 14 de abril 2025, la autorización académica a la solicitud de la rectificación de la Propuesta Institucional de Infraestructura Física presentada con los proyectos que se describen a continuación: 1. P-1 Construcción de talleres multidisciplinares básicos para la formación práctica de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería y construcción de barda de colindancia de la Escuela de Estudios Superiores de Atlatlahucan.									
2	Adecuaciones y mejoras en las fachadas y columnas del Centro de Investigaciones Químicas	x	\$ 2,900,000.00						\$ 2,900,000.00	\$ -	Centro de Investigaciones Químicas	28.00	816.50	0%				2. P-2 Adecuaciones y mejoras en las fachadas y columnas del Centro de Investigaciones Químicas. 3. P-3 Mantenimiento a cuatro plantas de tratamiento, así como a espacios académicos y de actividad física y deportiva en el Campus Norte. 4. P-4 Adquirir el equipamiento necesario en los espacios académicos de los Campus Norte y Campus Oriente.									

2025

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta
Segundo Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 30/05/2025

REPORTES DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Entidad federativa: Morelos

Clave 911: 17MSU0017P

Nombre: Dr. Juan Manuel Rivas González
Cargo: Responsable del Proyecto.
Teléfono: (777) 3 29 70 00 Ext. 7033 y 4312
Correo electrónico: cgpyds@uaem.mx

Nombre: Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Cargo: Director General de Infraestructura
Teléfono: (777) 3 29 70 00 Ext. 3136
Correo electrónico: oscar.lastra@uaem.mx



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Mantenimiento a cuatro plantas de de tratamiento, así como a espacios académicos y de actividad física y deportiva en el Campus Norte

\$ 8,000,000.00

\$ 8,000,000.00

Facultad de Contaduría Administración e Informática 1.00 63.00

0%

Facultad de Psicología 1.00 63.00

0%

Escuela de Turismo 1.00 63.00

0%

Facultad de Ciencias Biológicas 1.00 63.00

0%

Gimnasio auditorio 1.00 2118.25

0%

Polideportivo 1 1.00 2690.00

0%

Polideportivo 2 1.00 2690.00

0%

CELE Norte 1.00 1170.00

0%

Escuela de Teatro, Danza y Música 1.00 1756.00

0%

GLOBAL DEL PROYECTO

5. P-5 Construcción de la planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Escuela de Estudios Superiores del Jicarero.

Durante el mes de mayo mediante oficio CGPyDS/392/2025 enviado a la Lic. Maribel Santibañez Mendieta Directora General de Proyectos de Inversión de la Secretaría de Educación se entregó de vía electrónica para revisión jurídica el Instrumento denominado "Convenio para la Transferencia y Ejecución de Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraestructura Educativa de Nivel Superior, ejercicio 2025" entre la Institución y el Poder Ejecutivo del Gobierno Libre y Soberano del Estado de Morelos, a través de la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Educación, a la fecha se continua con las gestiones administrativas pertinentes para su debida formalización.

En este mismo sentido la institución realiza las gestiones necesarias para la formalización del Convenio de Colaboración con el Instituto Estatal de Infraestructura Educativa del Estado de Morelos (INEIEM).

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Nombre: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Entidad federativa: Morelos

Clave 911: 17MSU0017P

Nombre: Dr. Juan Manuel Rivas González
Cargo: Responsable del Proyecto.
Teléfono: (777) 3 29 70 00 Ext. 7033 y 4312
Correo electrónico: cgpyds@uaem.mx

Nombre: Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Cargo: Director General de Infraestructura
Teléfono: (777) 3 29 70 00 Ext. 3136
Correo electrónico: oscar.lastra@uaem.mx

		Planeación	Títulos de Área		Obras y Mantenimiento				
4	Adquirir el equipamiento necesario en los espacios académicos de los Campus Norte y Campus Oriente	x	\$ 4,922,919.92	\$ 4,922,919.92	\$ -	GLOBAL DEL PROYECTO	En relación al proyecto: P-4 Adquirir el equipamiento necesario en los espacios académicos de los Campus Norte y Campus Oriente, el 17 de junio 2025, se publicó en el Diario estatal la Jornada, la convocatoria para la Licitación Pública LP15/2025, la cual se realizará de manera presencial y contempla la "Adquisición de mobiliario, reactivos, material y equipo de laboratorio y aire acondicionado para la Universidad Autónoma del Estado de Morelos". Finalmente se informa, que, como parte de las adecuaciones presupuestales del Manual de Normas para el Gasto Público de los recursos Federalizados, los cinco proyectos de este fondo se encuentran capturados en el Sistema de la Unidad de Inversión Estatal (SUIE) y se ha asignado clave de cartera, lo anterior como parte del proceso que conlleva a la ministración del recurso.		
						Salones de Clase		13	0%
						Aulas de Usos Múltiples		4	0%
						Auditorios		5	0%
						Talleres		3	0%
						Laboratorios		21	0%
						Centros de Cómputo		8	0%
Bibliotecas	2	0%							
5	Construcción de la planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Escuela de Estudios Superiores del Jicarero	x	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	\$ -	GLOBAL DEL PROYECTO	0.00%		
						Escuela de Estudios Superiores del Jicarero		1.00	1046.00
			\$22,322,919.92	\$0.00	\$0.00	\$22,322,919.92	\$0.00	1,703.70	

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

Dra. Viridiana Ayda León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Dr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

1 Se capturan los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se pueden anular estas filas como sea necesario.
2 En esta sección se redacta de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se ven reflejados en el reporte fotográfico.
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todos en dos dígitos del mes y año.

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Segundo Trimestre 2025

Fecha de elaboración: 30/06/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

0%

PRORIDAD

1 Nombre de la obra:

Construcción de talleres multidisciplinarios básicos para la formación práctica de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería y construcción de barda de colindancia de la Escuela de Estudios Superiores de Atlalahucan (FCQel)

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO




UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal: Av. Universidad #1001, Col. Chamilpa, C.P. 62209, Cuernavaca, Morelos.

ANTES

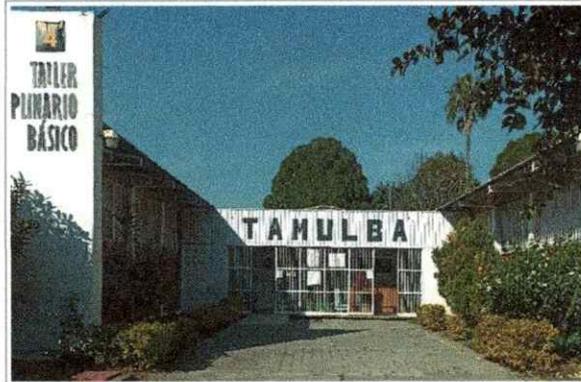

Fachada del Taller Multidisciplinario Básico (Tamulba) de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería



Vistas del sitio donde se realizaron trabajos: Preliminares que incluyen demolición, retiro de escombros, entre otros; para la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería (TAMULBA).

Observaciones:

Lo presentado en el Reporte Fotográfico del segundo trimestre, corresponde a los espacios a intervenir mediante el fondo.

VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS


Porcentaje de avance

0%

PRIORIDAD 1 Nombre de la obra: **Construcción de talleres multidisciplinarios básicos para la formación práctica de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería y construcción de barda de colindancia de la Escuela de Estudios Superiores de Atlatlahucan (FCQel)**




Dirección Postal: Av. Universidad #1001, Col. Chamilpa, C.P. 62209, Cuernavaca, Morelos.

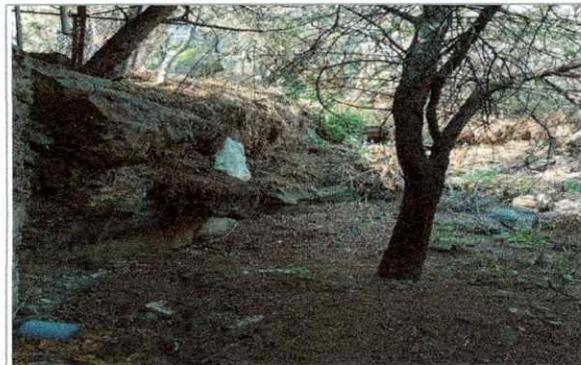

Vistas del sitio donde se realizaran trabajos: Preliminares y Albañilerías (trazo, excavación, construcciones de concreto (zapatas, corridas, firmes, canal, etc.), muro de mamposteo de piedra y muros divisorios de panel prefabricado), Acabados con pintura vinílica, entre otros; para la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería (TAMULBA).



Vistas del sitio donde se realizaran trabajos: Preliminares y Albañilerías (trazo, excavación, construcciones de concreto (zapatas, corridas, firmes, canal, etc.), muro de mamposteo de piedra y muros divisorios de panel prefabricado), Acabados con pintura vinílica, entre otros; para la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería (TAMULBA).

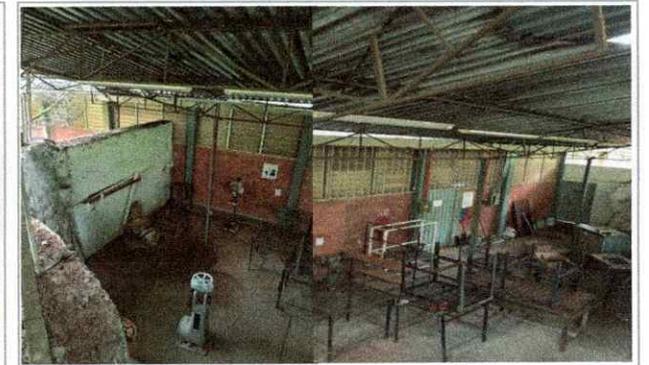

Vistas del sitio donde se realizaran trabajos: Instalacion de techumbre, canalones metálicos, columnas y estructuras metálicas, Asi como instalaciones (eléctricas, voz y datos, pluvial), Se instalara (cancelería de aluminio, protecciones, puertas, luminarias, señaléticas, etc.), para la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería (TAMBULBA).

[Signature]
Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

[Signature]
Dra. Viridiana Aydeé León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

[Signature]
Dr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

NOTA:

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Segundo Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 30/06/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

0%

PRIORIDAD

1


Nombre de la obra:

Construcción de talleres multidisciplinarios básicos para la formación práctica de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería y construcción de barda de colindancia de la Escuela de Estudios Superiores de Atlatlahucan (EES Atlatlahucan)

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

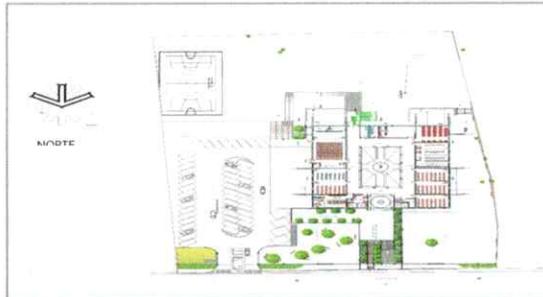

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal: Calle Universidad s/n, Barrio San Antonio, Atlatlahucan, Morelos. C.P 62840.

ANTES



Fachada de la Escuela de Estudios Superiores de Atlatlahucan



Vistas en donde se realizaran trabajos: Preliminares que incluyen limpieza, retiro de escombros, entre otros; para la Escuela de Estudios Superiores de Atlatlahucan.

Observaciones :

Lo presentado en el Reporte Fotográfico del segundo trimestre, corresponde a los espacios a intervenir mediante el fondo.

VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Segundo Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 30/06/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

0%

PRIORIDAD

1


Nombre de la obra:

Construcción de talleres multidisciplinarios básicos para la formación práctica de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería y construcción de barda de colindancia de la Escuela de Estudios Superiores de Atlatlahucan (EES Atlatlahucan)


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

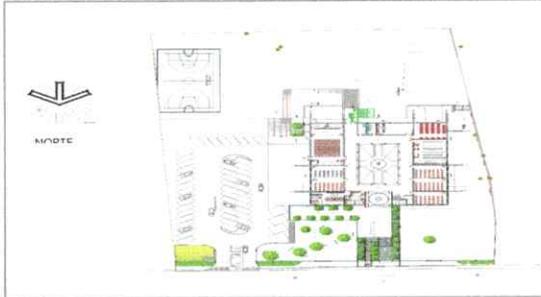

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS




Dirección Postal: Calle Universidad s/n, Barrio San Antonio, Atlatlahucan, Morelos. C.P 62840.



Vistas en donde se realizaran trabajos: Preliminares que incluyen limpieza, retiro de escombros, entre otros; para la Escuela de Estudios Superiores de Atlatlahucan.



Vistas en donde se realizaran los trabajos: Albañilería consistentes en trazo, excavación, mampostería, construcciones de concreto (plantillas, castillos, etc.), acabados con pintura vinilica entre otros; para la Escuela de Estudios Superiores de Atlatlahucan.

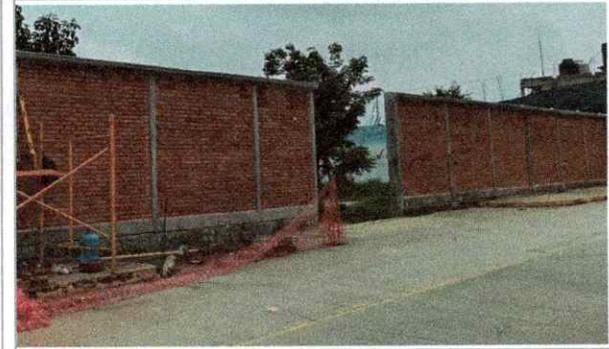

Vista en donde se realizaran trabajos de: Elaboracion y colocacion de reja de herreria con placas de acero y perfiles OC, OR con primer y pintura de esmalte, así como los trabajos de albañilería complementarios para la Escuela de Estudios Superiores de Atlatlahucan.

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

Dra. Viridiana Aydeé León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Dr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

NOTA:

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Segundo Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 30/06/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIMORDIA

2 Nombre de la obra: Adecuaciones y mejoras en las fachadas y columnas del Centro de Investigaciones Químicas



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS


Porcentaje de avance

0%


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

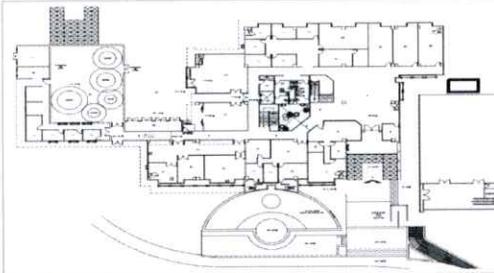

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

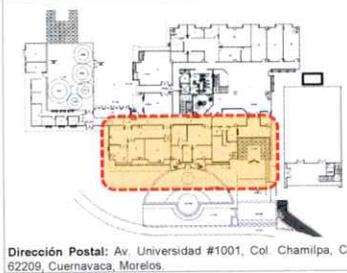

Dirección Postal: Av. Universidad #1001, Col. Chamilpa, C.P. 62209, Cuernavaca, Morelos.

ANTES



Adecuaciones y mejoras en las fachadas y columnas del Centro de Investigaciones Químicas



Vista del sitio donde se realizaran los trabajos de : Preliminares (delimitación del área, trazo, nivelación de la superficie, Así como el desmantelamiento de estructura metálica, demoliciones, retiros) , para el Centro de Investigaciones Químicas (CIQ).

Observaciones :

Lo presentado en el Reporte Fotográfico del segundo trimestre, corresponde a los espacios a intervenir mediante el fondo.

VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Segundo Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 30/06/2025

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD

2

Nombre de la obra: Adecuaciones y mejoras en las fachadas y columnas del Centro de Investigaciones Químicas



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS


Porcentaje de avance

0%


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

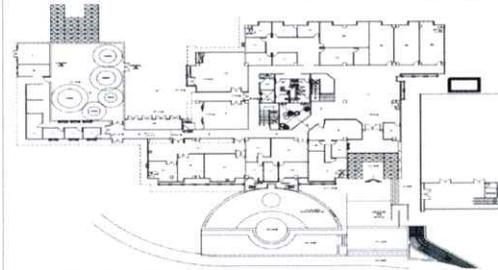

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal: Av. Universidad #1001, Col. Chamilpa, C.P. 62209, Cuernavaca, Morelos.



Vista donde se realizaran los trabajos de: Colocación de estructura en fachada, (celosía de lámina de acero y/o louver) Así como a la estructura nueva se sometera a tratamiento, en muros de acabado aparente o común se aplicara pintura vinilica, para el Centro de Investigaciones Químicas (CIQ).



Vista del sitio donde se realizaran los trabajos de: Retiro, reubicación y colocación de instalaciones eléctricas y equipos de aire acondicionado, Así como limpieza fina de obra para su entrega, en el Centro de Investigaciones Químicas (CIQ).

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

Dra. Virjiana Aydeé León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Dr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

NOTA

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra

2025

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Segundo Trimestre
2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

Fecha de elaboración: 30/06/2025

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

0%

PROPRIEDAD

3

Nombre de la obra:

Mantenimiento a cuatro plantas de tratamiento, así como a espacios académicos y de actividad física y deportiva en el Campus Norte (Facultad de Contaduría, Administración e Informática)


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

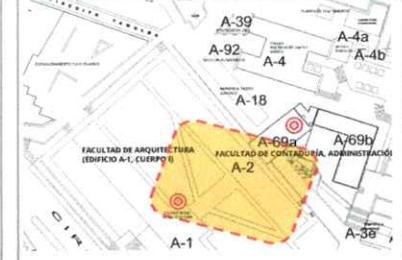

Dirección Postal: Av. Universidad #1001, Col. Chamilpa, C.P. 62209, Cuernavaca, Morelos.

ANTES



Fachada de la Facultad de Contaduría, Administración e Informática.



Vista del sitio en donde se realizaran los trabajos de: Limpieza de elementos, en la Facultad de Contaduría, Administración e Informática.

Observaciones :

Lo presentado en el Reporte Fotográfico del segundo trimestre, corresponde a los espacios a intervenir mediante el fondo.

VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Segundo Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 30/06/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD

3

Nombre de la obra:

Mantenimiento a cuatro plantas de tratamiento, así como a espacios académicos y de actividad física y deportiva en el Campus Norte (Facultad de Contaduría, Administración e Informática)



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

0%

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal: Av. Universidad #1001, Col. Chamipa, C.P. 62209, Cuernavaca, Morelos.



Vista del sitio en donde se realizarán los trabajos de: Revisión de equipos, así como caracterización del agua residual de acuerdo a parámetros de normas NOM aplicables, en la Facultad de Contaduría, Administración e Informática.



Vistas del sitio en donde se realizarán los trabajos de: Implementación de limpieza y/o desazolve, así como Albañilerías para optimización de sistemas, en la Facultad de Contaduría, Administración e Informática.



Vistas del sitio en donde se realizarán los trabajos de: Reparación o reposición de elementos eléctricos, mecánicos, electromecánicos, así como pruebas y entrega de laboratorio para acreditar el cumplimiento de la norma NOM correspondiente, en la Facultad de Contaduría, Administración e Informática.

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

Dra. Viridiana Aydeé León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Dr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

NOTA

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Segundo Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 30/06/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD

3

Nombre de la obra:

Mantenimiento a cuatro plantas de tratamiento, así como a espacios académicos y de actividad física y deportiva en el Campus Norte (Facultad de Psicología)



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS


Porcentaje de avance

0%

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

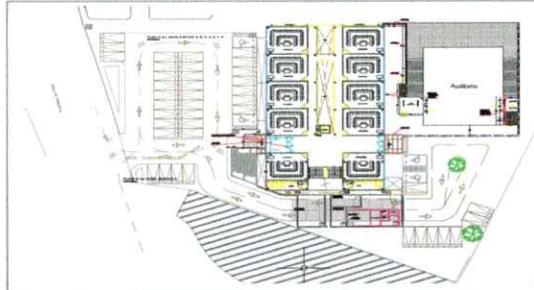

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal: Av. Universidad #1001, Col. Chamilpa, C.P. 62209, Cuemavaca, Morelos.

ANTES



Fachada de la Facultad de Psicología



Vistas del sitio en donde se realizarán los trabajos de: Limpieza de elementos, para la Facultad de Psicología.

Observaciones :

Lo presentado en el Reporte Fotográfico del segundo trimestre, corresponde a los espacios a intervenir mediante el fondo.

VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.

2025

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Segundo Trimestre
2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

Fecha de elaboración: 30/06/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD

3

Nombre de la obra:

Mantenimiento a cuatro plantas de tratamiento, así como a espacios académicos y de actividad física y deportiva en el Campus Norte (Facultad de Psicología)



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

0%


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

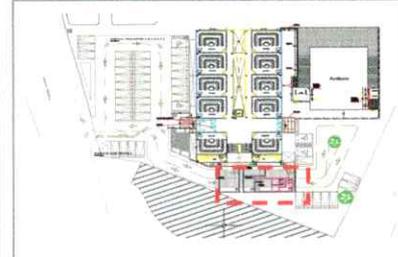

Dirección Postal: Av. Universidad #1001, Col. Chamilpa, C.P. 62209, Cuernavaca, Morelos.



Vistas del sitio en donde se realizarán los trabajos de: Revisión de equipos eléctricos, Así como Reparación o reposición de elementos eléctricos, mecánicos, electromecánicos, para la Facultad de Psicología.



Vistas del sitio en donde se realizarán los trabajos de: Caracterización del agua residual de acuerdo a parámetros de normas NOM aplicables, Así como la limpieza y/o desazolve de tanques reactor, para la Facultad de Psicología.



Vista del sitio en donde se realizarán trabajos de: Pruebas y Entrega de laboratorio para acreditar el cumplimiento de la norma NOM correspondiente, para la Facultad de Psicología.

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

Dra. Viridiana Aydée León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Dr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestañita, se podrán copiar tantas pestañitas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Segundo Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 30/06/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD

3

Nombre de la obra:

Mantenimiento a cuatro plantas de tratamiento, así como a espacios académicos y de actividad física y deportiva en el Campus Norte (Escuela de Turismo)



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

0%

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal: Av. Universidad #1001, Col. Chamilpa, C.P. 62209, Cuernavaca, Morelos.

ANTES



Fachada de la Escuela de Turismo



Vistas del sitio en donde se realizarán los trabajos de: Limpieza de elementos, Así como Albañilerías para optimización de sistemas, para la Escuela de Turismo.

Observaciones :

Lo presentado en el Reporte Fotográfico del segundo trimestre, corresponde a los espacios a intervenir mediante el fondo.

VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Segundo Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 30/06/2025

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL



Porcentaje de avance
0%

PROXIMIDAD **3**

Nombre de la obra: **Mantenimiento a cuatro plantas de tratamiento, así como a espacios académicos y de actividad física y deportiva en el Campus Norte (Escuela de Turismo)**



Dirección Postal: Av. Universidad #1001, Col. Chamipa, C.P. 62209, Cuernavaca, Morelos.



Vista del sitio en donde se realizaran los trabajos de: Revisión de equipos eléctricos, mecánicos, electromecánicos, Así como la Reparación o reposición de elementos eléctricos, para la Escuela de Turismo.



Vistas del sitio en donde se realizaran los trabajos de: Caracterización del agua residual, Así como limpieza y/o desazolve de tanques reactor, cárcamos, registros, criba, ductos y sedimentadores, para la Escuela de Turismo.



Vista del sitio en donde se realizaran trabajos de: Pruebas y Entrega de laboratorio para acreditar el cumplimiento de la norma NOM correspondiente, para la Escuela de Turismo.

[Signature]
Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

[Signature]
Dra. Viridiana Aydeé León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

[Signature]
Dr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

NOTA:
Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Segundo Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 30/06/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD

3

Nombre de la obra:

Mantenimiento a cuatro plantas de tratamiento, así como a espacios académicos y de actividad física y deportiva en el Campus Norte (Facultad de Ciencias Biológicas)



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS


Porcentaje de avance

0%


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

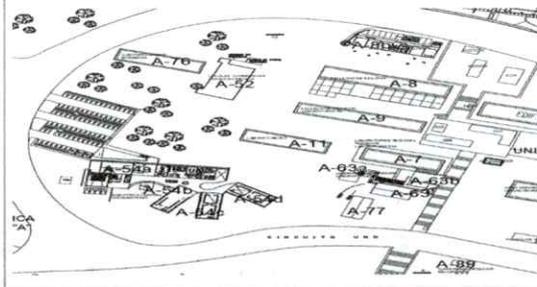

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

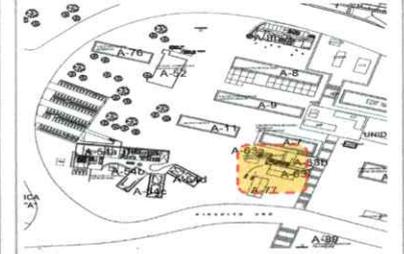

Dirección Postal: Av. Universidad #1001, Col. Chamilpa, C.P. 62209, Cuemavaca, Morelos.

ANTES



Fachada de la Facultad de Ciencias Biológicas



Vista del sitio en donde se realizaran los trabajos de: Limpieza de elementos, Así como Albañilerías para optimización de sistemas, para la Facultad de Ciencias Biológicas.

Observaciones :

Lo presentado en el Reporte Fotográfico del segundo trimestre, corresponde a los espacios a intervenir mediante el fondo.

VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Segundo Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 30/06/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIMORDIA

3

Nombre de la obra:

Mantenimiento a cuatro plantas de tratamiento, así como a espacios académicos y de actividad física y deportiva en el Campus Norte (Facultad de Ciencias Biológicas)



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS


Porcentaje de avance

0%


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

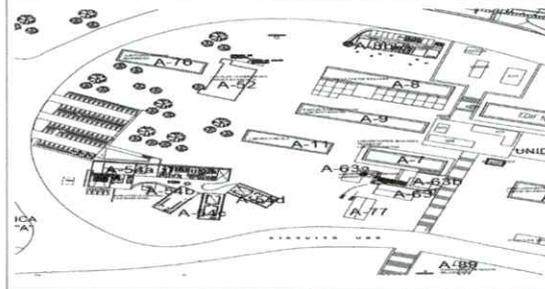

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

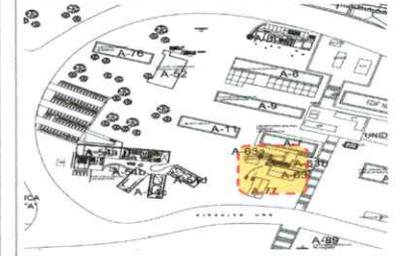


Dirección Postal: Av. Universidad #1001, Col. Chamilpa, C.P. 62209, Cuernavaca, Morelos.



Vista del sitio en donde se realizaran los trabajos de: Revisión de equipos eléctricos, mecánicos, electromecánicos y accesorios que la conforman, Así como Reparación o reposición de elementos eléctricos, mecánicos, electromecánicos, para la Facultad de Ciencias Biológicas



Vista del sitio en donde se realizaran los trabajos de: Implementación de limpieza y/o desazolve de tanques reactor, cárcamos, registros, criba, ductos y sedimentadores, para la Facultad de Ciencias Biológicas

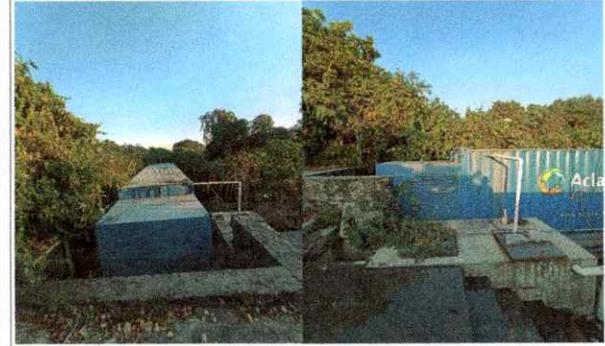

Vista del sitio en donde se realizaran trabajos de: Pruebas y Entrega de laboratorio para acreditar el cumplimiento de la norma NOM correspondiente, para la Facultad de Ciencias Biológicas

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

Dra. Viridiana Aydeé León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Dr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

NOTA:

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Segundo Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 30/06/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD

3

Nombre de la obra:

Mantenimiento a cuatro plantas de tratamiento, así como a espacios académicos y de actividad física y deportiva en el Campus Norte (Gimnasio auditorio)



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS


Porcentaje de avance

0%


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

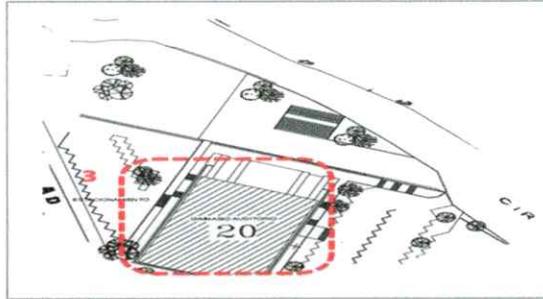

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

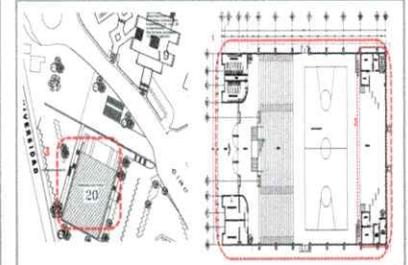

Dirección Postal: Av. Universidad #1001, Col. Chamilpa, C.P. 62209, Cuernavaca, Morelos.

ANTES



Fachada del Gimnasio Auditorio (Edif. A-20)



Vista del sitio en donde se realizarán los trabajos de: Mantenimiento al sistema de impermeabilizante en cubierta existente, para el edificio A-20 Gimnasio Auditorio.

Observaciones:

Lo presentado en el Reporte Fotográfico del segundo trimestre, corresponde a los espacios a intervenir mediante el fondo.

VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Segundo Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 30/06/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD

3

Nombre de la obra:

Mantenimiento a cuatro plantas de tratamiento, así como a espacios académicos y de actividad física y deportiva en el Campus Norte (Gimnasio auditorio)



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS


Porcentaje de avance

0%


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

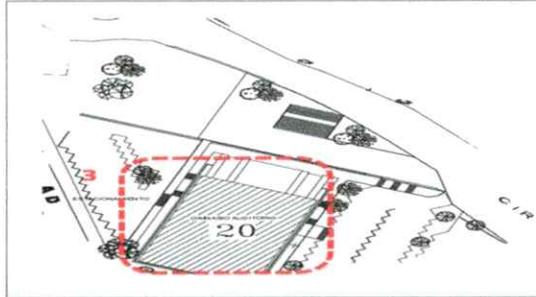

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

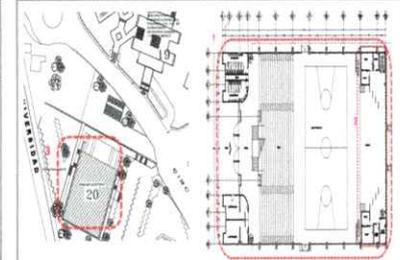

Dirección Postal: Av. Universidad #1001, Col. Chamilpa, C.P. 62209, Cuernavaca, Morelos.



Vistas del sitio en donde se realizarán los trabajos de: Mantenimiento a la estructura metálica existente con pintura de esmalte, para el edificio A-20 Gimnasio Auditorio.



Vista del sitio en donde se realizarán los trabajos de: Rehabilitación del escenario existente, para el edificio A-20 Gimnasio Auditorio.



Vista del sitio en donde se realizarán los trabajos de: Reparación de elementos existentes de concreto en fachada, para el edificio A-20 Gimnasio Auditorio.

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

Dra. Viridiana Aydeé León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Dr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

NOTA

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Segundo Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 30/06/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD

3

Nombre de la obra:

Mantenimiento a cuatro plantas de tratamiento, así como a espacios académicos y de actividad física y deportiva en el Campus Norte (Polideportivo 1)



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS


Porcentaje de avance

0%


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

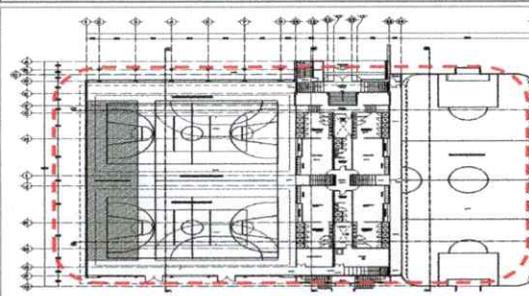


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

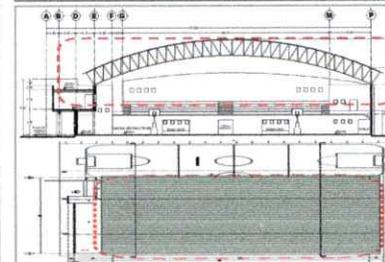

Dirección Postal: Av. Universidad #1001, Col. Chamilpa, C.P. 62209, Cuernavaca, Morelos.

ANTES

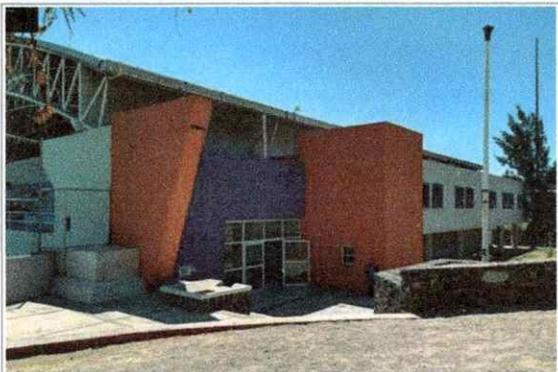

Fachada del Polideportivo 01 (edif. A-37)



Vistas del sitio en donde se realizaran los trabajos de: Mantenimiento a la Cubierta existente, para el edificio A-37 Polideportivo 01.

Observaciones :

Lo presentado en el Reporte Fotográfico del segundo trimestre, corresponde a los espacios a intervenir mediante el fondo.

VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Segundo Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 30/06/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD

3

Nombre de la obra:

Mantenimiento a cuatro plantas de tratamiento, así como a espacios académicos y de actividad física y deportiva en el Campus Norte (Polideportivo 1)



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS


Porcentaje de avance

0%


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO




CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

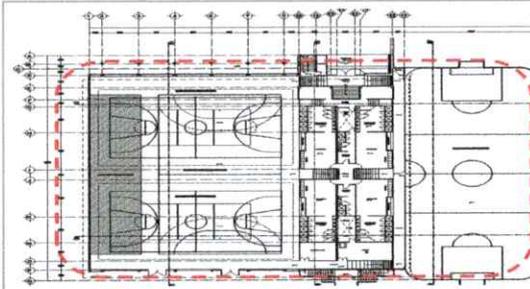

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

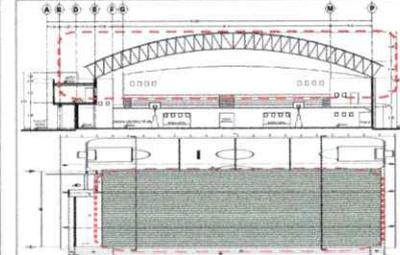

Dirección Postal: Av. Universidad #1001, Col. Chamilpa, C.P. 62209, Cuernavaca, Morelos.

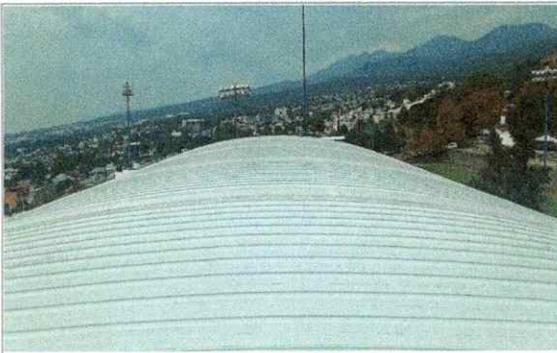

Vista del sitio en donde se realizarán los trabajos de: Mantenimiento a la Cubierta existente, para el edificio A-37 Polideportivo 01.



Vista del sitio en donde se realizarán los trabajos de: Mantenimiento a la estructura metálica existente con pintura de esmalte, para el edificio A-37 Polideportivo 01.



Vista del sitio en donde se realizarán los trabajos de: Mantenimiento a la estructura metálica existente con pintura de esmalte, para el edificio A-37 Polideportivo 01.

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

Dra. Viridiana Aydeé León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Dr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Segundo Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 30/06/2025

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

0%

PROPIEDAD

3


Nombre de la obra:

Mantenimiento a cuatro plantas de tratamiento, así como a espacios académicos y de actividad física y deportiva en el Campus Norte (Polideportivo 2)


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

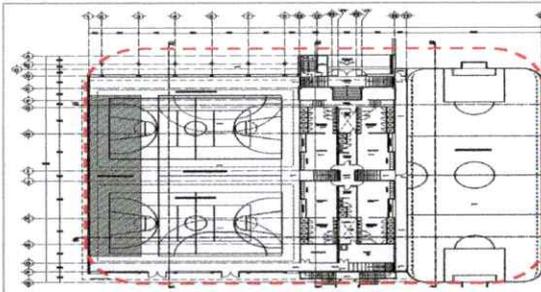


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

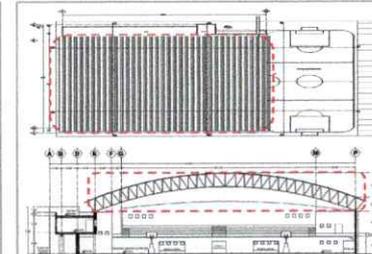

Dirección Postal: Av. Universidad #1001, Col. Chamipa, C.P. 62209, Cuernavaca, Morelos.

ANTES

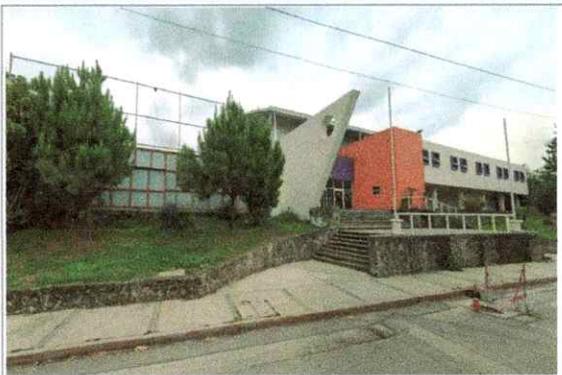

Fachada del Polideportivo 2 (edif. A-38)



Vistas del sitio en donde se realizaran los trabajos de: Mantenimiento a la Cubierta existente, en el edificio A-38 Polideportivo 02.

Observaciones:

Lo presentado en el Reporte Fotográfico del segundo trimestre, corresponde a los espacios a intervenir mediante el fondo.

VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Segundo Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 30/06/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD

3

Nombre de la obra:

Mantenimiento a cuatro plantas de tratamiento, así como a espacios académicos y de actividad física y deportiva en el Campus Norte (Polideportivo 2)



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS


Porcentaje de avance

0%


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

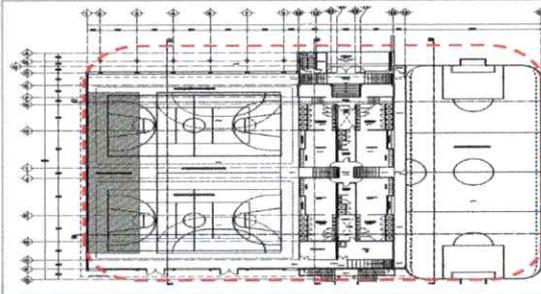

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

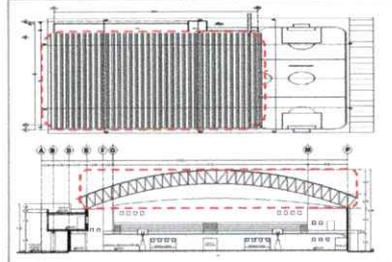

Dirección Postal: Av. Universidad #1001, Col. Chamilpa, C.P. 62209, Cuernavaca, Morelos.



Vistas del sitio en donde se realizarán los trabajos de: Mantenimiento a la Cubierta existente, en el edificio A-38 Polideportivo 02.



Vista del sitio en donde se realizarán los trabajos de: Mantenimiento a la estructura metálica existente con pintura de esmalte, en el edificio A-38 Polideportivo 02.



Vista del sitio en donde se realizarán los trabajos de: Mantenimiento a la estructura metálica existente con pintura de esmalte, en el edificio A-38 Polideportivo 02.

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

Dra. Viridiana Ayudé León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Dr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Segundo Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 30/06/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD

3

Nombre de la obra:

Mantenimiento a cuatro plantas de tratamiento, así como a espacios académicos y de actividad física y deportiva en el Campus Norte (Centro de lenguas)



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

0%


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO




UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS




Dirección Postal: Av. Universidad #1001, Col. Chamilpa, C.P. 62209, Cuernavaca, Morelos.

ANTES

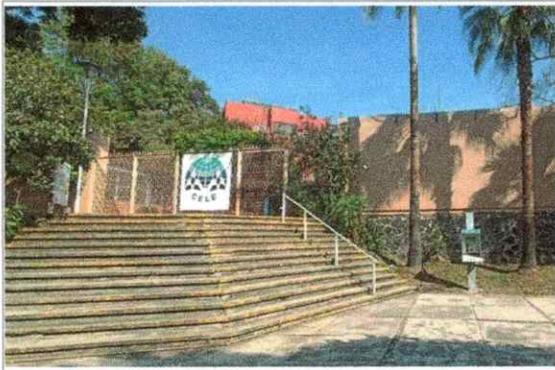

Fachada del Centro de Lenguas (CELE)

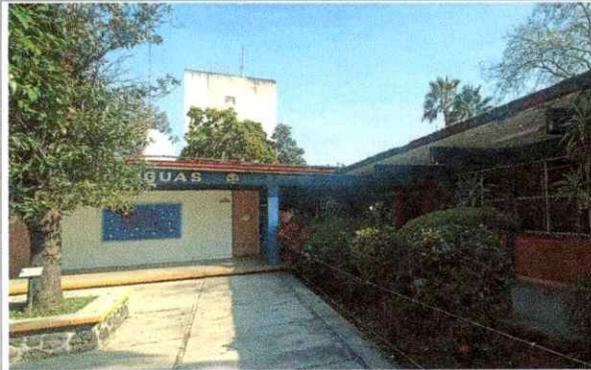

Vista del sitio en donde se relizaran los trabajos de Mantenimiento como : Preliminares y Albañilerías (Retiros Limpieza, Resanes entre otros), en el edificio A-5 Centro de Lenguas (CELE).

Observaciones :

Lo presentado en el Reporte Fotográfico del segundo trimestre, corresponde a los espacios a intervenir mediante el fondo.

VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.

2025

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Segundo Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 30/06/2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

0%

PRIORIDAD

3

Nombre de la obra:

Mantenimiento a cuatro plantas de tratamiento, así como a espacios académicos y de actividad física y deportiva en el Campus Norte (Centro de lenguas)


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO




UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

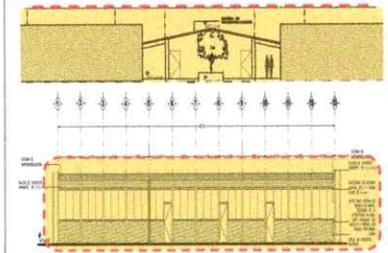

Dirección Postal: Av. Universidad #1001, Col. Chamilpa, C.P. 62209, Cuernavaca, Morelos.



Vista del sitio en donde se relizaran los trabajos de Mantenimiento como : Acabados (Aplicación de pinturas) Así como limpieza fina, en el edificio A-5 Centro de Lenguas (CELE)

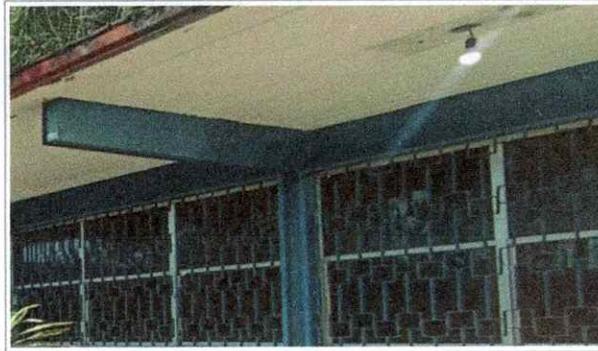

Vista del sitio en donde se relizaran los trabajos de Mantenimiento a Iluminacion, en el edificio A-5 Centro de Lenguas (CELE)



Vista del sitio en donde se relizaran los trabajos de Mantenimiento a Iluminacion, en el edificio A-5 Centro de Lenguas (CELE)

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

Dra. Viridiana Aydeé León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Dr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Segundo Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 30/06/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIMORDIAL

3

Nombre de la obra:

Mantenimiento a cuatro plantas de tratamiento, así como a espacios académicos y de actividad física y deportiva en el Campus Norte (Escuela de Teatro, Danza y Música)



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS


Porcentaje de avance

0%


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

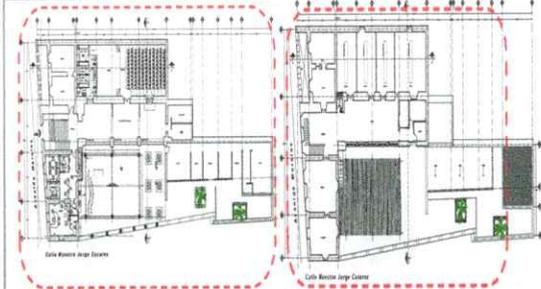

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

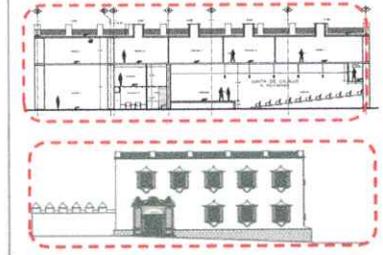

Dirección Postal: Av. Morelos Esq. Jorge Cázares # 180, Col. Centro C.P. 62000, Cuernavaca, Morelos.

ANTES



Fachada de la Escuela de Teatro, Danza y Música



Vista del sitio en donde se relizaran los trabajos de Mantenimiento como : Preliminares y Albañilerías (Retiros, Colocacion de Protecciones, Resanes entre otros), para la Escuela de Teatro, Danza y Música.

Observaciones :

Lo presentado en el Reporte Fotográfico del segundo trimestre, corresponde a los espacios a intervenir mediante el fondo.

VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Segundo Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 30/06/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD

3

Nombre de la obra:

Mantenimiento a cuatro plantas de tratamiento, así como a espacios académicos y de actividad física y deportiva en el Campus Norte (Escuela de Teatro, Danza y Música)



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS


Porcentaje de avance

0%


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO




CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

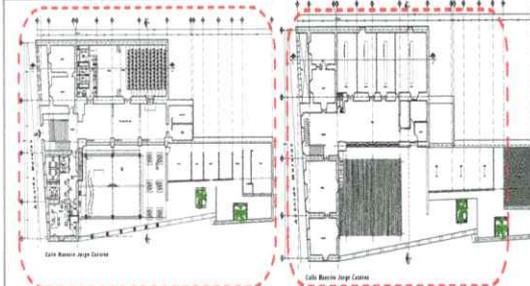

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal: Av. Morelos Esq. Jorge Cázares # 180, Col. Centro C.P. 62000, Cuemavaca, Morelos.

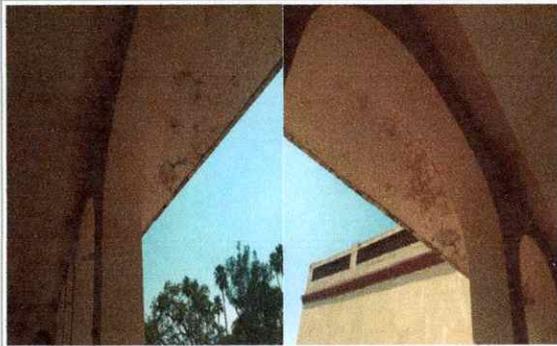

Vista del sitio en donde se relizaran los trabajos de Mantenimiento como : Preliminares y Albañilerias (Retiros, Colocacion de Protecciones, Resanes entre otros), para la Escuela de Teatro, Danza y Música.



Vista del sitio en donde se relizaran los trabajos de Mantenimiento como : Acabados (Aplicacion de pinturas) Asi como limpieza fina, para la Escuela de Teatro, Danza y Música.



Vista del sitio en donde se relizaran los trabajos de Mantenimiento como : Acabados (Aplicacion de pinturas) Asi como limpieza fina, para la Escuela de Teatro, Danza y Música.

Arg. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

Dra. Viridiana Aydeé León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Dr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

NOTA

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Segundo Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 30/06/2025

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

0%

PRORIDAD

4 Nombre de la obra: Adquirir el equipamiento necesario en los espacios académicos de los Campus Norte y Campus Oriente.



GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO




UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

Dirección Postal: Av. Universidad #1001, Col. Chamilpa, C.P. 62209, Cuernavaca, Morelos.

ANTES



Fachada del Centro de Investigaciones Biológicas y edificio A

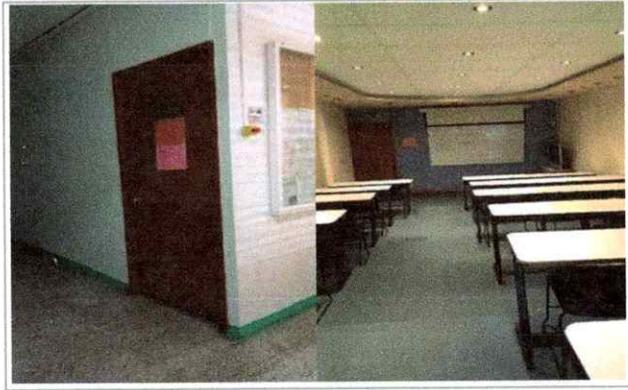

Se equipara Auditorio de usos múltiples 1 con 13 mesas rectangulares y 1 pizarrón blanco

Observaciones :
Lo presentado en el Reporte Fotográfico del segundo trimestre, corresponde a los espacios a intervenir mediante el fondo.
VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.



Se equipara Auditorio de usos múltiples 2 con 13 mesas rectangulares y 1 pizarrón blanco



Se equipará Auditorio con 2 aires acondicionados y 1 proyector



Se equipará Laboratorio con 1 congelador





Se equipará Bibloteca con 7 estantes sencillos de batería



Equipamiento de Centro de cómputo con 1 mesa, 11 sillas de visita, 6 computadoras de escritorio, 6 monitores para cpu, 2 video proyectores y 1 pantalla de proyección electrica

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura


Dra. Viridiana Aydeé León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos


Dr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

NOTA:

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Segundo Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 30/06/2025

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD

4 Nombre de la obra: Adquirir el equipamiento necesario en los espacios académicos de los Campus Norte y Campus Oriente.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

0%

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal: Av. Universidad #1001, Col. Chamilpa, C.P. 62209, Cuernavaca, Morelos.

ANTES



Fachada del Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Estudios Regionales



Se equipará Centro de cómputo con 9 piezas de Procesador AMD Ryzen y 14 piezas de Monitor para CPU



Observaciones :

Lo presentado en el Reporte Fotográfico del segundo trimestre, corresponde a los espacios a intervenir mediante el fondo.

VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

Dra. Viridiana Aydeé León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Dr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

NOTA:

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Segundo Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 30/06/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRORIDAD


4

Nombre de la obra: Adquirir el equipamiento necesario en los espacios académicos de los Campus Norte y Campus Oriente.


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

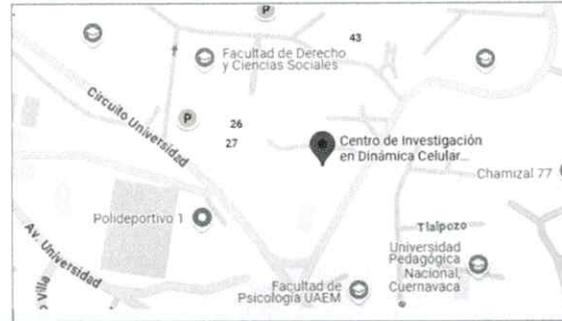

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

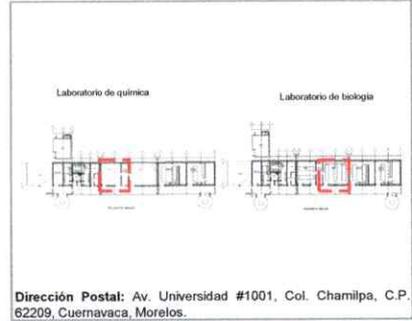

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

0%

ANTES



Fachada del Centro de Investigación en Dinámica Celular



Equipamiento del Laboratorio de Química con 1 incubadora con agitación y 1 termoblock (baño seco)

Observaciones :

Lo presentado en el Reporte Fotográfico del segundo trimestre, corresponde a los espacios a intervenir mediante el fondo.

VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.



Equipamiento de Laboratorio de Biología con 1 incubadora y 1 lector de microplacas

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

Dra. Viridiana Aydeé León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Dr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

NOTA:

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la **misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.**

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Segundo Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 30/06/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRORIDAD

4 Nombre de la obra: Adquirir el equipamiento necesario en los espacios académicos de los Campus Norte y Campus Oriente.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

0%

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal: Av. Universidad #1001, Col. Chamilla, C.P. 62209, Cuernavaca, Morelos.

ANTES



Fachada del Centro de Investigación Interdisciplinar para el Desarrollo Universitario



Se equipará el Aula de Usos Múltiples 1 con 1 aire acondicionado

Observaciones :

Lo presentado en el Reporte Fotográfico del segundo trimestre, corresponde a los espacios a intervenir mediante el fondo.


VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.



Se equipará el Aula de Usos Múltiples 2 con 2 libreros y 7 mesas de trabajo multiusos




Se equipará Aula de Posgrado 1 (salón de clase) con 1 aire acondicionado

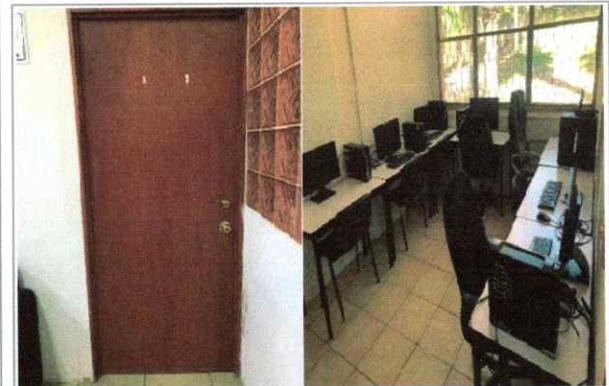

Se equipará Centro de cómputo con 1 proyector, 1 pantalla eléctrica para proyector, 15 mesas de trabajo multiusos, 3 libreros y 1 aire acondicionado


Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura


Dra. Viridiana Aydeé León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos


Dr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

NOTA

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Segundo Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 30/06/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRICIDAD

4 Nombre de la obra: Adquirir el equipamiento necesario en los espacios académicos de los Campus Norte y Campus Oriente.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS


Porcentaje de avance

0%

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

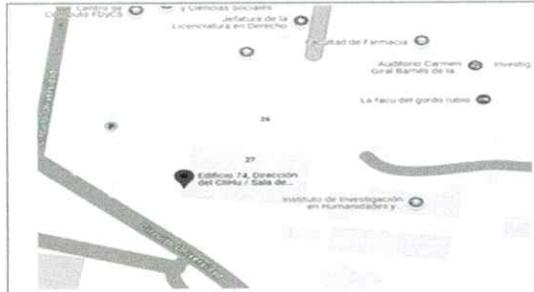

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal: Av. Universidad #1001, Col. Chamilpa, C.P. 62209, Cuernavaca, Morelos.

ANTES



Fachada del Centro Interdisciplinario de Investigación en Humanidades



Se equipará Centro de cómputo con 1 aire acondicionado

Observaciones :

Lo presentado en el Reporte Fotográfico del segundo trimestre, corresponde a los espacios a intervenir mediante el fondo.


VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.



Se equipará Centro de cómputo de la MPE con 4 Procesadores AMD Ryzen, 4 monitores y 1 mesa para pc


Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura


Dra. Viridiana Aydeé León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos


Dr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

NOTA:

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Segundo Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 30/06/2025

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD

4 Nombre de la obra: Adquirir el equipamiento necesario en los espacios académicos de los Campus Norte y Campus Oriente.




UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

0%


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

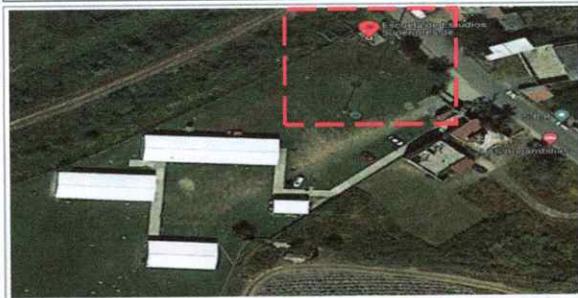

CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO




UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal: Av. Miguel Hidalgo S/N Col. Ahuatlán, Totolapan Morelos, México, 62834.

ANTES



Fachada de la Escuela de Estudios Superiores de Atlalahucan Subsede Totolapan



Se equipará Aula 4 con 31 butacas escolares

Observaciones :

Lo presentado en el Reporte Fotográfico del segundo trimestre, corresponde a los espacios a intervenir mediante el fondo.

VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.



Se equipará Laboratorio de Ginecología con 2 simuladores de parto y 1 Locker de tres puertas de 9 casillas

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernandez
Director General de Infraestructura

Dra. Viridiana Aydes León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Dr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

NOTA:

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Segundo Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 30/06/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD

4 Nombre de la obra: Adquirir el equipamiento necesario en los espacios académicos de los Campus Norte y Campus Oriente.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

0%


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO




UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal: Avenida Nicolás S/N, Parque Industrial, en el municipio de Ayala, Morelos.

ANTES

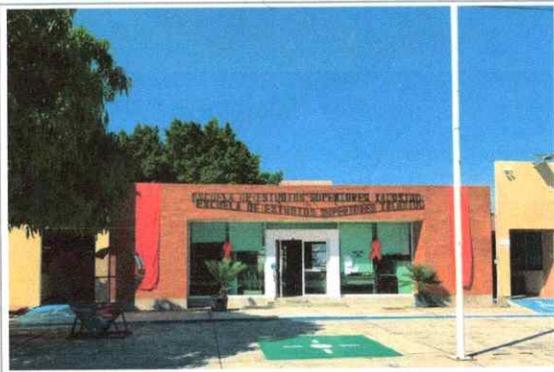

Fachada de la Escuela de Estudios Superiores de Xalostoc




Se equipará Laboratorio de Operaciones unitarias con 1 columna de destilación

Observaciones :

Lo presentado en el Reporte Fotográfico del segundo trimestre, corresponde a los espacios a intervenir mediante el fondo.

VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.

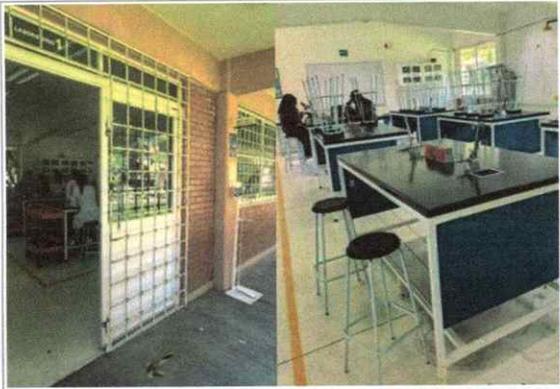

Se equipará Laboratorio de Química Básica con 1 microscopio binocular biológico y 1 microscopio estereoscópico



Se equipará Laboratorio de Análisis de Suelos con 2 probadores de suelo

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

Dra. Viridiana Aydeé León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Dr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

NOTA:

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Segundo Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 30/06/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRICORIDAD

4 Nombre de la obra: Adquirir el equipamiento necesario en los espacios académicos de los Campus Norte y Campus Oriente.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

0%


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal: Calle Ingeniero Felipe Rivera Crespo s/n Col. Buenavista, Yauatepec de Zaragoza, Morelos, C.P.62730.

ANTES



Fachada de la Escuela de Estudios Superiores de Yauatepec



Se equipará Auditorio con 90 butacas para auditorio

Observaciones :

Lo presentado en el Reporte Fotográfico del segundo trimestre, corresponde a los espacios a intervenir mediante el fondo.

VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

Dra. Viridiana Aydeé León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Dr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

NOTA:

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Segundo Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 30/06/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD

4 Nombre de la obra: Adquirir el equipamiento necesario en los espacios académicos de los Campus Norte y Campus Oriente.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

0%


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO




UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

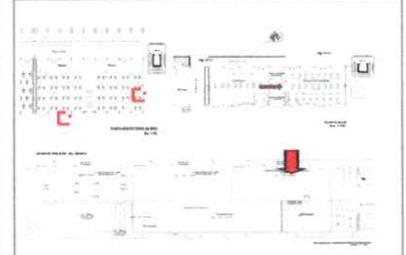


Dirección Postal: Avenida Universidad #1001, Col. Chamilpa, C.P. 62209, Cuernavaca, Morelos.

ANTES

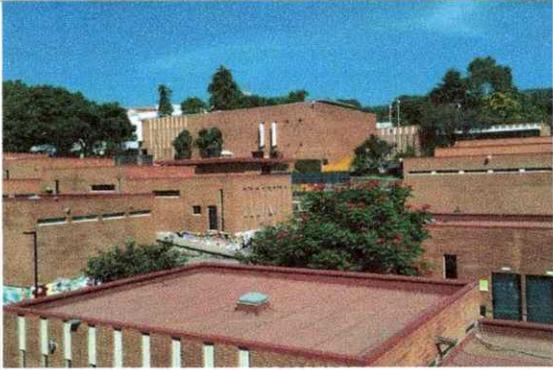

Fachada de la Facultad de Artes

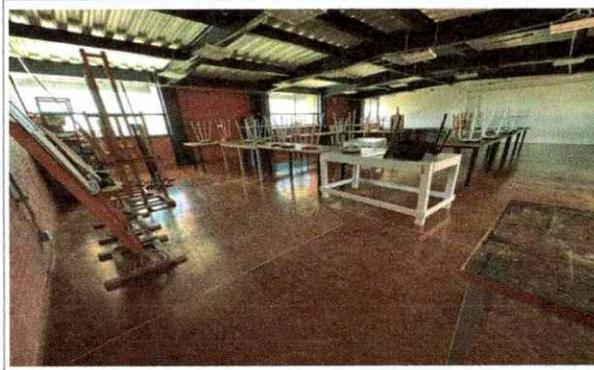


Se equipará Taller de pintura 1 con 18 caballetes de madera y 20 bancos de madera


Observaciones :

Lo presentado en el Reporte Fotográfico del segundo trimestre, corresponde a los espacios a intervenir mediante el fondo.


VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.

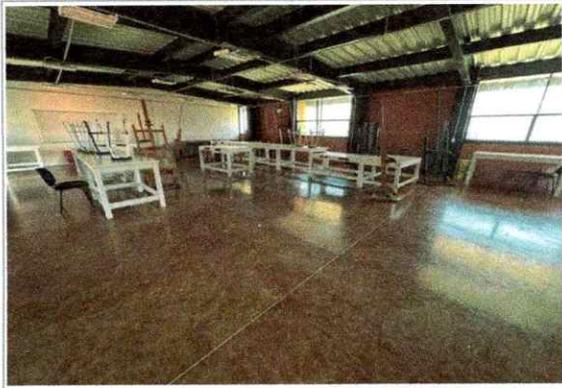

Se equipará Taller de pintura 2 con 20 bancos de madera

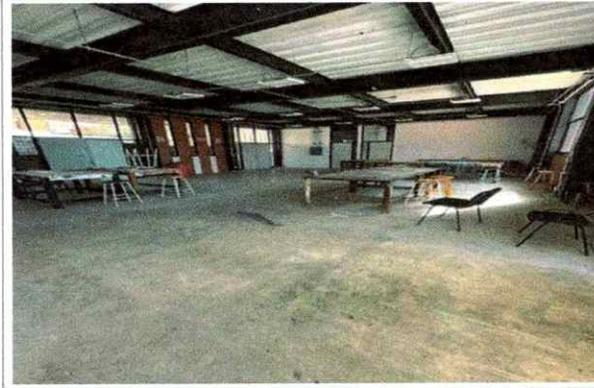



Se equipará Taller de escultura (modelado) con 4 mesas de trabajo de uso rudo, 21 bancos metálicos con asiento de madera y 1 gabinete de acero inoxidable

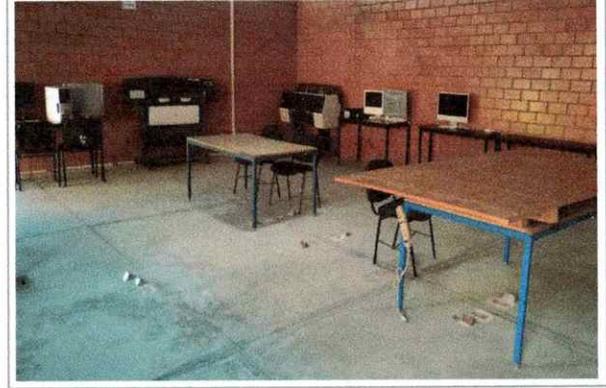

Se equipará Laboratorio de impresión digital con 2 Computadoras IMAC Apple Chip M4 512 gb


Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura


Dra. Viridiana Aydeé León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos


Dr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

NOTA:

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Segundo Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 30/06/2025

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRORIDAD

4 Nombre de la obra: Adquirir el equipamiento necesario en los espacios académicos de los Campus Norte y Campus Oriente.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS


Porcentaje de avance

0%


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

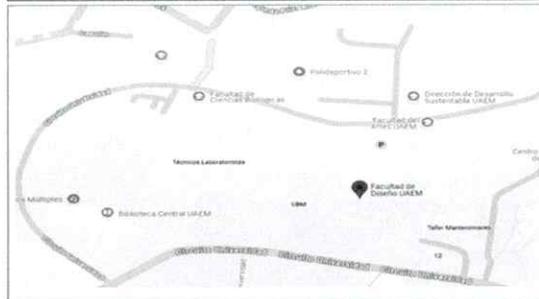


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal: Avenida Universidad #1001, Col. Chamilpa, C.P. 62209, Cuernavaca, Morelos.

ANTES

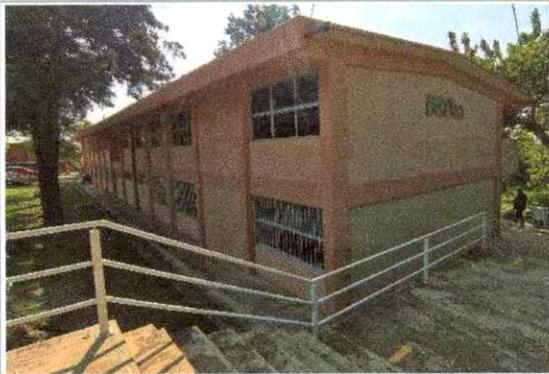

Fachada de la Facultad de Diseño




Se equipará Aula de usos múltiples con 1 sistema de sonido empotrable

Observaciones :

Lo presentado en el Reporte Fotográfico del segundo trimestre, corresponde a los espacios a intervenir mediante el fondo.

VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.

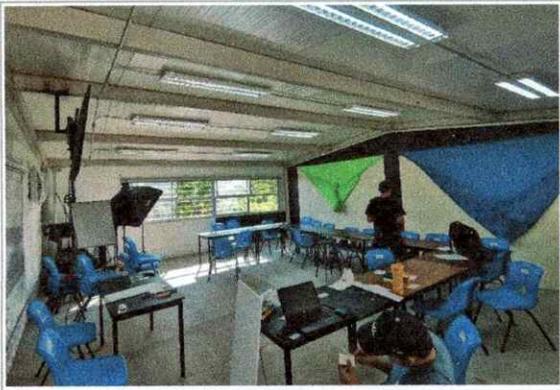


Se equipará Laboratorio de Fotografía y Video con 1 Sistema de iluminación semifija




Se equipará Laboratorio Industrial con 1 Equipo de termoformado, 1 Router CNC y 3 Equipos de manufactura tridimensional



Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura



Dra. Viridiana Aydeé León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos



Dr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

NOTA:

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Segundo Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 30/06/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD

4 Nombre de la obra: Adquirir el equipamiento necesario en los espacios académicos de los Campus Norte y Campus Oriente.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

0%


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO




UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

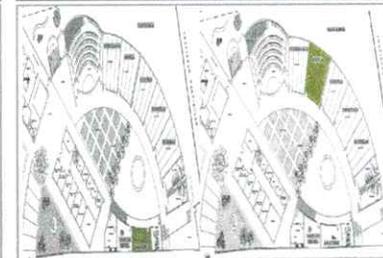

Dirección Postal: Pico de Orizaba #2, Col. Los Volcanes, C.P. 62350, Cuernavaca, Morelos.

ANTES



Fachada de la Facultad de Enfermería




Se equipará Aula Cuernavaca con 1 Silla para docente, 1 pantalla para proyector, 1 proyector y 1 escritorio

Observaciones :

Lo presentado en el Reporte Fotográfico del segundo trimestre, corresponde a los espacios a intervenir mediante el fondo.

VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.

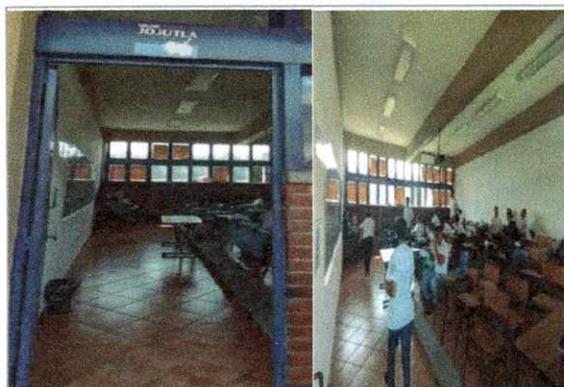

Se equipará Aula Jojutla con 1 silla para docente, 1 pantalla para proyector, 1 proyector y 1 escritorio



Se equipará Aula Cuautla con 1 silla para docente, 1 pantalla para proyector, 1 proyector y 1 escritorio



Se equipará Aula Tepoztlán con 1 silla para docente, 1 pantalla para proyector y 1 escritorio



Se equipará Aula Huitzilac con 1 silla para docente, 1 pantalla para proyector y 1 escritorio



Se equipará Aula Zacatepec con 1 silla para docente, 1 pantalla para proyector y 1 escritorio



Se equipará Aula Coatlán del Río con 1 silla para docente, 1 pantalla para proyector y 1 escritorio



Se equipará Aula Amacuzac con 1 silla para docente, 1 pantalla para proyector y 1 escritorio



Se equipará Aula Xochitepec con 1 silla para docente, 1 pantalla para proyector y 1 escritorio



Se equipará Aula Puente de Ixtla con 1 silla para docente, 1 pantalla para proyector y 1 escritorio




Se equipará Aula de Miacatlán con 1 silla para docente y 1 escritorio




Se equipará Aula Yecapixtla con 1 escritorio y 1 silla para docente



Se equipará Centro de autoacceso 1 con 1 proyector

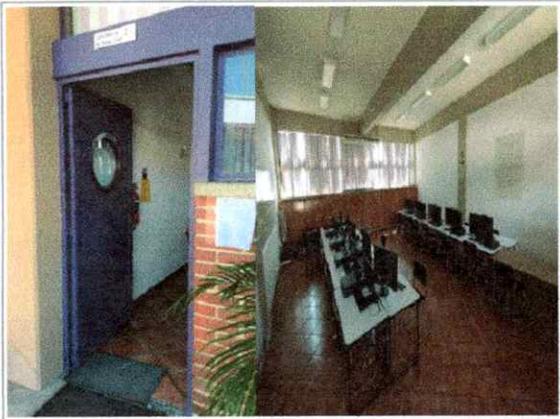

Se equipará Centro de auto acceso 2 con 1 proyector

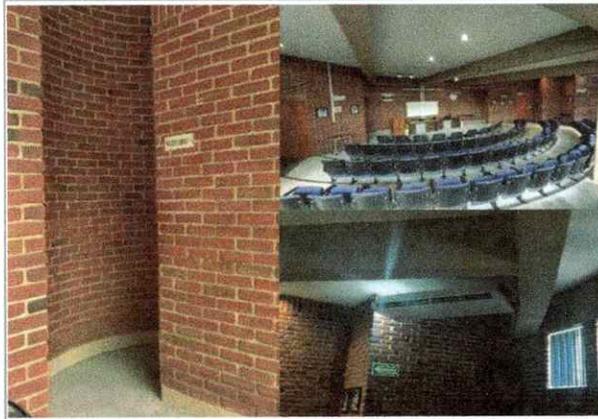


Se equipará Auditorio con 1 aire acondicionado



Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura



Dra. Viridiana Aydeé León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos



Dr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

NOTA:

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Segundo Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 30/06/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIMORDIAL

4 Nombre de la obra: Adquirir el equipamiento necesario en los espacios académicos de los Campus Norte y Campus Oriente.




UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS


Porcentaje de avance

0%

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

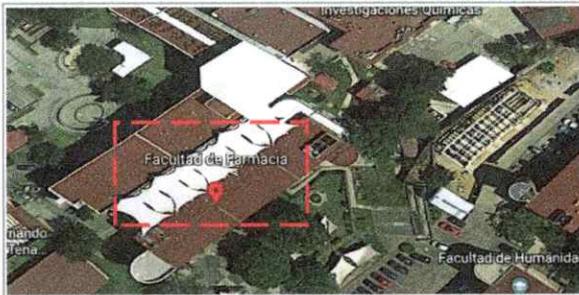

CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

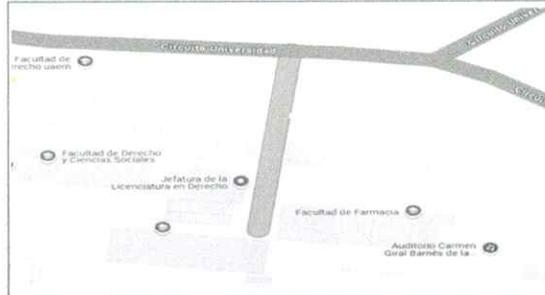


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal: Av. Universidad #1001, Colonia Chamitpa, Cuernavaca, Morelos, CP, 62209.

ANTES

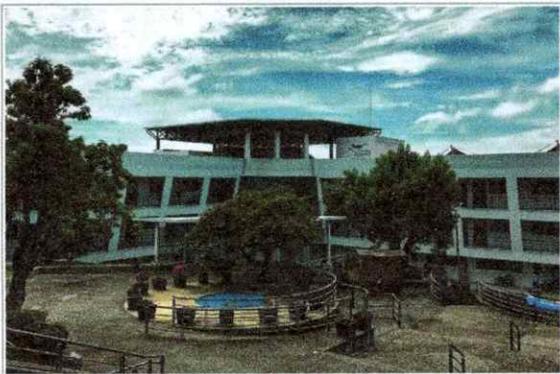

Fachada de la Facultad de Farmacia



Se equipará Laboratorio Farmacia Comunitaria con 2 escritorios recepción y 1 góndola a pared, 1 mueble cajonera para medicamentos, 2 anaqueles Farmacia, 3 anaqueles con medidas generales, 3 escritorios ejecutivos, 1 mueble cajonero para medicamentos, 1 estructura en aluminio anodizado, 2 lockers metálico en tándem, 1 mesa con doble repisa, 2 balanzas de precisión, 1 archivero Tam-Mex y 1 minisplit

Observaciones :

Lo presentado en el Reporte Fotográfico del segundo trimestre, corresponde a los espacios a intervenir mediante el fondo.

VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.




Se equipará Laboratorio de Docencia con 2 centrifugas clínicas, 2 medidor de pH y mV de mesa, 1 baño ultrasónico, 1 espectrofotómetro y balanza de precisión



Se equipará Laboratorio de Simulación con 1 espectrofotómetro UV Vis, 2 medidores de PH y MV de mesa, balanza analítica y 1 balanza de precisión


Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura


Dra. Viridiana Aydes León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos


Dr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

NOTA:

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Segundo Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 30/06/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD

4 Nombre de la obra: Adquirir el equipamiento necesario en los espacios académicos de los Campus Norte y Campus Oriente.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

0%

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal: Calle Iztacuiluati #100, Col. Volcanes, C.P. 62350, Cuernavaca, Morelos.

ANTES



Fachada de la Facultad de Medicina




Se equipará Laboratorio de Fisiología y Farmacología con 1 Espectrofotómetro y 1 mesa de exploración con pierneras

Observaciones :

Lo presentado en el Reporte Fotográfico del segundo trimestre, corresponde a los espacios a intervenir mediante el fondo.

VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.

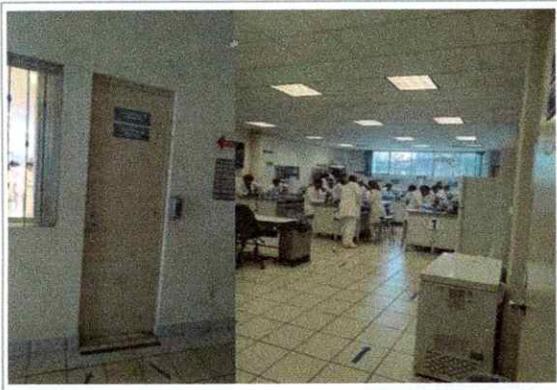

Se equipará Laboratorio de Histología y Embriología con 5 microscopios binoculares



Se equipará Laboratorio de habilidades con 3 Maniquies paquete CPR y 2 maniquies paquete CPR Little junior.

Ara. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

Dra. Viridiana Aydeé León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Dr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

NOTA:

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Segundo Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 30/06/2025

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD

4 Nombre de la obra: Adquirir el equipamiento necesario en los espacios académicos de los Campus Norte y Campus Oriente.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS


Porcentaje de avance

0%


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

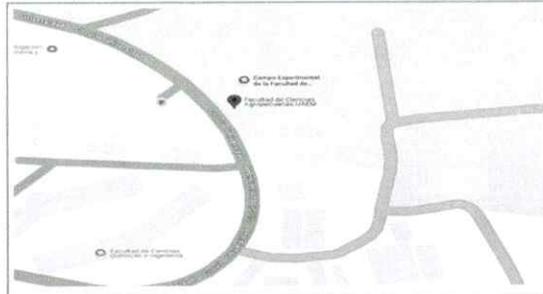

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal: Av. Universidad #1001, Col. Chamilpa, C.P. 62209, Cuernavaca, Morelos.

ANTES



Fachada de la Facultad de Ciencias Agropecuarias



Se equipará Laboratorio de Docencia Edificio 71 planta primer nivel con 5 Microscopios y 2 Anaqueles Metálicos

Observaciones :

Lo presentado en el Reporte Fotográfico del segundo trimestre, corresponde a los espacios a intervenir mediante el fondo.


VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.



Se equipará Laboratorio de alimentos - Edificio 71 planta primer nivel con 1 Licuadora industrial, 1 empacadora al alto vacío, 1 horno para pan 4 charolas tipo gaveta, 1 congelador horizontal y 2 mesas de trabajo



Se equipará Laboratorio 2 Producción Agrícola - Edificio 71 planta baja con 20 Bancos para laboratorio y 2 Anaqueles metálicos

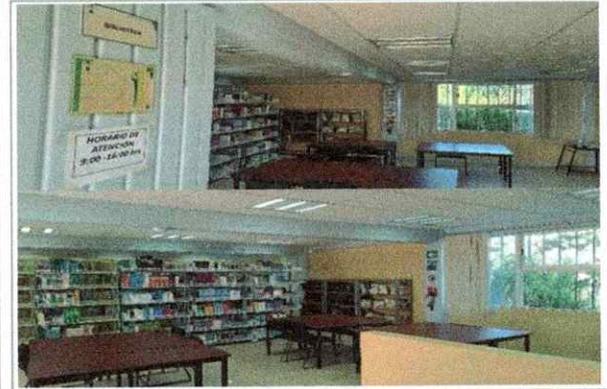

Se equipará Biblioteca - Edificio 72 planta baja con 1 Aire acondicionado

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

Dra. Viridiana Aydeé León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Dr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

NOTA:

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Segundo Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 30/06/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD

4 Nombre de la obra: Adquirir el equipamiento necesario en los espacios académicos de los Campus Norte y Campus Oriente.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

0%


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

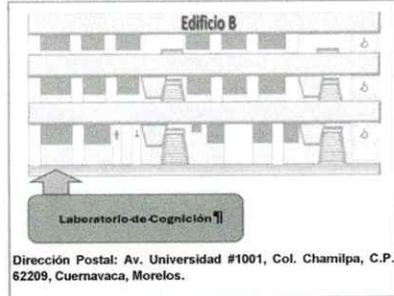

ANTES



Fachada de la Facultad de Ciencias del Deporte



Se equipará Laboratorio de Evaluación del Rendimiento con 1 tsensor, 3 plataformas de contacto DIN-A2, 2 sensores de fuerza y 1 Wimbu

Observaciones :

Lo presentado en el Reporte Fotográfico del segundo trimestre, corresponde a los espacios a intervenir mediante el fondo.

VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.



Se equipará Laboratorio de Cognición y Psicología Deportiva con 2 Meta Quest 3 512gb 4k Lente de Realidad Virtual



Se equipará Centro de Cómputo con 11 monitores, 11 CPU y 1 proyector

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

Dra. Viridiana Aydeé León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Dr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

NOTA

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Segundo Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 30/06/2025

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD

5 Nombre de la obra: Construcción de la planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Escuela de Estudios Superiores del Jicarero



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS


Porcentaje de avance

0%


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

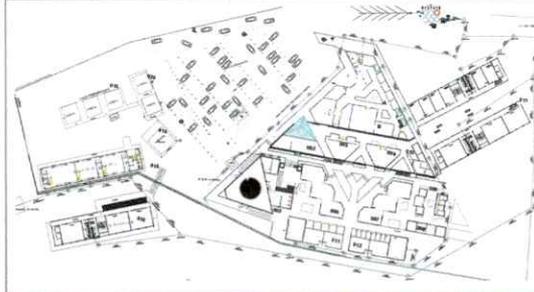


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal: Carretera Galeana-Tequesquitengo S/N Com. El Jicarero C.P. 62909 en el Municipio de Jojutla, en el Estado de Morelos.

ANTES

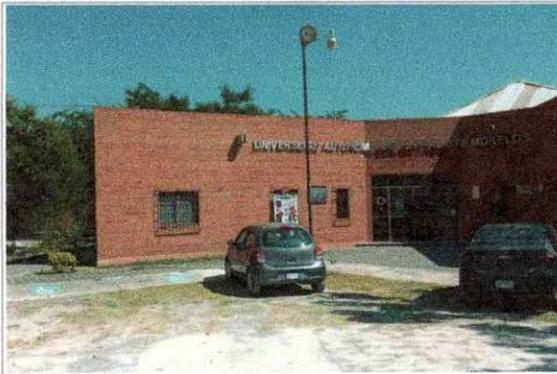

Fachada de la Escuela de Estudios Superiores del Jicarero



Vista del sitio en donde se relizaran los trabajos de: Preliminares (Delimitar, Nivelacion, despalmes de terreno, excavaciones, compataciones entre otras), en la Escuela de Estudios Superiores del Jicarero.

Observaciones :

Lo presentado en el Reporte Fotográfico del segundo trimestre, corresponde a los espacios a intervenir mediante el fondo.

VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Segundo Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 30/06/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD

5

Nombre de la obra: Construcción de la planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Escuela de Estudios Superiores del Jicarero



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS


Porcentaje de avance

0%


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

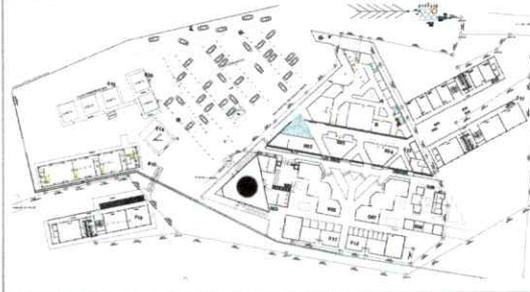

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal: Carretera Galeana-Tequesquitengo S/N Com. El Jicarero C.P. 62909 en el Municipio de Jojutta, en el Estado de Morelos.



Vista del sitio en donde se relizaran los trabajos de: Suministro y colocacion de Planta de tratamiento y Colocacion de rellenos,



Vista del sitio en donde se relizaran los trabajos de: Construccion de cuarto de maquina, Asi, como la Construccion de Campo de Oxidacionen la Escuela de Estudios Superiores del Jicarero.



Vista del sitio en donde se relizaran los trabajos de: Limpiezas en areas de trabajo, en la Escuela de Estudios Superiores del Jicarero.

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

Dra. Viridiana Aydes León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Dr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

NOTA

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.
