



UAEM
DIRECCIÓN GENERAL
DE INFRAESTRUCTURA

26 SEP 2018 00:742

RECTORÍA

RECIBIDO

HORA: 9:48 FOLIO: CUERNAVACA, MORELOS, 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018 R/349/2018

ACUSE

DR. ISAÍAS ELIZARRARAZ ALCARAZ
DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
UNIVERSITARIA (DGESU)
PRESENTE

RECIBIDO
COORDINACIÓN GENERAL DE
PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
26 SET. 2018 9:49 U.A.E.M.

RECIBIDO
11:30
25 SEP 2018
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
UNIVERSITARIA

En el marco del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), hago llegar a Usted en versión electrónica (CD) lo siguiente:

Agosto de 2018

- Informes de avance de obras del FAM ejercicios 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017.
- Reporte descriptivo del informe de avance mensual del FAM 2018 (mantenimientos y adecuación de espacios).

Dicha información fue remitida, en los tiempos establecidos, a las cuentas de correo electrónico isaias.elizarraraz@nube.sep.gob.mx y rocioc@nube.sep.gob.mx.

En este sentido le informo que el Sistema Integral de Información de la Subsecretaría de Educación Superior (SIISES) se encuentra actualizado conforme a los tiempos establecidos.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y quedo de usted como su atento y seguro servidor.

Atentamente

Por una Humanidad Culta
Una universidad de excelencia

DR. GUSTAVO URQUIZA BELTRÁN
Rector

RECIBIDO
11:45
25 SEP 2018
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
2 CDs.

UAEM
RECTORÍA

- C.c.p. Dr. Salvador Malo Álvarez. Director General de Educación Superior Universitaria.- Para su conocimiento.
- M. en A. Rocío Chávez Mayo. Subdirectora de Fomento Institucional.- Mismo fin.
- Dr. Álvaro Zamudio Lara. Coordinador General de Planeación y Administración, y Responsable Institucional del SIISES.- Mismo fin.
- C.P. Filiberto Suárez Díaz. Encargado de despacho de la Dirección General de Infraestructura.- Mismo fin.
- Archivo.

GUB/AZL/PAMA/ANPM/rifj

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



PRIORIDAD

1

Nombre de la obra:

Mantenimiento de espacios académicos de Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

 Avenida Universidad # 1001 Colonia Chamipa,
 Código Postal 62209, Cuernavaca, Morelos

 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
 ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

0%

FOTOGRAFÍAS (E. ANTES)



F1: Fachada principal




F2: lateral

Comentarios de los trabajos realizados:


Trabajos pendientes a realizarse:

1. Fachada principal (F1)
2. Fachada lateral (F2)
3. Impermeabilización de azoteas (F3)
4. Impermeabilización de azoteas (F4)

Mediante oficio R/339/2018 se le solicita al C. Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, la ministración de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) ejercicio 2018, por un monto de \$25,816,570.44 (veinticinco millones ochocientos dieciséis mil quinientos setenta pesos 44/100 M.N.).

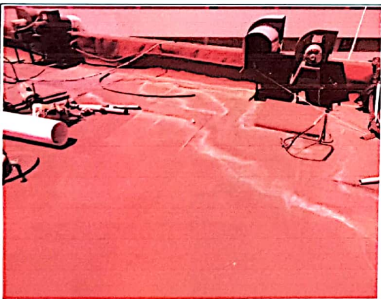

F3: Fachada posterior

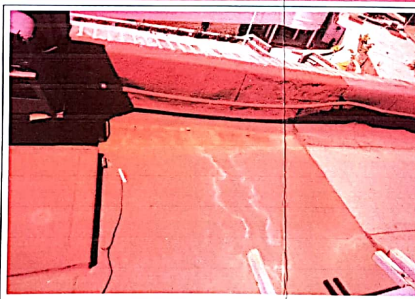




F4: Entrada

F6: Interior de aula

 Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
 Rector

 C.P. Filiberto Sosa Díaz
 Encargado de Despacho de la Dirección General de Infraestructura

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

 <p>UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS</p> <p>Trabajo en desarrollo</p> <p>Porcentaje de avance</p>	<p>PREVIDENCIA 1</p> <p>Nombre de la obra: Mantenimiento de espacios académicos del Centro de Investigaciones Químicas</p> <p>CROQUIS DE LOCALIZACIÓN</p> 	<p>UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO</p> <p>Avenida Universidad # 1001 Colonia Chamilpa, Código Postal 62209, Cuemavaca, Morelos</p> 
<p>0%</p>		

FOTOGRAFÍAS "EL ANTES"



F1: Fachada principal edif. 49




F2: Fachada Principal del Edificio 60

Comentarios de los trabajos realizados:


Trabajos pendientes a realizarse:

- 1- Impermeabilización edificio 40 (F1, F3 y F4)
- 2- Impermeabilización edificio 60 (F2 y F5)


Mediante oficio R/338/2018 se le solicita al C. Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, la ministración de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) ejercicio 2018, por un monto de \$25,816,570.44 (veinticinco millones ochocientos dieciséis mil quinientos setenta pesos 44/100 M.N.).

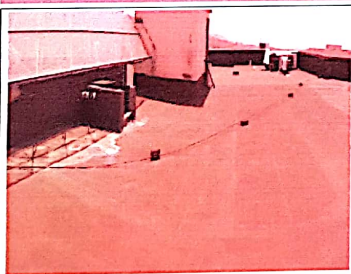

F3: Techo Edificio 49

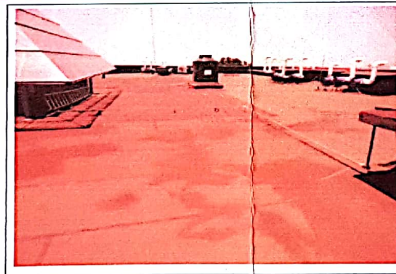


F4: Techo Edificio 49



F5: Techo edificio 60



Dr. Gustavo Urquiza Boltrán
Rector



C.P. Fabián Solís Díaz
Encargado de Despacho de la Dirección General de Infraestructura

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL


PRIORIDAD

1

Nombre de la obra:

Mantenimiento de espacios académicos del Centro de Investigación en Ciencias (CInC)

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Avenida Universidad # 1001 Colonia Champlpa,
Código Postal 62209, Cuernavaca, Morelos




UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

Escuela de Ingeniería


Porcentaje de avance

0%

FOTOGRAFÍAS (E. ANTES)

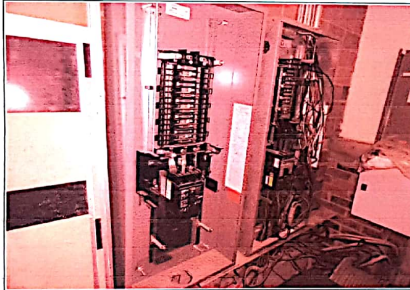

F1: Tableros eléctricos actuales

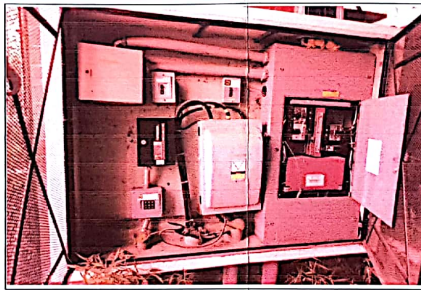

F2: Conductores eléctricos

Comentarios de los trabajos realizados:

Trabajos pendientes a realizarse:

1. Cambio de tableros eléctricos (F1)
2. Reacomodo general de conductores eléctricos y balanceo de cargas (F2)
3. Reubicación y mantenimiento de aires acondicionados del edificio (F3)
4. Mantenimiento y remodelación de sanitarios (F4)
5. Sustitución de lámparas fluorescentes por tecnología led (F5)


Mediante oficio R/339/2018 se le solicita al C. Greco Luis Rámirez Garrido Abreu, Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, la ministración de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) ejercicio 2018, por un monto de \$25,818,570.44 (veinticinco millones ochocientos dieciséis mil quinientos setenta pesos 44/100 M.N.).



F3: Aires acondicionados



F4: Sanitarios

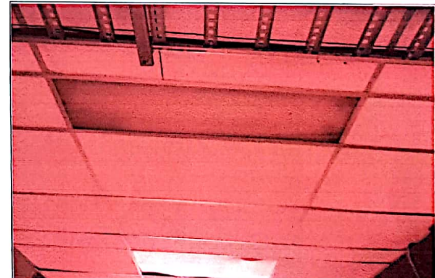

F5: Lámparas



Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector

C.P. Filiberto Páez Díaz
Encargado de Despacho de la Dirección General de Infraestructura

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIMORDIAL 1 Nombre de la obra: **Mantenimiento de espacios académicos del Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAP)**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Avenida Universidad # 1001 Colonia Chamilpa,
Código Postal 62209, Cuernavaca, Morelos



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Instituto de Planeación

Porcentaje de avance

0%

FOTOGRAFÍAS (EL ANTES)



F1: Planta de emergencia



F2: Instalaciones Eléctricas

Comentarios de los trabajos realizados:

Trabajos pendientes a realizarse:

1. Mantenimiento a planta de emergencia (F1).
2. Normalización de las instalaciones eléctrica (F2).
3. Instalación de sistema de tierras para las nuevas instalaciones (F3).
4. Mantenimiento y aplicación de pintura en laboratorios de Investigación (F4).
5. Pavimentación y fabricación de muro con puerta de acceso para adecuación de espacio para laboratorio e instalación de servicios de luz y agua (F5).


Mediante oficio R/339/2018 se le solicita al C. Graco Luis Rámirez Gamdo Abreu, Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, la ministración de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) ejercicio 2018, por un monto de \$25,816,570.44 (veinticinco millones ochocientos dieciséis mil quinientos setenta pesos 44/100 M.N.).



F3: Instalación sistema de tierras



F4: Laboratorios de Investigación

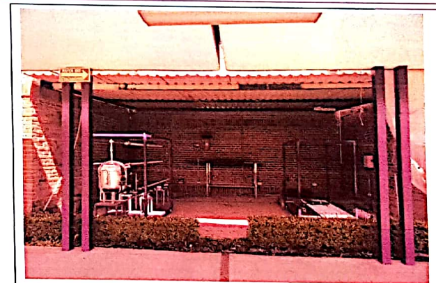

F5: Interior de aula (laboratorio)

Dr. Gustavo Ureaza Boltrán
Rector

C.F. Filberto Suárez Vázquez
Encargado de Despacho de la Dirección General de Infraestructura

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL


PRIMORDIAL

1

Nombre de la obra:

Mantenimiento de espacios académicos del Centro de Investigaciones Químicas (CIQ)

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Avenida Universidad # 1001 Colonia Chamilla,
Código Postal 62209, Cuernavaca, Morelos




UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

Escuela de la universidad


Porcentaje de avance

0%

FOTOGRAFÍAS (E. ANTES)

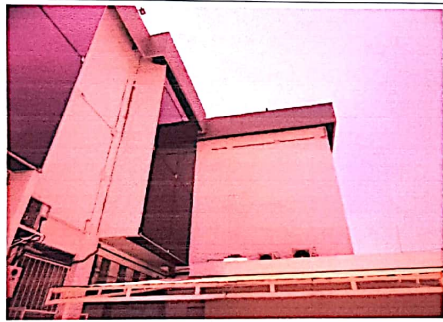

F1: Edificio 49 (exterior)

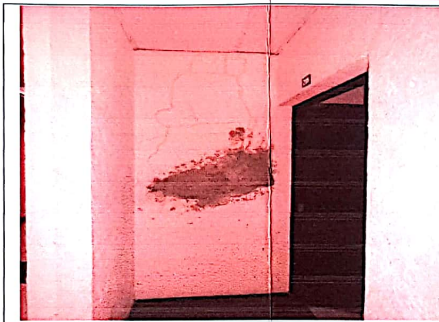

F2: Edificio 60 (interior)

Comentarios de los trabajos realizados:


Trabajos pendientes a realizarse:

1. Mantenimiento de pintura general de edificios 49 y 60 (interior y exterior) (F1 y F2).
2. Mantenimiento preventivo y correctivo para equipos especializados de laboratorio (F3).
3. Mantenimiento y remodelación de sanitarios (F4).
4. Mantenimiento a bomba general de vacío (F5).


Mediante oficio R/539/2018 se le solicita al C. Grao Luis Ramírez Garrido Abreu, Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, la ministración de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) ejercicio 2018, por un monto de \$25,816,570.44 (veinticinco millones ochocientos dieciséis mil quinientos setenta pesos 44/100 M.N.).



F3: Equipos especializados de laboratorio

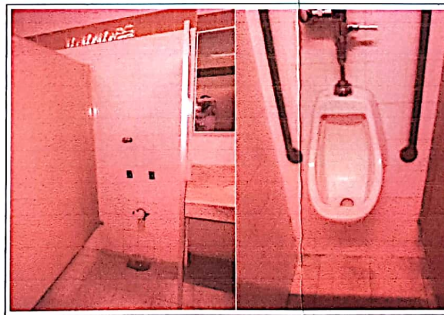

F4: Sanitarios

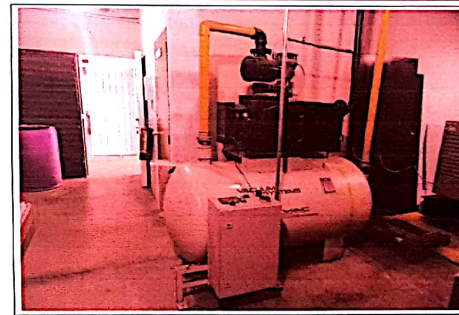

F5: Bomba General de vacío

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector

C.P. Fabiano Suárez Díaz
Encargado de Despacho de la Dirección General de Infraestructura

2018

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Agosto 2018
FECHA DE EMISIÓN: 31/08/2018

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIMORDIA 1 Nombre de la obra: **Mantenimiento de espacios académicos del Centro de Investigación en Dinámica Celular**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Avenida Universidad # 1001 Colonia Chamilpa,
Código Postal 62209, Cuernavaca, Morelos



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

Escudo de la Universidad

Porcentaje de avance

0%


FOTOGRAFÍAS (EJEMPLOS)




F1: Pintura de Edificio (interior y exterior)



F2: Sistema de tierras físicas

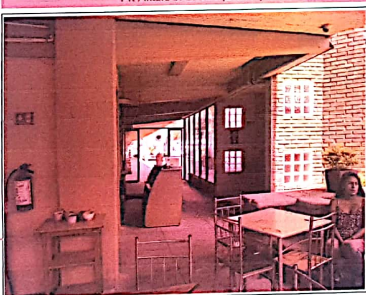

F3: Entrada del Inmueble

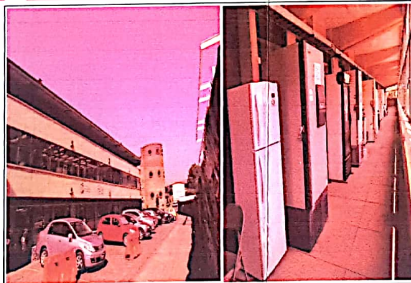

F4: Exterior del edificio

F5: Equipos de refrigeración y aire acondicionado



F6: Sanitarios

Comentarios de los trabajos realizados:

Trabajos pendientes a realizarse:

1. Mantenimiento de pintura del edificio (interior y exterior) (F1)
2. Mantenimiento al edificio para complementar al sistema de tierras (F2)
3. Adecuación de entradas del inmueble (F3)
4. Iluminación exterior del edificio (F4)
5. Mantenimiento a equipos de refrigeración y aire acondicionados. (F5)
6. Remodelación de sanitarios. (F6)

Mediante oficio R/339/2018 se le solicita al C. Graco Luis Rámirez Garrido Abreu, Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, la ministración de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) ejercicio 2018, por un monto de \$25,816,570.44 (veinticinco millones ochocientos dieciséis mil quinientos setenta pesos 44/100 M.N.).

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector

C.P. Filiberto Suárez Díaz
Encargado de Despacho de la Dirección General de Infraestructura

2018

Nº

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Agosto_2018

FECHA DE CORTE: 31/08/2018

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIOIDAD

1

Nombre de la obra:

Mantenimiento de espacios académicos del Centro de Investigaciones Biológicas (CIB)

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Avenida Universidad # 1001 Colonia Chamilpa,
Código Postal 62209, Cuernavaca, Morelos



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

0%

FOTOGRAFÍAS (C. ANTES)



F1: Puerta de acceso (exterior)



F2: lateral (interior)

Comentarios de los trabajos realizados:


Trabajos pendientes a realizarse:

1. Mantenimiento correctivo a 1 puerta de acceso del Centro de Investigaciones Biológicas estructura en mal estado (F1 y F2)
2. Mantenimiento correctivo a puertas de laboratorios y puertas de baños en mal estado del edificio 14 del CIB (F3, F4 y F5)

Mediante oficio R/339/2018 se le solicita al C. Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, la ministración de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) ejercicio 2018, por un monto de \$25,916,570.44 (veinticinco millones ochocientos dieciséis mil quinientos setenta pesos 44/100 M.N.).



F3: Puertas

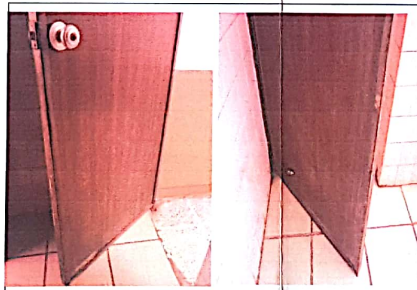

F4: Puertas



F5: Puertas

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector

C.P. Fabiano Suárez Díaz
Encargado de Despacho de la Dirección General de Infraestructura



2018

FAM
 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

 Mes referido
Agosto_2018
 FECHA DE CURTI: 31/08/2018

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

 PRIORIDAD **3** Nombre de la obra: **Impermeabilización del techo de la Escuela de Estudios Superiores de Miaquatán**
CRONOGRAMA DE LOCALIZACIÓN

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Alpuyecá - Grutas S/N, Col. La Toma, Miaquatán, Mor.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS


Fecha de elaboración

Porcentaje de avance

0%

FOTOGRAFÍAS DEL ANTES


F1: Fachada principal

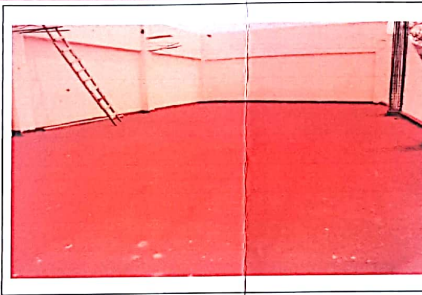

F2: Techo del edificio

Comentarios de los trabajos realizados:


Trabajos pendientes a realizarse:

- 1.- Impermeabilización del edificio (F1,F2, F3, F4 y F5)

Mediante oficio R/330/2018 se le solicita al C. Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, la ministración de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) ejercicio 2018, por un monto de \$25,816,570.44 (veinticinco millones ochocientos dieciséis mil quinientos setenta pesos 44/100 M.N.).



F3: Techo del edificio

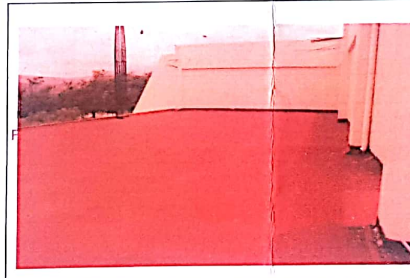

F4: Techo del edificio



F8: Techo del edificio

 Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
 Rector

 C.P. Faberío Suárez Díaz
 Encargado de Despacho de la Dirección General de Infraestructura

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIOIDAD

1

Nombre de la obra



Mantenimiento de espacios académicos de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería (Impermeabilizante para el Laboratorio de Operaciones Unitarias y Tamulba)

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOSUniversidad Autónoma del
Estado de Morelos

Porcentaje de avance

0%

CRÓQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Avenida LOU esquina Circuito Universitario,
Edificio No15, Colonia Chamilla, C.P. 82209,
Cuernavaca, Morelos. Edificio 15 LOU,
EDIFICIO 4 TAMULBA

FOTOGRAFÍAS (C/ ANTES)



F1: Fachada principal LOU



F2: Lateral LOU



F3: Techo TAMULBA




F4: Entrada TAMULBA

Comentarios de los trabajos realizados:

Trabajos pendientes a realizarse:

1. Impermeabilizado de 1,310 m2 en techo de lamina LOU (F1,F2 y F5)
2. Impermeabilizado de 1,200 m2 en techo de lamina de Tamulba (F3 y F4)

Mediante oficio R/339/2018 se le solicita al C. Graco Luis Rámirez Garrido Abreu, Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, la ministración de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) ejercicio 2018, por un monto de \$25,816,570.44 (veinticinco millones ochocientos dieciséis mil quinientos setenta pesos 44/100 M.N.).

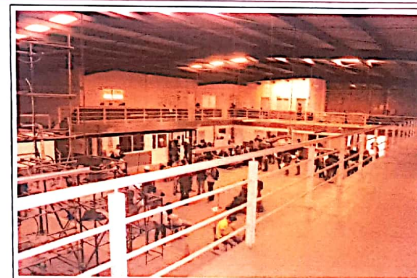



F5: Interior de aula LOU

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
RectorC.P. Filiberto Suarez Lujaz
Encargado de Despacho de la Dirección General de Infraestructura

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PROGRAMA 1 Nombre de la obra: **Mantenimiento de espacios académicos de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería FCOel**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Avenida Universidad # 1001 Colonia Chamilpa,
 Código Postal 62209, Cuernavaca, Morelos



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

0%


FOTOGRAFÍAS (EL ANTES)




F1: Sanitarios




F2: TAMULBA (Interior/ Exterior)

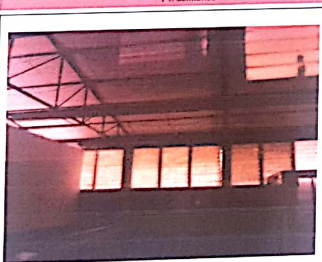

F3: TAMULBA-FCQel

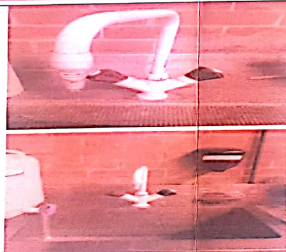

F4: FCOel-LOU

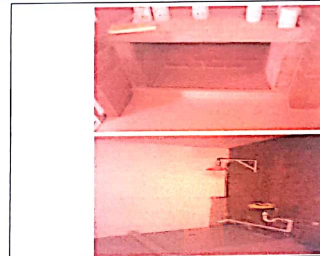

F5: FCOel-LOU

Comentarios de los trabajos realizados:

Trabajos pendientes a realizarse:

1. Cambio de muebles sanitarios por ahorradores. 12 pzas (F1)
2. Aplicación de pintura blanca, gris y azul marino para Tamulba. Salones, laboratorios, mezzanine, fachada principal y oficinas (F2)
3. Suministro y colocación de luminarias para TAMULBA y FCOel 15 de 120 led/20w, luz de día, tipo base p5. 200 piezas (F3)
4. Cambio de 20 mezcladoras cuello de ganso con doble llave para tarja de laboratorio (F4)
5. Pintura de 13 sardinetes con 200 m2 y Pintura de 9 almacenes temporales de residuos con 100 m2 (F5)

Mediante oficio R/39/2018 se le solicita al C. Graco Luis Rímirrez Garrido Abreu, Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, la ministración de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) ejercicio 2018, por un monto de \$25,816,570.44 (veinticinco millones ochocientos dieciséis mil quinientos setenta pesos 44/100 M.N.).

Dr. Gustavo Urquiza Bellrán
 Rector

C.P. Faberito Suárez Díaz
 Encargado de Despacho de la Dirección General de Infraestructura

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PROYECTO 1

Nombre de la obra:

Mantenimiento de espacios académicos del Instituto de Ciencias de la Educación ICE


GOBIERNO AUTÓNOMO DEL ESTADO DE MORELOS


Porcentaje de avance

0%

CIRCUITO DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



Avenida Universidad #1001, colonia Chamliipa, Cuernavaca, Morelos; México. Edificios 28 y 29

FOTOGRAFÍAS (E- ANTES)




F1. Fachada principal



F2. Techo edificio 29



F3. Techo edificio 29



F4. Techo edificio 29




F5. Techo edificio 29


Comentarios de los trabajos realizados:

Trabajos pendientes a realizarse:

- 1.- Impermeabilización de azotea del edificio 29 del Instituto de Ciencias de la Educación (F1, F2, F3, F4 y F5)

Mediante oficio R/339/2018 se le solicita al C. Graco Luis Rámirez Carrido Abreu, Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, la manifiación de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) ejercicio 2018, por un monto de \$25,816,570.44 (veinticinco millones ochocientos diecisiete mil quinientos setenta pesos 44/100 M.N.).


 Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
 Rector


 C.P. Filiberto Suárez Díaz
 Encargado de Despacho de la Dirección General de Infraestructura

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL
PRIOIDAD 1 Nombre de la obra: **Mantenimiento de espacios académicos del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE)**
CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

 Avenida Universidad # 1061 Colonia Chamipa,
 Código Postal 62209, Cuernavaca, Morelos

 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
 ESTADO DE MORELOS

Fecha de generación

Porcentaje de avance

0%

FOTOGRAFÍAS (E - ANTES)


F1: Escusadón



F2: Escusadón

Comentarios de los trabajos realizados:
Trabajos pendientes a realizarse:

1. Baños del edificio 28 y 29 que se requieren reemplazar excusados por excusados ahorradores de agua (F1 y F2).
2. Baños del edificio 28 y 29 que requieren reemplazar mingitorios de agua por mingitorios secos (ecológicos) (F3)
3. Cambiar las lámparas obsoletas por lámparas ahorradoras de energía de aules de los edificios 28, 29 y 18 de pagrado (F4)
4. Cambio de cableado eléctrico (F5)

Mediante oficio R/338/2018 se le solicita al C. Greco Luis Rámirez Garrido Abreu, Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, la ministración de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) ejercido 2018, por un monto de \$25,816,570.44 (veinticinco millones ochocientos dieciséis mil quinientos setenta pesos 44/100 M.N.).




F3: Mingitorios



F4: Aulas



F5: Cableado Eléctrico




 Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
 Rector


 C.F. Fiberto Suárez
 Encargado de Despacho de la Dirección General de Infraestructura

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

 Proyecto: 1 Nombre de la obra: **Mantenimiento de espacios académicos de la Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

SUBIDA AL CALVARIO S/N, COLONIA JUSTO SIERRA, MAZATEPEC, MORELOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Fecha de actualización:

Porcentaje de avance

0%

FOTOGRAFÍAS (EL ANTES)



F1: Exterior de aula



F2: Interior de aula

Comentarios de los trabajos realizados:

Trabajos pendientes a realizarse:

- 1.- Suministro y aplicación de pintura vinílica, esmalte o impermeabilizante a muro en el interior y exterior de las aulas. (F1 y F2)
- 2.- Suministro y aplicación de pintura vinílica a herrerías como puertas y ventanas. (F3 y F4)
- 3.- Suministro y aplicación de pintura vinílica al plafón y techos de las aulas. (F5)

Mediante oficio R/239/2018 se le solicita al C. Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, la ministración de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) ejercicio 2018, por un monto de \$25,616,570.44 (veinticinco millones ochocientos dieciséis mil quinientos setenta pesos 44/100 M.N.).



F3: Interior, ventanas aula



F4: Herrerías



F5: Interior de aula

 Dr. Gustavo Urquiza Delrín
 Rector

 C.P. Fiberto Suárez Cruz
 Encargado de Despacho de la Dirección General de Infraestructura

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD

3

Nombre de la obra: **Adecuación de la sistema hidráulica de la Escuela de Estudios Superiores de Atlatlahucan**

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO




UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Fecha de la información


Porcentaje de avance

0%

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



Calle Universidad



Calle Universidad S/N Barrio San Antonio Atlatlahucan, Morelos C.P. 62840

FOTOGRAFÍAS (E/ ANTES)



F1: Sistema hidráulico



F2: Sistema hidráulico



F3: Sistema hidráulico




F4: Sistema hidráulico

Comentarios de los trabajos realizados:

Trabajos pendientes a realizarse:

1.- Adecuación del sistema hidráulico que incluye una cisterna y la adquisición de 2 linecos para la distribución del suministro de agua. (F1, F2, F3, F4 Y F5)

Mediante oficio R/339/2018 se le solicita al C. Graco Luis Rámirez Garrido Abreu, Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, la ministración de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) ejercicio 2018, por un monto de \$25,816,570.44 (veinticinco millones ochocientos dieciséis mil quinientos setenta pesos 44/100 M.N.).

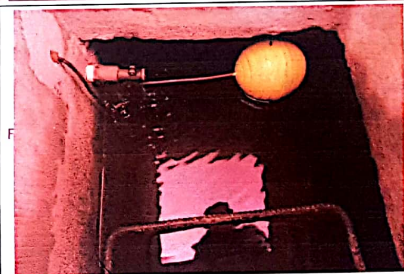

F5: Interior de sistema

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector

C.P. Filiberto Sulzner Diaz
Encargado de Despacho de la Dirección General de Infraestructura

*Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2018

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICAMes reportado
Agosto_2018

FECHA DE CORTE: 31/08/2018

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



PRIORIDAD

3

Nombre de la obra:

Mantenimiento de espacios académicos de la Escuela de Estudios Superiores de Tetela del Volcán EESTEVAL

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Calle 24 de Febrero, Barrio Santiago S/N, Tetela del Volcán, Morelos, C.P. 62800.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS


Porcentaje de avance

0%

FOTOGRAFÍAS (E. ANTES)



F1: Edificio de Dirección



F2: Edificio Principal

Comentarios de los trabajos realizados:

Trabajos pendientes a realizarse:

1. Impermeabilización del Edificio de dirección (F1)
2. Impermeabilización del Edificio principal (F2) y (F3)
3. Impermeabilización del Centro de cómputo (F4) y (F5)


Mediante oficio R/339/2018 se le solicita al C. Graco Luis Rímirez Garrido Abreu, Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, la ministración de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) ejercicio 2018, por un monto de \$25,816,570.44 (veinticinco millones ochocientos dieciséis mil quinientos setenta pesos 44/100 M.N.).




F3: Edificio Principal




F4: Centro de Cómputo



F5: Centro de Cómputo


 Dr. Gustavo Urquiza Deltrán
 Rector


 C.P. Filberto Suarez Diaz
 Encargado de Despacho de la Dirección General de Infraestructura

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



PRIORIDAD

3

Nombre de la obra:

Mantenimiento de espacios académicos de la Escuela de Estudios Superiores de Tetela del Volcán.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Calle 24 de Febrero , Barrio Santiago S/N, Tetela del Volcán, Morelos, C.P. 62800.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS


Porcentaje de avance

0%

FOTOGRAFÍAS (ANTES)




F1: Edificio Principal

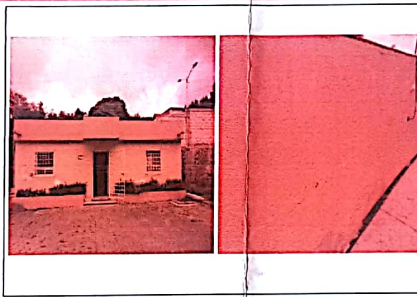

F2: Edificio Dirección



F3: Sanitarios

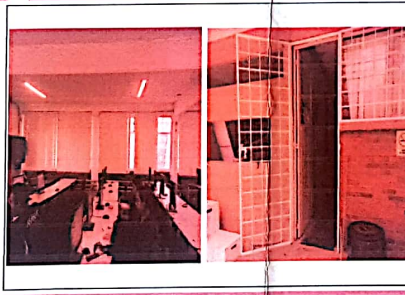

F4: Centro de Cómputo



F5: Pasillo planta alta

Comentarios de los trabajos realizados:

Trabajos pendientes a realizarse:

1. Pintado de edificio principal, aplicación de pintura acrílica en: muros, columnas, traveses y plafones (F1)
2. Pintado de edificio de dirección, aplicación de pintura acrílica en: muros, columnas, traveses y plafones (F2)
3. Cambio de 12 muebles sanitarios por ecológicos; cambio de 1 mijitorio colectivo por 6 mijitorios individuales y cambio de 4 lavabos con lavas (F3)
4. Pintado de edificio de cómputo, aplicación de pintura acrílica, en muros, columnas, traveses y plafones (F4)
5. Colocación de piso de pasillo de planta alta (F5)

Mediante oficio R/339/2018 se le solicita al C. Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, la ministración de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) ejercicio 2018, por un monto de \$25,916,570.44 (veinticinco millones ochocientos dieciséis mil quinientos setenta pesos 44/100 M.N.).

 Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
 Rector



 C.P. Filiberto Suárez Díaz
 Encargado de Despacho de la Dirección General de Infraestructura

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PROYECTO

3

Nombre de la obra:


Mantenimiento de espacios académicos de la Escuela de Estudios Superiores de Tetela del Volcán EESTEVOL
CRUCES DE LOCALIZACIÓN

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Calle 24 de Febrero, Barrio Santiago SN, Tetela del Volcán, Morelos, C.P. 62900.


 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
 ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

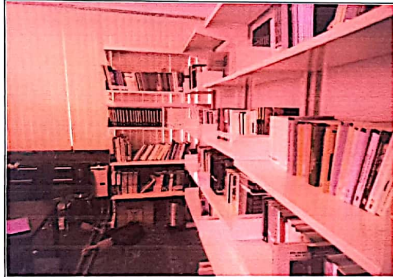0%

FOTOGRAFÍAS (EU ANTES)


F1: Biblioteca



F2: Centro de Cómputo



F3: Aulas



F4: Salón de Usos Múltiples



F5: Salón de Usos Múltiples

Comentarios de los trabajos realizados:

Obras pendientes a realizarse:

1. Colocación de piso en la biblioteca (F1)
2. Colocación de piso en el centro de cómputo (F2)
3. Colocación de piso para 4 aulas (F3)
4. Colocación de piso para el salón de usos múltiples, pasillo planta alta y escaleras (F4 Y F5).

Mediante oficio R/339/2018 se le solicita al C. Graco Luis Ramírez Gamdo Abreu, Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, la ministración de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) ejercicio 2018, por un monto de \$25,816,570.44 (veinticinco millones ochocientos dieciséis mil quinientos setenta pesos 44/100 M.N.).

 Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
 Rector



 C.P. Filiberto Suárez Díaz
 Encargado de Despacho de la Dirección General de Infraestructura

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

 PRIORIDAD **3**

 Nombre de la obra: **Mantenimiento de espacios académicos de la Escuela de Estudios Superiores de Xalostoc**

CROQUIS DE LOCALIZACION



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

AV Nicos Bravo S/N, Parque Industrial Cuauhtla, C.P. 62715



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Escuela de la Universidad

Porcentaje de avance

0%

FOTOGRAFÍAS (EL ANTES)



F1: Laboratorio E-5



F2: Laboratorio E-4 E-7

Comentarios de los trabajos realizados:

Trabajos pendientes a realizarse:

- Mantenimiento de impermeabilizante de concreto con remoción de carpeta existente y aplicación de carpeta elastomérica asfáltica 7100, de los edificios E-5, E6 y E7, incluye 4 laboratorios, 3 salones, 1 aula audiovisual y 10 cubículos de Investigación. (F1 y F2)
- Reparación de piso firme de concreto e instalación de piso cerámico de uso nudo para 3 laboratorios: 2 laboratorios en edificio E-5 y 1 laboratorio en edificio E-6. (F3 y F4)
- Mantenimiento correctivo a 2 módulos de baños con cambio de 4 muebles sanitarios con descarga ecológica, cambio de 2 muebles miglonas por miglonas secas ecológicas, cambio de 4 sistemas de regaderas, cambio de 4 muebles de lavamanos con llaves ahorramoras tipo puschi, cambio de 156 m² de loseta, cambio de 8 puertas de aluminio por puertas ababbles de 2x1.60m. (F5)


Mediante oficio R/339/2018 se le solicita al C. Graco Luis Ramírez Gamdo Abreu, Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, la ministración de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) ejercicio 2018, por un monto de \$25,915,570.44 (veinticinco millones ochocientos dieciséis mil quinientos setenta pesos 44/100 M.N.).




F3: Interior laboratorio E-5



F4: Interior Laboratorio E-4

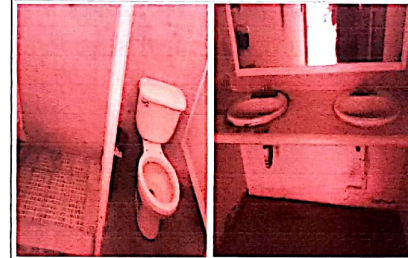

F5: Sanitarios


 Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
 Rector


 C.P. Filiberto Suárez Vázquez
 Encargado de Despacho de la Dirección General de Infraestructura
