2025

FAM

Primer Trimestre 2025

Nombre: Universidad Autónoma del Estado de Morelos
Entidad federativa: Morelos
Clave ÚTI: 17MSU0017P

Nombre: Dr. Juan Manuel Rivas González
Cargo: Responsable del Proyecto.
Teléfono: (777) 3 29 70 00 Ext. 7033 y 4312
Correo electrónico: ogpyct@uaem.mx

Nombre: Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Cargo: Director General de Infraestructura
Teléfono: (777) 3 29 70 00 Ext. 3138
Correo electrónico: oscar.lastra@uaem.mx

Nombre del proyecto	Tipo de proyecto			Monto Modificado (f)	(h)							(i) Monto (f)	(j) Avance	Conceptos		Especifique el concepto general de la(s) meta(s)	Cantidad	Unidad de medida	(m) Acciones que conforman el proyecto	(n) % de avance	(o) Fecha de inicio	(p) Fecha de término	(q) Observaciones	(r) Avance físico	(s) Avance financiero
					No. de la(s) meta(s)	Fecha de inicio	Fecha de término	Monto Contratado ($)	Contratista	Monto Convenio Modificatorio (Ampliación o Reducción) y Contratista (Cada Uno)				(k) Monto pagado en el periodo que se reporta	(l) Monto pagado acumulado										
Construcción de talleres multidisciplinarios básicos para la formación práctica de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería y construcción de barda de colindancia de la Escuela de Estudios Superiores de Atlatlahucan		x		$ 5,700,000.00	01-15032-OS-2025	31/07/2025	01/12/2025	$ 4,200,000.00	CARLOS RIVERA SALGADO	$ -	$ 4,200,000.00			$ 0.01	$ 0.01	Talleres (FCQel)	4.00	297.54	Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería 1.- Pintura en Estructura, Cancelería de Aluminio, Firme de Concreto reforzado con malla acabado deslavado, Forjado de escalones, Empedrado de Piedra, Interruptor Termomagnético y Tablero, Salida eléctrica para (Luminaria, contactos, apagadores), así como Trabajos de suministro e Instalación de Cable de Cobre, Panel Prefabricado, Limpieza de Obra	100.00%	31/07/2025	01/12/2025	En apego al anexo 3 del Convenio para la Transferencia y Ejecución de Recursos con la Secretaría de Educación y la Secretaría de Hacienda con los recursos del fondo en su componente de Infraestructura Educativa de Nivel Superior, se recibió la cantidad de $22,322,919.92 (veintidós millones trescientos veintidós mil novecientos diez y nueve pesos 92/100 M.N), más la ministración de productos financieros por un monto de $300,114.27 (trescientos mil ciento catorce pesos 27/100 M.N.) los cuales se distribuyen como a continuación se describe: P-1 Construcción de talleres multidisciplinarios básicos para la formación práctica de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería y construcción de barda de colindancia de la Escuela de Estudios Superior de Atlatlahucan. "Construcción de talleres multidisciplinarios básicos para la formación práctica de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería", se adjudicaron los trabajos al contratista C. Carlos Rivera Salgado mediante contrato y convenios modificatorios por tiempo, con número 01-15032-OS-2025 se realizaron trabajos de: pintura en estructura, cancelería de aluminio, firme de concreto reforzado con malla acabado deslavado, forjado de escalones, empedrado de piedra, interruptor termo magnético y tablero, salida eléctrica para (luminaria, contactos, apagadores), así como trabajos de suministro e instalación de cable de cobre, panel prefabricado y limpieza de obra.		
																Vestíbulo/ escaleras (FCQel)	1.00	91.64							
																Pasillo interior (FCQel)	1.00	42.63							
																Andador exterior (FCQel)	1.00	56.00							
					04-15032-OS-2025	31/07/2025	01/12/2025	$ 1,500,000.00	SC CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS DEL SUR, S.A. DE C.V.	$ -	$ 1,499,999.99					Barda perimetral de colindacia (EESAtl)	1.00	165.80	Escuela de Estudios Superiores de Atlatlahucan.	100.00%	31/07/2025	01/12/2025			
																Reja de acceso (EESAtl)	1.00	4.09							
Adecuaciones y mejoras en las fachadas y columnas del Centro de Investigaciones Químicas		x		$ 2,900,000.00	02-15032-OS-2025	31/07/2025	01/12/2025	$ 2,900,000.00	GREGORIO ALEXANDER BUSTOS GARCIA	$ -	$ 2,900,000.00	$ -		$ -	$ -	La adecuación a la fachada de acceso considera: columnatas deterioradas, cambio de vitoblock y tratamiento anticorrosivo a estructuras metálicas.	28.00	816.50		100.00%	31/07/2025	01/12/2025	P-2 Adecuaciones y mejoras en las fachadas y columnas del Centro de Investigaciones Químicas. Adjudicado al C. Gregorio Alexander Bustos García mediante contrato y convenio modificatorio por monto, con número 02-15032-OS-2025; con la conclusión de los trabajos se trabaja en el proceso de cierre administrativo mediante las Actas Administrativas de Entrega-Recepción.		

Nombre: Universidad Autónoma del Estado de Morelos
Entidad federativa: Morelos
Clave 911: 17MSU0017P

Nombre: Dr. Juan Manuel Rivas González
Cargo: Responsable del Proyecto.
Teléfono: (777) 3 29 70 00 Ext. 7033 y 4312
Correo electrónico: ogpyds@uaem.mx

Nombre: Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Cargo: Director General de Infraestructura
Teléfono: (777) 3 29 70 00 Ext. 3135
Correo electrónico: oscar.lastra@uaem.mx

												Planta tratadora de agua residuales del edificio A-2 de la Facultad de Contaduría Administración e Informática	63.00						
												Planta tratadora de agua residuales del edificio A-70 de la Facultad de Psicología	4.00	63.00					
												Planta tratadora de agua residuales del edificio A-01 de la Escuela de Turismo		63.00					
												Planta tratadora de agua residuales del edificio A-77 de la Facultad de Ciencias Biológicas		63.00					
Mantenimiento a cuatro plantas de de tratamiento, así como a espacios académicos y de actividad física y deportiva en el Campus Norte		$ 8,000,000.00										Edificio A-20 Gimnasio auditorio	1.00	2118.00					
												Edificio A-37 Polideportivo 1	1.00	2690.00					
			09-15032-OS-2025	31/07/2025	01/12/2025	$ 6,200,000.00	CARLOS RIVERA SALGADO	$ -	$ 6,199,999.99	$ 0.01	$ 0.01	Edificio A-38 Polideportivo 2	1.00	2690.00	100.00%	31/07/2025	01/12/2025		
												Edificio A-5 CELE Norte	1.00	1170.00					
												Edificio S-1 y S-2 Escuela de Teatro, Danza y Música	1.00	1756					

P-3 Mantenimiento a cuatro plantas de tratamiento, así como a espacios académicos y de actividad física y deportiva en el Campus Norte.
"Mantenimiento a cuatro plantas de tratamiento de aguas residuales" para: Facultad de Contaduría Administración e Informática (Edificio A-02), Escuela de Turismo (Edificio A-01, Cuerpo 4), Facultad de Psicología (Edificio A-70), y Facultad de Ciencias Biológicas (Unidad Biomédica) (Edificio A-77) Se adjudicó mediante contrato 09-15032-OS-2025 a la persona moral Corporativo Ambiental Spartan S.A. de C.V. con la conclusión de los trabajos se trabaja en el proceso de cierre administrativo mediante las Actas Administrativas de Entrega- Recepción.

2025

FAM

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta: Primer Trimestre 2026

Fecha de elaboración: 31/12/2025

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Entidad federativa: Morelos

Clave 911: 17MSU0017P

Titulares de Área

Planeación

Nombre: Dr. Juan Manuel Rivas González
Cargo: Responsable del Proyecto.
Teléfono: (777) 3 29 70 00 Ext. 7033 y 4312
Correo electrónico: ogpyds@uaem.mx

Obras y Mantenimiento

Nombre: Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Cargo: Director General de Infraestructura
Teléfono: (777) 3 29 70 00 Ext. 3136
Correo electrónico: oscar.lastra@uaem.mx

| | | |

2025

FAM

Primer Trimestre 2025

REPORTE EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Nombre: Universidad Autónoma del Estado de Morelos
Entidad federativa: Morelos
Clave 911: 17MSL0017F

Nombre: Dr. Juan Manuel Rivas Gonzalez
Cargo: Responsable del Proyecto.
Teléfono: (777) 3 29 70 00 Ext. 7033 y 4312
Correo electrónico: ogpyds@uaem.mx

Nombre: Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Cargo: Director General de Infraestructura
Teléfono: (777) 3 29 70 00 Ext. 3138
Correo electrónico: oscar.lastra@uaem.mx

Construcción de la planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Escuela de Estudios Superiores del Jicarero	x	$ 1,050,114.27	10-15-032-OS-2025	22/08/2025	15/12/2025	$ 1,050,114.27	Corporativo Ambiental Spartan S.A. de C.V.	$ -	$ 1,050,114.30	-$ 0.03	-$ 0.03	Planta tratadora de aguas residuales	1.00	635.00		100.00%	22/08/2025	13/12/2025	P-5 Construcción de la planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Escuela de Estudios Superiores del Jicarero. Se adjudicó mediante el contrato 10-15032-OS-2025 a la persona moral Corporativo Ambiental Spartan S.A. de C.V. con la conclusión de los trabajos se trabaja en el proceso de cierre administrativo mediante las Actas Administrativas de Entrega- Recepción. Se informa que el monto de devolución a la TESOFE fue de: $22,708.70 (veintidós mil setecientos ocho pesos 70/100 M.N) con la línea de captura 0026AADS356874826412 correspondiente al capital no ejercido, $3,811.00 (tres mil ochocientos once pesos 00/100 M.N) mediante la línea de captura 0026AAADU941074675271 que corresponden al sobrante de los rendimientos financieros no ejercidos. También, se realizó el reintegro de $19,322.00 (diez y nueve mil trescientos veintidós pesos 00/100 M.N.) mediante la línea de captura 0026AADV521074671255 que corresponden a los rendimientos financieros correspondiente a los meses de noviembre y diciembre 2025 de la cuenta 65511110315 titulada "UAEM Fondo de Aportaciones Múltiples 2025", así como un monto de $692.00 (seiscientos noventa y dos pesos 00/100M.N. mediante clave de referencia DPA 066000313 que corresponden a los rendimientos financieros de la al mes de enero- marzo 2026. Finalmente, la Institución se encuentra en la formalización de las Actas Administrativas de Entrega Recepción de los 5 proyectos beneficiados con los recursos del Fondo.
		$22,623,034.19							$26,519.83	$22,596,514.36	$26,519.83	$0.00		13,112.20								

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

Dra. Viridiana Aydeé León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Dr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

2025	FAM	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCUTURAL DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Primer Trimestre 2026
EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES		Fecha de elaboración: 31/03/2026

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance


100.00%

PRIORIDAD **1** Nombre de la obra: Construcción de talleres multidisciplinarios básicos para la formación práctica de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería y construcción de barda de colindancia de la Escuela de Estudios Superiores de Atlatlahucan (FCQeI)

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

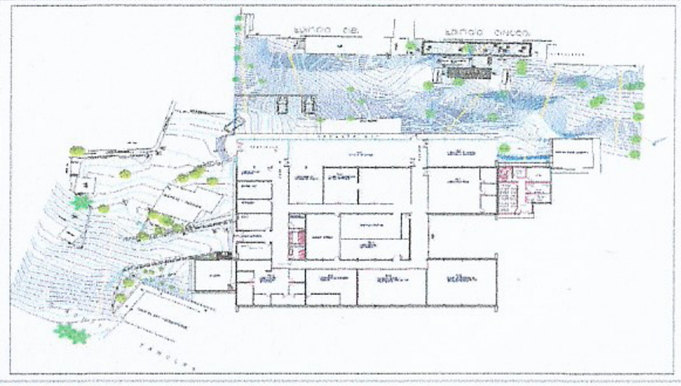


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal: Av. Universidad #1001, Col. Chamilpa, C.P. 62209, Cuernavaca, Morelos.

ANTES

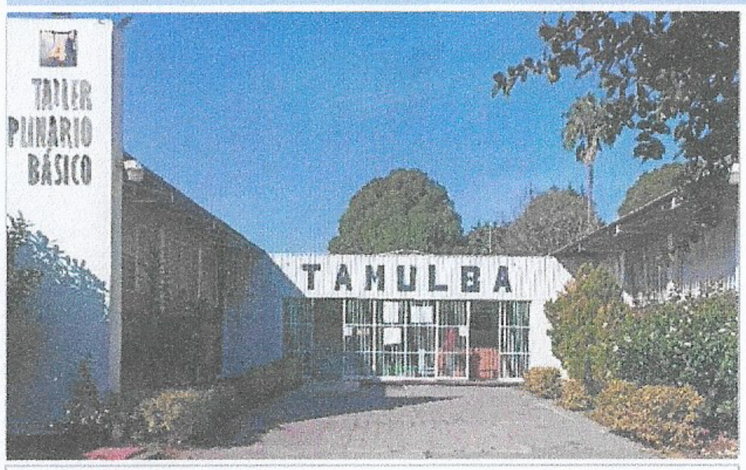

Fachada del Taller Multidisciplinario Básico (Tamulba) de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería



Vistas del sitio donde se realizaran trabajos: Preliminares que incluyen demolición, retiro de escombro, entre otros; para la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería (TAMULBA).

Observaciones :

Lo presentado en el Reporte Fotográfico del Tercer trimestre, corresponde a los espacios a intervenir mediante el fondo.

VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES


DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCUTURAL

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Primer Trimestre 2026

Fecha de elaboración: 31/03/2026

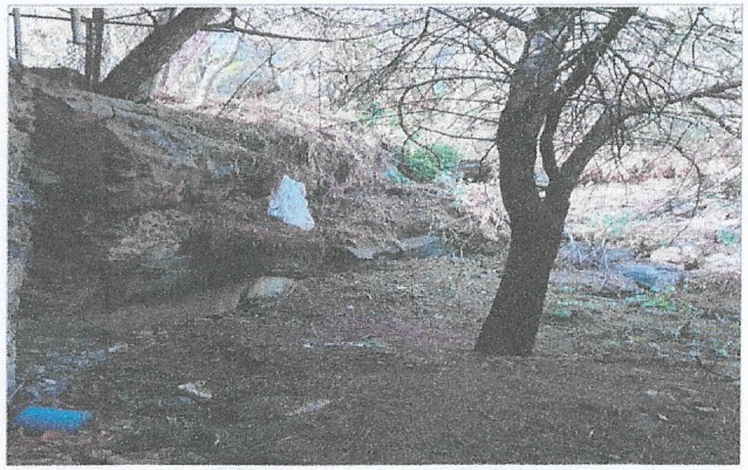

Vistas del sitio donde se realizaran trabajos: Preliminares y Albañilerías (trazo, excavación, construcciones de concreto (zapatas, corridas, firmes, canal, etc.), muro de mamposteo de piedra y muros divisorios de panel prefabricado) , Acabados con pintura vinílica, entre otros; para la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería (TAMULBA).



Vistas del sitio donde se realizaran trabajos: Preliminares y Albañilerías (trazo, excavación, construcciones de concreto (zapatas, corridas, firmes, canal, etc.), muro de mamposteo de piedra y muros divisorios de panel prefabricado) , Acabados con pintura vinílica, entre otros; para la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería (TAMULBA).



Vistas del sitio donde se realizaran trabajos: Instalacion de techumbre, canalones metálicos, columnas y estructuras metálicas, Asi como instalaciones (eléctricas, voz y datos, pluvial) , Se instalara (cancelería de aluminio, protecciones, puertas, luminarias, señaléticas, etc.), para la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería (TAMBULBA).

DURANTE



Trabajos de Suministro y Aplicación de Pintura en estructura, Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería (TAMULBA).



Trabajos de Retiro de Puerta Existente de Herrería, Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería (TAMULBA).



Trabajos de Suministroy colocacion de Tapial de madera, Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería (TAMULBA).

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCUTURAL

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL


SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Primer Trimestre 2026

Fecha de elaboración: 31/03/2026



Trabajos de Suministroy colocacion de Tapial de madera, Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería (TAMULBA).

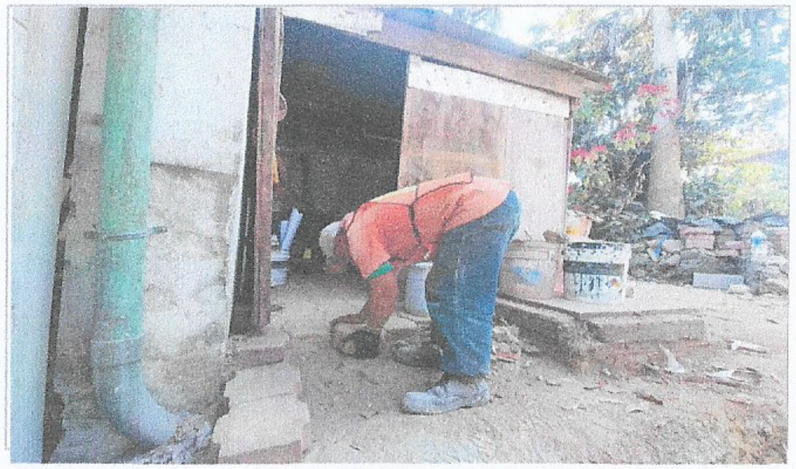

Trabajos de Retiro de adocreto existente con recuperación, Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería (TAMULBA).




Trabajos de Demolición con cortadora, Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería (TAMULBA).



Trabajos de Muro de mampostería de piedra de la región, Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería (TAMULBA).



Trabajos de Suministro y Colocacion de Cancelería de Aluminio, Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería (TAMULBA).

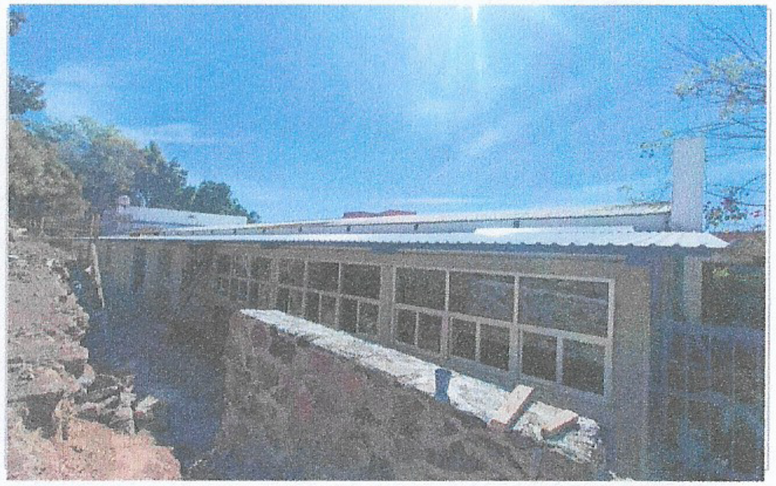

Trabajos de Suministro y Colocacion de Cancelería de Aluminio, Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería (TAMULBA).

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCUTURAL

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Primer Trimestre 2026

Fecha de elaboración: 31/03/2026



Trabajos de Suministro, Elaboracion y Colocacion de Firme de Concreto Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería (TAMULBA).



Trabajos de Suministro, elaboracion y colocacion de Firme de Concreto reforzado con malla electrosoldada, Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería (TAMULBA).



Trabajos de Suministro elaboracion y colocacion de Firme de Concreto reforzado con malla electrosoldada, Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería (TAMULBA).



Trabajos de Suministro el boracion y colocacion de Firme de Concreto reforzado con malla electrosoldada y acabado deslavado, Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería (TAMULBA).



Trabajos de Suministro el boracion y colocacion de Firme de Concreto reforzado con malla electrosoldada y acabado deslavado, Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería (TAMULBA).



Trabajos de Forjado de escalones, Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería (TAMULBA).

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCUTURAL

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL


SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Primer Trimestre 2026

Fecha de elaboración: 31/03/2026



Trabajos de Empedrado con piedra de la region, Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería (TAMULBA).

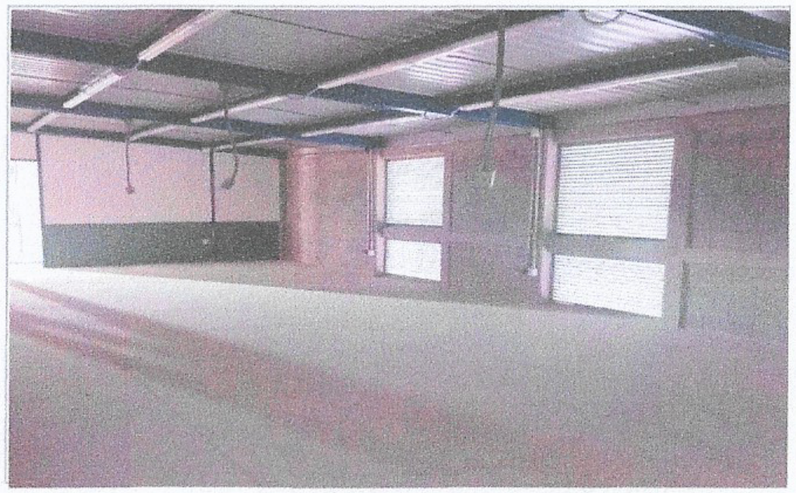

Trabajos de Suminsitro y elaboracion de Fijo louver, Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería (TAMULBA).



Trabajos de Elaboacion, Suministro y Colocacion de Puerta de Herreria, Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería (TAMULBA).



Trabajos de Elaboacion, Suministro y Colocacion de Puerta de Herreria, Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería (TAMULBA).



Trabajos de Elaboacion, Suministro y Colocacion de Puerta de Alumnio, Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería (TAMULBA).



Trabajos de Suministro e Instalacion de Moldura, Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería (TAMULBA).

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÒ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES


DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCUTURAL

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Primer Trimestre 2026

Fecha de elaboración: 31/03/2026

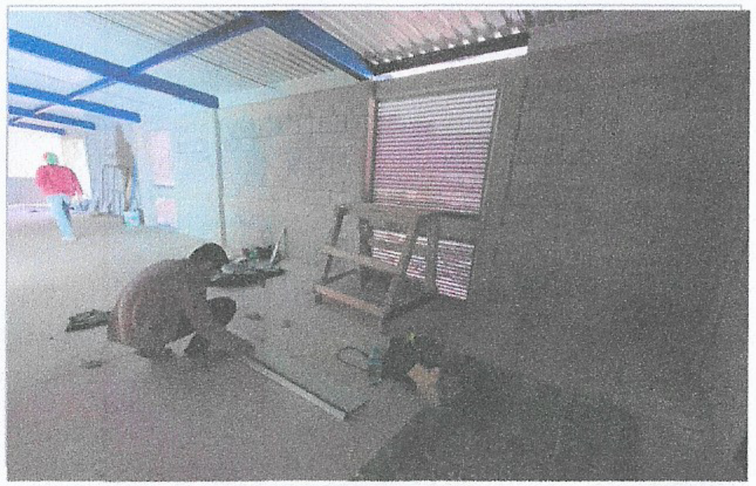


Trabajos de Suministro e Instalacion de Moldura, Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería (TAMULBA).



Trabajos de Tendido de tubo, coples, codos y conectores, de Conduit asi como caja de registro y condulets, Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería (TAMULBA).



Trabajos de Tendido de tubo, coples, codos y conectores, de Conduit asi como caja de caja de registro y condulets, Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería (TAMULBA).

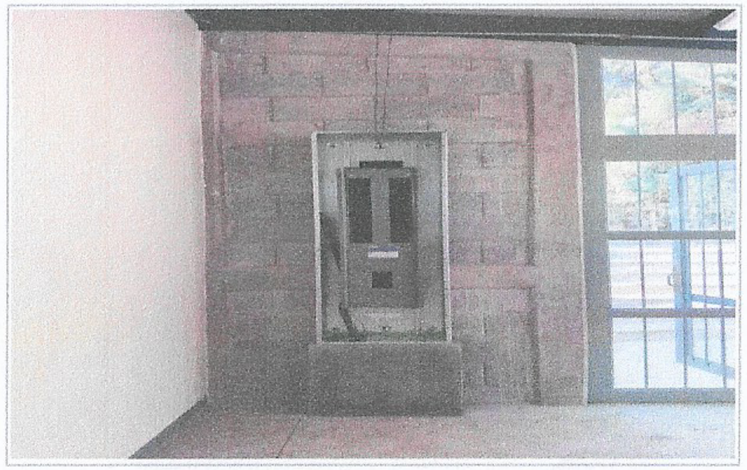

Trabajos de Suminsitro e Instalacion de Interruptor Termomagnético y Tablero, Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería (TAMULBA).



Trabajos de Salida eléctrica para (Luminaria, contactos, apagadores), asi como Trabajos de suminsitro e Instalacion de Cable de Cobre, Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería (TAMULBA



Trabajos de Suministro e Instalacion de Salida eléctrica para (Luminaria, contactos, apagadores), asi como Trabajos de suminsitro e Instalacion de Cable de Cobre, Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería (TAMULBA

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCUTURAL

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Primer Trimestre 2026


Fecha de elaboración: 31/03/2026



Trabajos de Suministro e Instalacion de Luminaria, Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería (TAMULBA



Trabajos de Suministro y Colocacion de panel Prefabricado para muros interiroes, Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería (TAMULBA

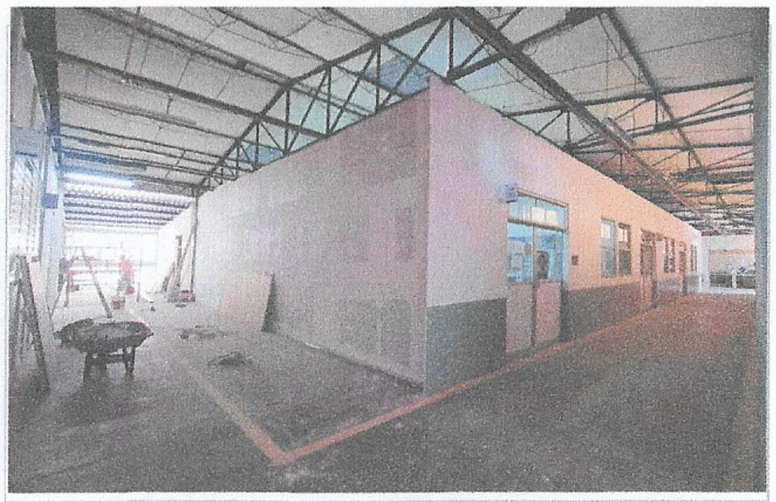

Trabajos de Suministro y Colocacion de panel Prefabricado para muros interiroes, Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería (TAMULBA

Despues



Imagen 1 del Proyecto "Construcción de talleres multidisciplinarios básicos para la formación práctica de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería"



Imagen 2 del Proyecto "Construcción de talleres multidisciplinarios básicos para la formación práctica de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería"



Imagen 3 del Proyecto "Construcción de talleres multidisciplinarios básicos para la formación práctica de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería"

2025
EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCUTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Primer Trimestre 2026

Fecha de elaboración: 31/03/2026



Imagen 4 del Proyecto "Construcción de talleres multidisciplinarios básicos para la formación práctica de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería"



Imagen 5 del Proyecto "Construcción de talleres multidisciplinarios básicos para la formación práctica de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería"



Imagen 6 del Proyecto "Construcción de talleres multidisciplinarios básicos para la formación práctica de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería"



Imagen 7 del Proyecto "Construcción de talleres multidisciplinarios básicos para la formación práctica de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería"



Imagen 8 del Proyecto "Construcción de talleres multidisciplinarios básicos para la formación práctica de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería"



Imagen 9 del Proyecto "Construcción de talleres multidisciplinarios básicos para la formación práctica de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería"

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCUTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Primer Trimestre 2026

Fecha de elaboración: 31/03/2026



Imagen 10 del Proyecto "Construcción de talleres multidisciplinarios básicos para la formación práctica de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería"



Imagen 11 del Proyecto "Construcción de talleres multidisciplinarios básicos para la formación práctica de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería"

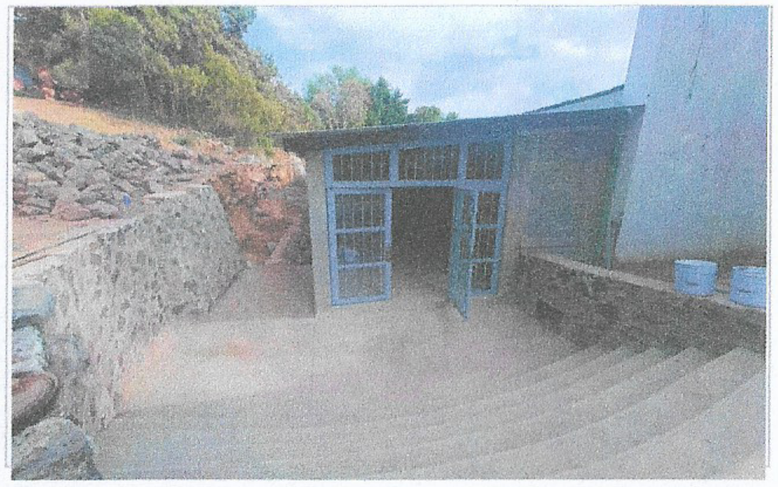


Imagen 12 del Proyecto "Construcción de talleres multidisciplinarios básicos para la formación práctica de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería"



Imagen 13 del Proyecto "Construcción de talleres multidisciplinarios básicos para la formación práctica de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería"



Imagen 14 del Proyecto "Construcción de talleres multidisciplinarios básicos para la formación práctica de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería"

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

Dra. Viridiana Aydeé León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Dr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

NOTA:

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la **misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra**.

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCUTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Primer Trimestre 2026

Fecha de elaboración: 31/03/2026

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

100.00%


PRIORIDAD **1**

Nombre de la obra: Construcción de talleres multidisciplinarios básicos para la formación práctica de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería y construcción de barda de colindancia de la Escuela de Estudios Superiores de Atlatlahucan (EES Atlatlahucan)


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

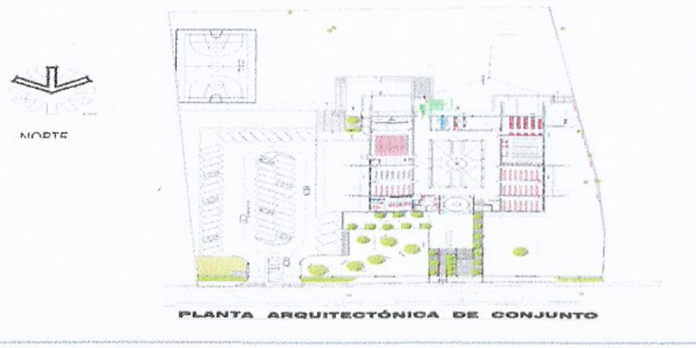


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

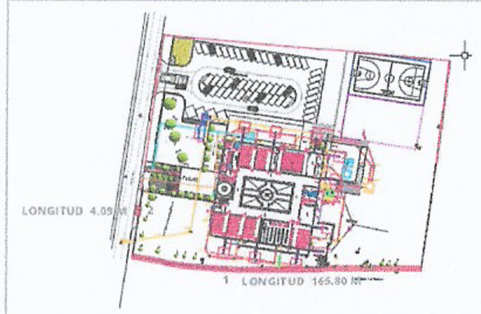

Dirección Postal: Calle Universidad s/n, Barrio San Antonio, Atlatlahucan, Morelos. C.P 62840.

ANTES

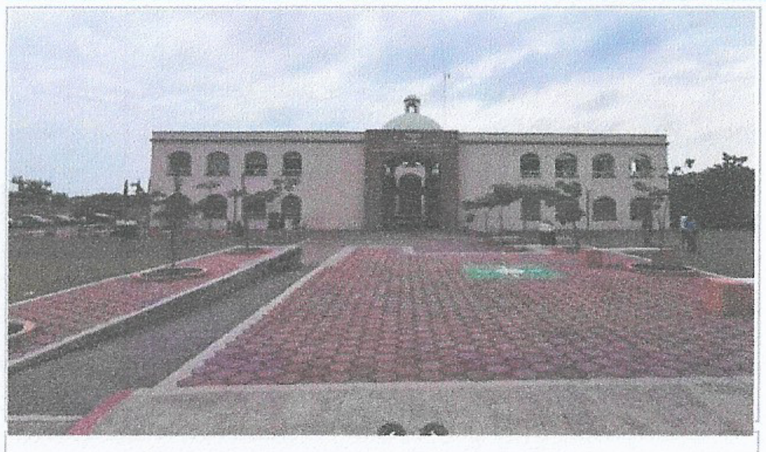

Fachada de la Escuela de Estudios Superiores de Atlatlahucan



Vistas en donde se realizaran trabajos: Preliminares que incluyen limpieza, retiro de escombro, entre otros; para la Escuela de Estudios Superiores de Atlatlahucan.

Observaciones :

Lo presentado en el Reporte Fotográfico del Tercer trimestre, corresponde a los espacios a intervenir mediante el fondo.


VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.

2025	FAM	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCUTURAL DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Primer Trimestre 2026
EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES		Fecha de elaboración: 31/03/2026

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL



Vistas en donde se realizaran trabajos: Preliminares que incluyen limpieza, retiro de escombro, entre otros; para la Escuela de Estudios Superiores de Atlatlahucan.

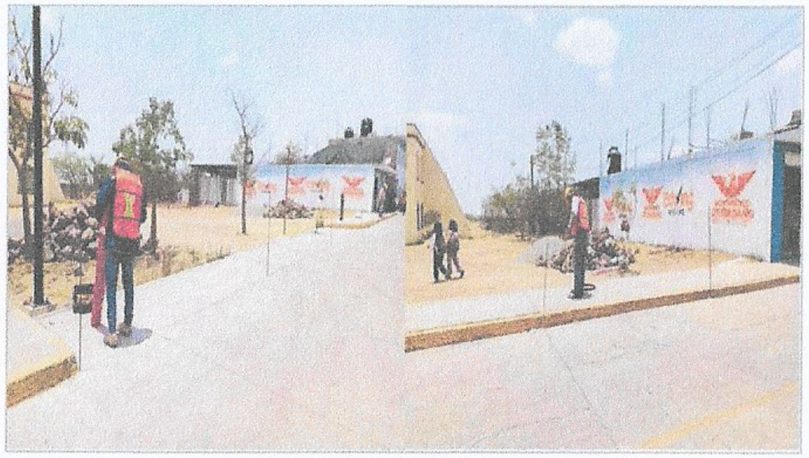

Vistas en donde se realizaran los trabajos: Albañileria consistentes en trazo, excavación, mampostería, construcciones de concreto (plantillas,castillos,etc.), acabados con pintura vinilica entre otros; para la Escuela de Estudios Superiores de Atlatlahucan.



Vista en donde se realizaran trabajos de: Elaboracion y y colocacion de reja de herrería con placas de acero y perfiles OC, OR con primer y pintura de esmalte, así como los trabajos de albañileria complementarios para la Escuela de Estudios Superiores de Atlatlahucan.

Despues

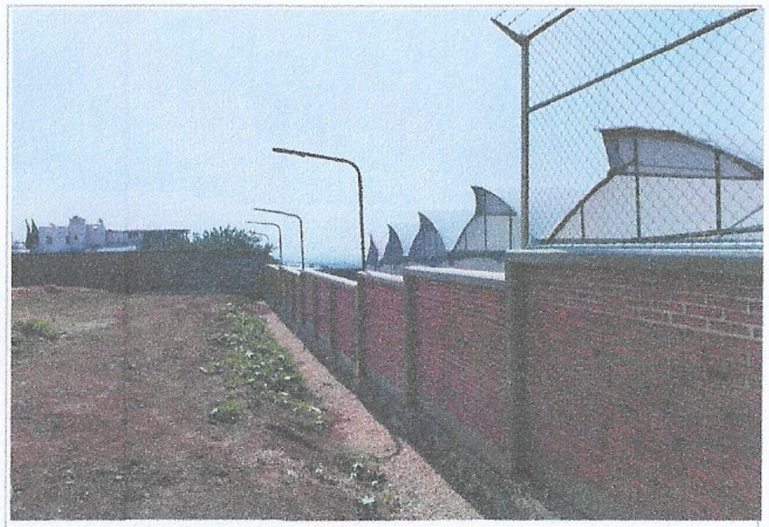


Imagen 1 del proyecto "Construcción de barda de colindancia de la Escuela de Estudios Superiores de Atlatlahucan".



Imagen 2 del proyecto "Construcción de barda de colindancia de la Escuela de Estudios Superiores de Atlatlahucan".



Imagen 3 del proyecto "Construcción de barda de colindancia de la Escuela de Estudios Superiores de Atlatlahucan".

2025	FAM	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Primer Trimestre 2026
EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES		Fecha de elaboración: 31/03/2026

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

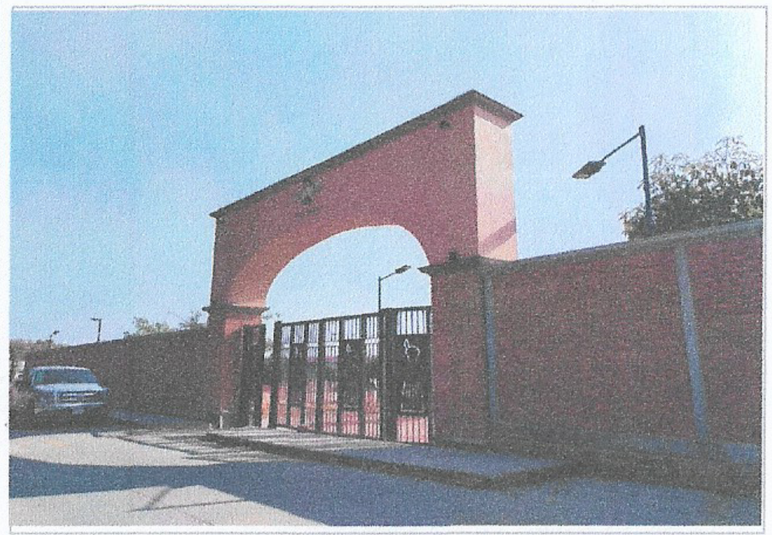


Imagen 4 del proyecto "Construcción de barda de colindancia de la Escuela de Estudios Superiores de Atlatlahucan".



Imagen 5 del proyecto "Construcción de barda de colindancia de la Escuela de Estudios Superiores de Atlatlahucan".



Imagen 6 del proyecto "Construcción de barda de colindancia de la Escuela de Estudios Superiores de Atlatlahucan".

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

Dra. Viridiana Aydeé León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Dr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la **misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra**.

2025	FAM	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Primer Trimestre 2026
EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES		Fecha de elaboración: 31/03/2026

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL


UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance


100.00%

PRIORIDAD **2** Nombre de la obra: Adecuaciones y mejoras en las fachadas y columnas del Centro de Investigaciones Químicas


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

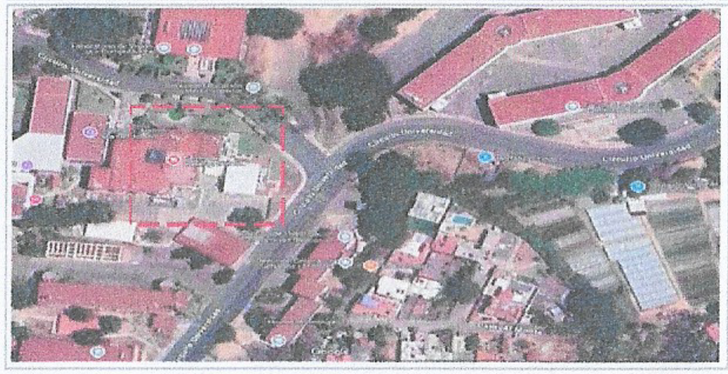

CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

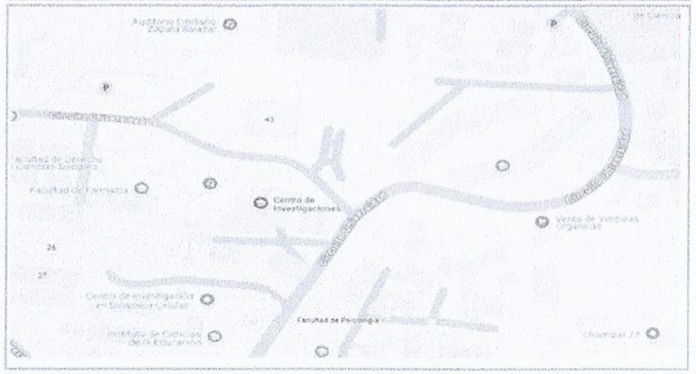

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

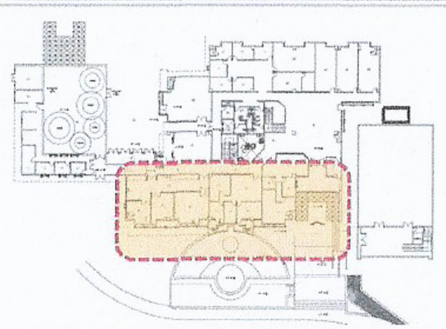

Dirección Postal: Av. Universidad #1001, Col. Chamilpa, C.P. 62209, Cuernavaca, Morelos.

ANTES



Adecuaciones y mejoras en las fachadas y columnas del Centro de Investigaciones Químicas




Vista del sitio donde se realizaran los trabajos de : Preliminares (delimitación del área, trazo, nivelación de la superficie, Asi como el desmantelamiento de estructura metálica, demoliciones, retiros) , para el Centro de Investigaciones Químicas (CIQ).

Observaciones :

Lo presentado en el Reporte Fotográfico del Tercer trimestre, corresponde a los espacios a intervenir mediante el fondo.

VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.

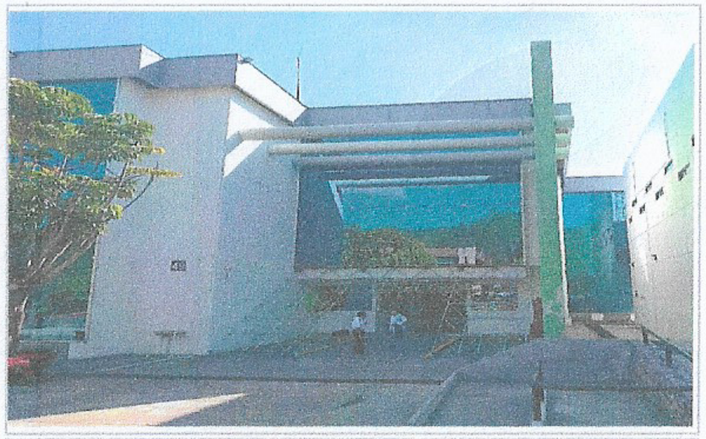

Vista donde se realizaran los trabajos de: Colocacion de estructura en fachada, (celosía de lámina de acero y/o louver) Asi como a la estructura nueva se sometera a tratamiento , en muros de acabado aparente o común se aplicara pintura vinílica , para el Centro de Investigaciones Químicas (CIQ).



Vista del sitio donde se realizaran los trabajos de: Retiro, reubicación y colocación de instalaciónes eléctricas y equipos de aire acondicionado, Asi como limpieza fina de obra para su entrega,en el Centro de Investigaciones Químicas (CIQ).

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCUTURAL

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Primer Trimestre 2026

Fecha de elaboración: 31/03/2026

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Despues



Imagen 1 del proyecto "Adecuaciones y mejoras en las fachadas y columnas del Centro de Investigaciones Químicas".



Imagen 2 del proyecto "Adecuaciones y mejoras en las fachadas y columnas del Centro de Investigaciones Químicas".

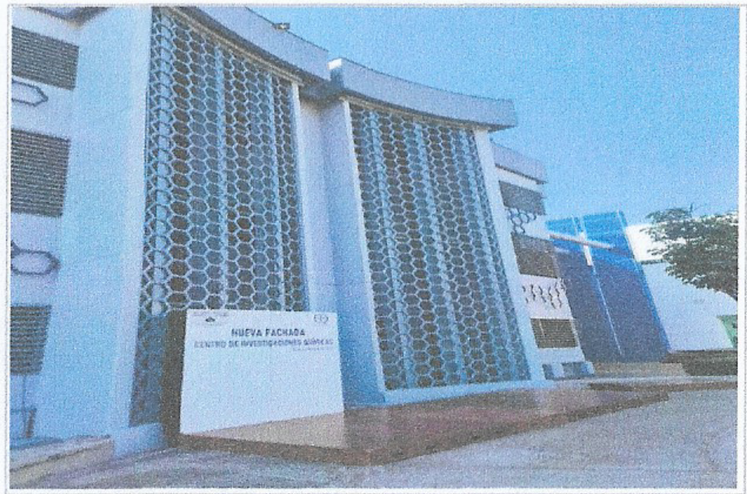


Imagen 3 del proyecto "Adecuaciones y mejoras en las fachadas y columnas del Centro de Investigaciones Químicas".



Imagen 4 del proyecto "Adecuaciones y mejoras en las fachadas y columnas del Centro de Investigaciones Químicas".



Imagen 5 del proyecto "Adecuaciones y mejoras en las fachadas y columnas del Centro de Investigaciones Químicas".



Imagen 6 del proyecto "Adecuaciones y mejoras en las fachadas y columnas del Centro de Investigaciones Químicas".

2025
EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCUTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Primer Trimestre 2026

Fecha de elaboración: 31/03/2026

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL



Imagen 7 del proyecto "Adecuaciones y mejoras en las fachadas y columnas del Centro de Investigaciones Químicas".



Imagen 8 del proyecto "Adecuaciones y mejoras en las fachadas y columnas del Centro de Investigaciones Químicas".

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

Dra. Viridiana Aydeé León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Dr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

2025	FAM	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Primer Trimestre 2026
EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES		Fecha de elaboración: 31/03/2026

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL


UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance


100%

PRIORIDAD **3** Nombre de la obra: Mantenimiento a cuatro plantas de tratamiento, así como a espacios académicos y de actividad física y deportiva en el Campus Norte (Facultad de Contaduría, Administración e Informática)


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

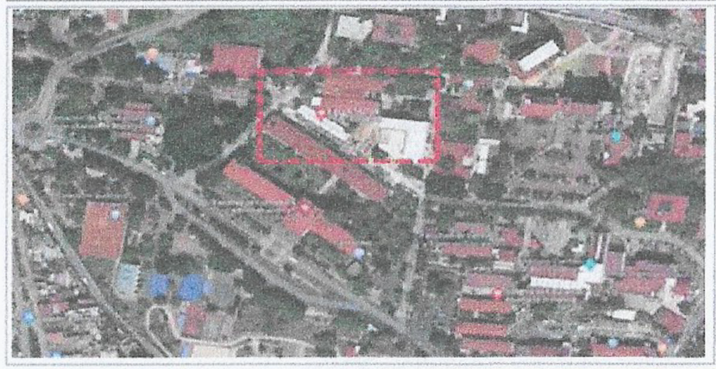

CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

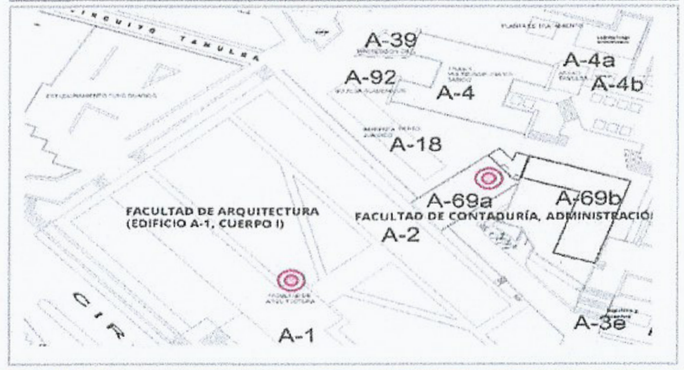

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

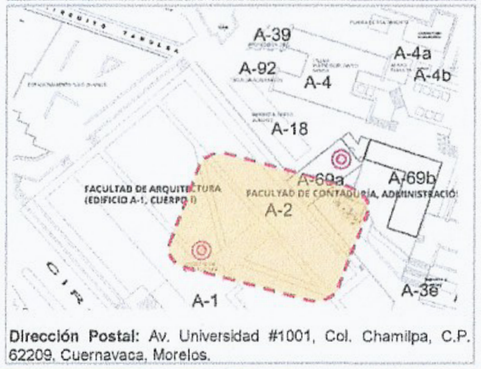

Dirección Postal: Av. Universidad #1001, Col. Chamilpa, C.P. 62209, Cuernavaca, Morelos.

ANTES



Fachada de la Facultad de Contaduría, Administración e Informática.




Vista del sitio en donde se realizaran los trabajos de: Limpieza de elementos, en la Facultad de Contaduría, Administración e Informática.

Observaciones :

Lo presentado en el Reporte Fotográfico del tercer trimestre, corresponde a los espacios a intervenir mediante el fondo.


VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.

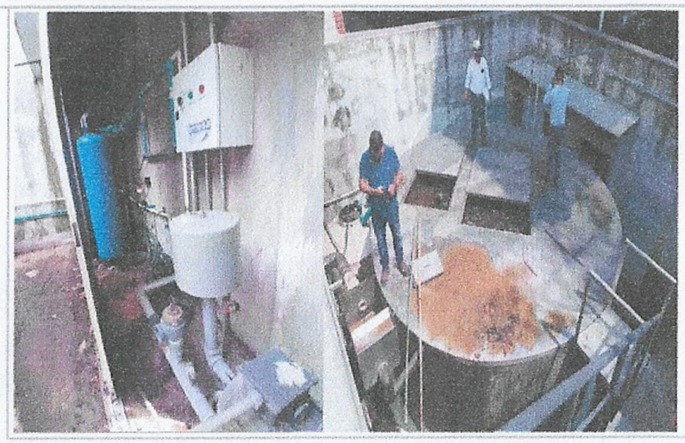

Vista del sitio en donde se realizaran los trabajos de: Revisión de equipos, así como caracterización del agua residual de acuerdo a parámetros de normas NOM aplicables, en la Facultad de Contaduría, Administración e Informática.



Vistas del sitio en donde se realizaran los trabajos de: Implementación de limpieza y/o desazolve , así como Albañilerías para optimización de sistemas, en la Facultad de Contaduría, Administración e Informática.

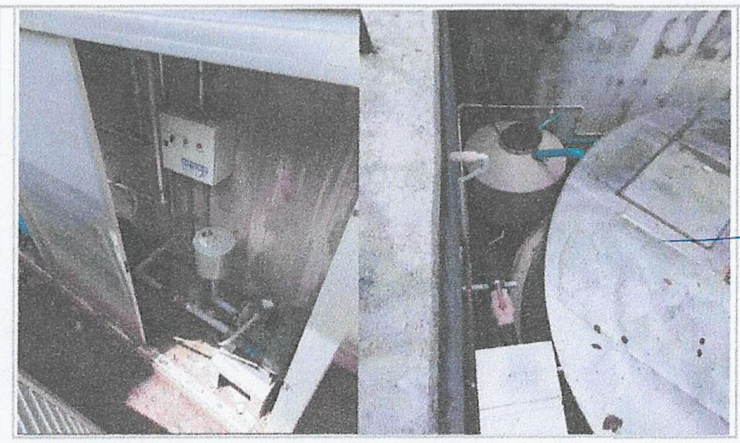

Vistas del sitio en donde se realizaran los trabajos de: Reparación o reposición de elementos eléctricos, mecánicos, electromecánicos, asi como pruebas y entrega de laboratorio para acreditar el cumplimiento de la norma NOM correspondiente, en la Facultad de Contaduría, Administración e Informática.

2025	FAM	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCUTURAL DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Primer Trimestre 2026
EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES		Fecha de elaboración: 31/03/2026

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Despues



Imagen 1 del proyecto "Mantenimiento a planta de tratamiento, en la Facultad de Contaduría Administración e Informática".



Imagen 2 del proyecto "Mantenimiento a planta de tratamiento, en la Facultad de Contaduría Administración e Informática".

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

Dra. Viridiana Aydeé León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Dr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

2025	FAM	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Primer Trimestre 2026
EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES		Fecha de elaboración: 31/03/2026

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance


100%

PRIORIDAD **3** Nombre de la obra: Mantenimiento a cuatro plantas de tratamiento, así como a espacios académicos y de actividad física y deportiva en el Campus Norte (Facultad de Psicología)


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

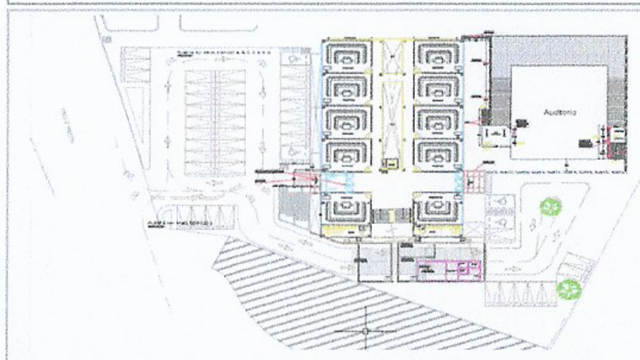


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

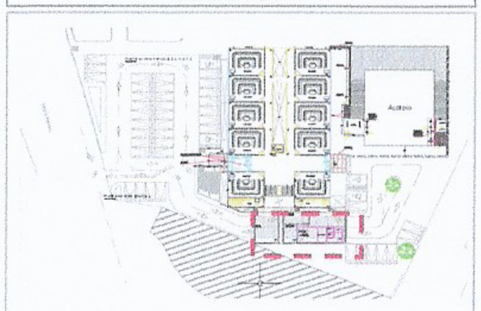

Dirección Postal: Av. Universidad #1001, Col. Chamilpa, C.P. 62209, Cuernavaca, Morelos.

ANTES

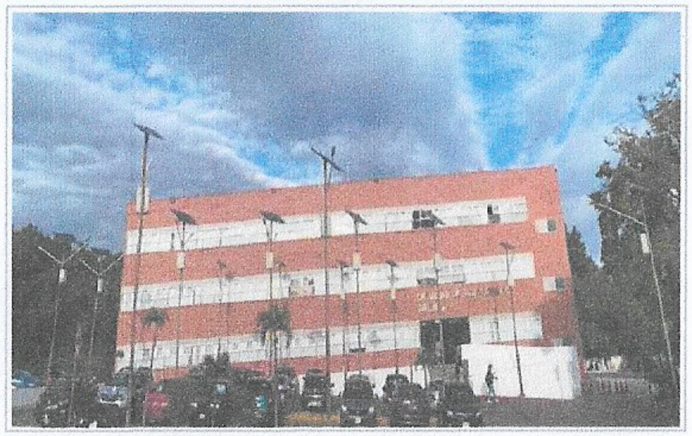

Fachada de la Facultad de Psicología




Vistas del sitio en donde se realizaran los trabajos de: Limpieza de elementos, para la Facultad de Psicología.

Observaciones :

Lo presentado en el Reporte Fotográfico del tercer trimestre, corresponde a los espacios a intervenir mediante el fondo.


VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.

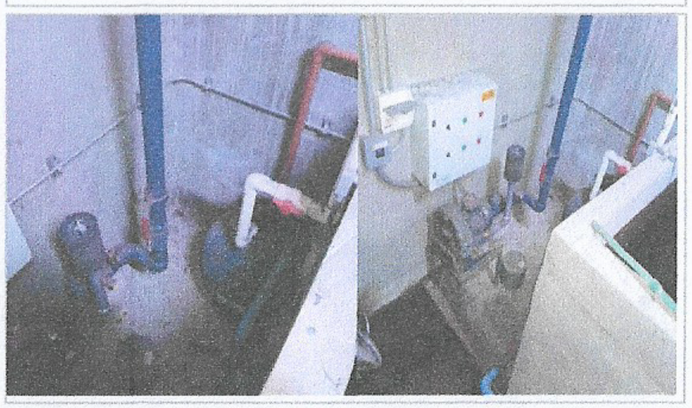

Vistas del sitio en donde se realizaran los trabajos de: Revisión de equipos eléctricos, Asi como Reparación o reposición de elementos eléctricos, mecánicos, electromecánicos, para la Facultad de Psicología.



Vistas del sitio en donde se realizaran los trabajos de: Caracterización del agua residual de acuerdo a parámetros de normas NOM aplicables, Asi como la impieza y/o desazolve de tanques reactor, para la Facultad de Psicología.

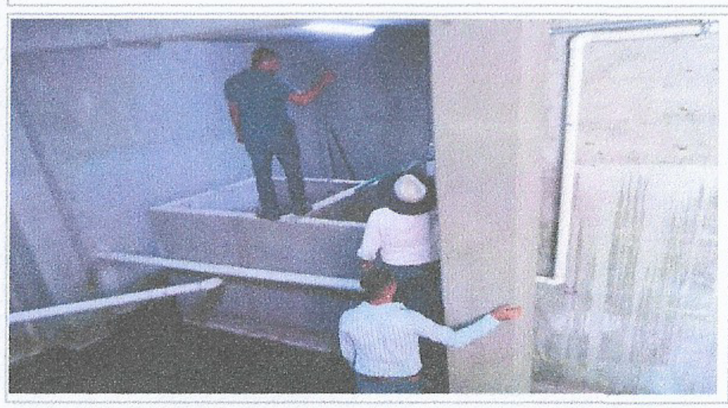

Vista del sitio en donde se realizaran trabajos de: Pruebas y Entrega de laboratorio para acreditar el cumplimiento de la norma NOM correspondiente, para la Facultad de Psicología.

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCUTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Primer Trimestre
2026

Fecha de elaboración: 31/03/2026

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Despues

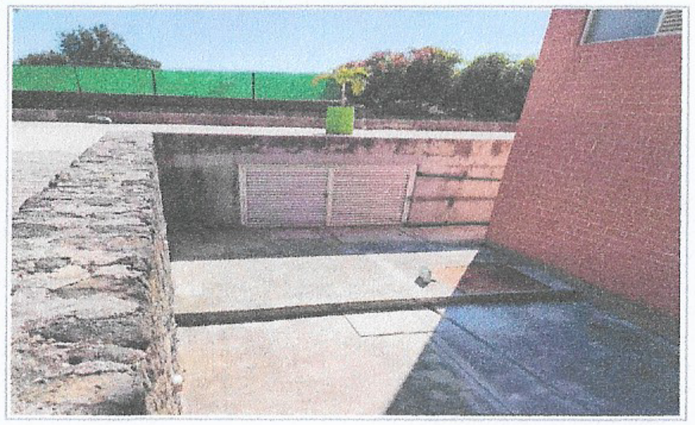


Imagen 1 del proyecto "Mantenimiento a planta de tratamiento, en la Facultad de Psicología".

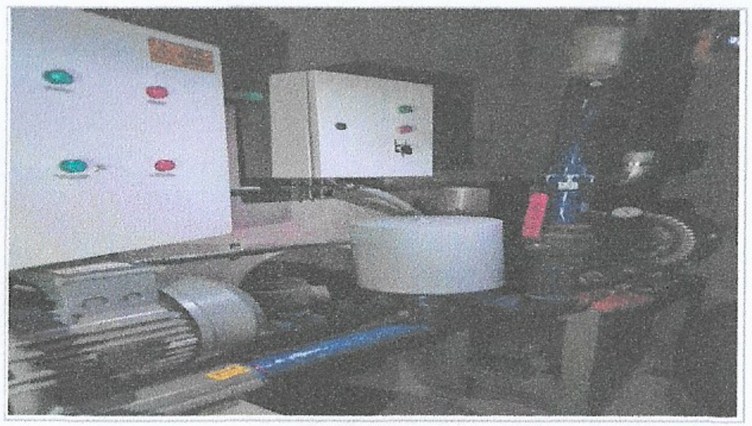


Imagen 2 del proyecto "Mantenimiento a planta de tratamiento, en la Facultad de Psicología".

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

Dra. Viridiana Aydeé León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Dr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

2025	FAM	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCUTURAL DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Primer Trimestre 2026
EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES		Fecha de elaboración: 31/03/2026

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL


UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

100%

PRIORIDAD **3** Nombre de la obra: Mantenimiento a cuatro plantas de tratamiento, así como a espacios académicos y de actividad física y deportiva en el Campus Norte (Escuela de Turismo)

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

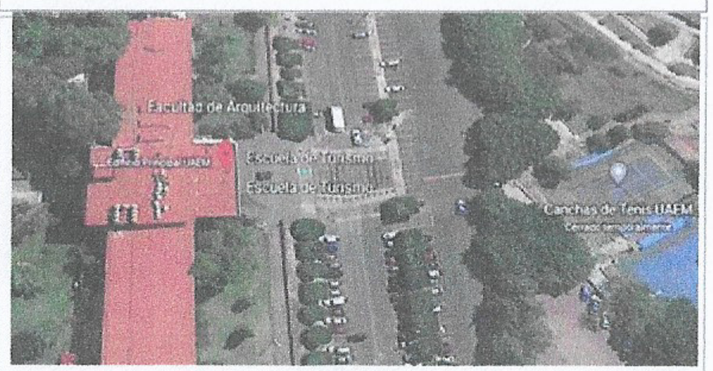

CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal: Av. Universidad #1001, Col. Chamilpa, C.P. 62209, Cuernavaca, Morelos.

ANTES



Fachada de la Escuela de Turismo



Vistas del sitio en donde se realizaran los trabajos de: Limpieza de elementos, Asi como Albañilerías para optimización de sistemas, para la Escuela de Turismo.

Observaciones :

Lo presentado en el Reporte Fotográfico del tercer trimestre, corresponde a los espacios a intervenir mediante el fondo.

VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.

2025	FAM	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCUTURAL DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Primer Trimestre 2026
EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES		Fecha de elaboración: 31/03/2026

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL



Vista del sitio en donde se realizaran los trabajos de: Revisión de equipos eléctricos, mecánicos, electromecánicos, Asi como la Reparación o reposición de elementos eléctricos, para la Escuela de Turismo.



Vistas del sitio en donde se realizaran los trabajos de: Caracterización del agua residual , Asi como limpieza y/o desazolve de tanques reactor, cárcamos, registros, criba, ductos y sedimentadores, para la Escuela de Turismo.



Vista del sitio en donde se realizaran trabajos de: Pruebas y Entrega de laboratorio para acreditar el cumplimiento de la norma NOM correspondiente, para la Escuela de Turismo.

DESPUES



Imagen 1 del proyecto "Mantenimiento a planta de tratamiento, para la Escuela de Turismo".



Imagen 2 del proyecto "Mantenimiento a planta de tratamiento, para la Escuela de Turismo".

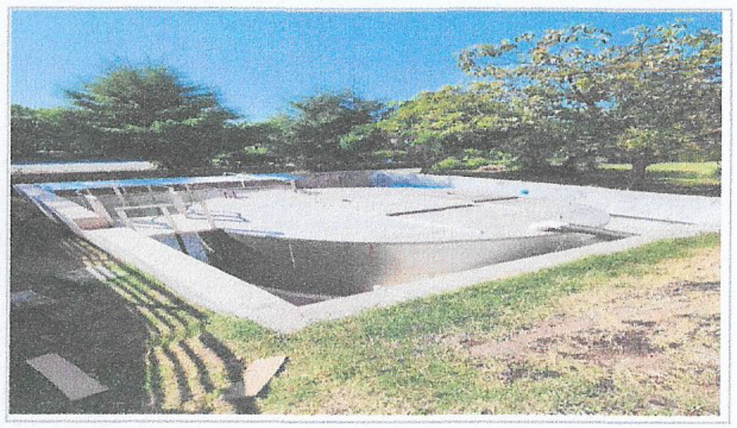


Imagen 3 del proyecto "Mantenimiento a planta de tratamiento, para la Escuela de Turismo".

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

Dra. Viridiana Aydeé León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Dr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

2025	FAM	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCUTURAL DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Primer Trimestre 2026
EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES		Fecha de elaboración: 31/03/2026

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS


Porcentaje de avance

100%


PRIORIDAD **3**

Nombre de la obra: Mantenimiento a cuatro plantas de tratamiento, así como a espacios académicos y de actividad física y deportiva en el Campus Norte (Facultad de Ciencias Biológicas)


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

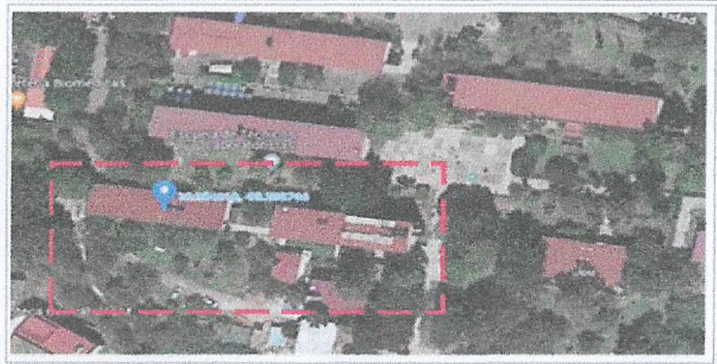

CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

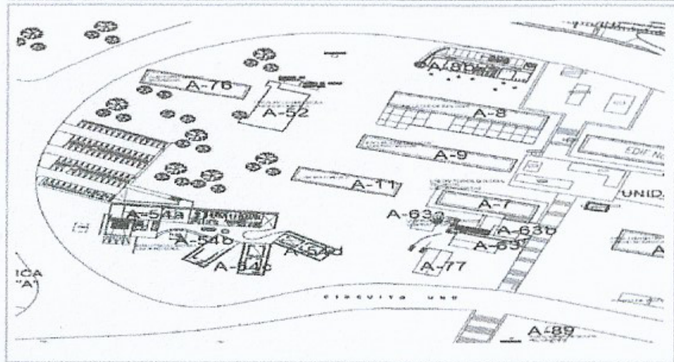


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

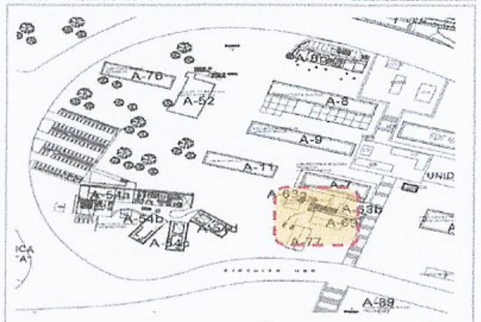


Dirección Postal: Av. Universidad #1001, Col. Chamilpa, C.P. 62209, Cuernavaca, Morelos.

ANTES

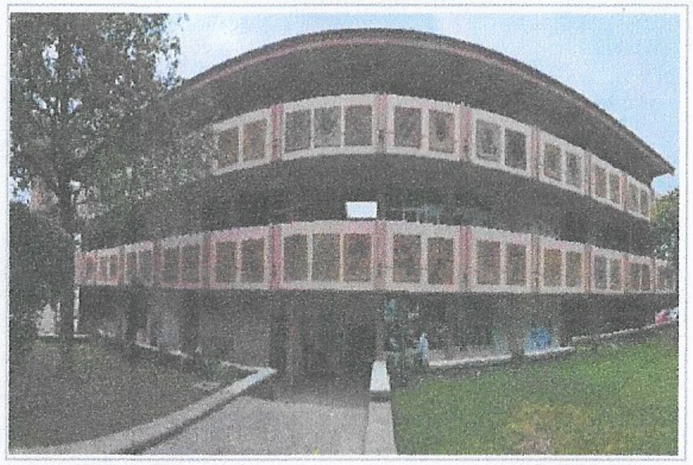

Fachada de la Facultad de Ciencias Biológicas

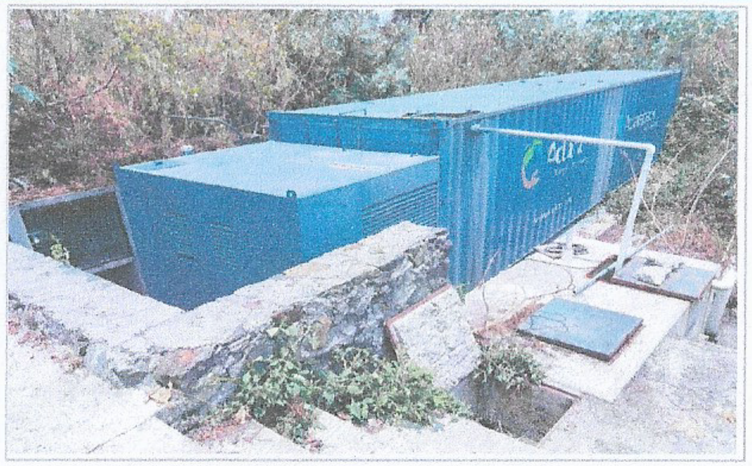

Vista del sitio en donde se realizaran los trabajos de: Limpieza de elementos, Asi como Albañilerías para optimización de sistemas, para la Facultad de Ciencias Biológicas.

Observaciones :

Lo presentado en el Reporte Fotográfico del tercer trimestre, corresponde a los espacios a intervenir mediante el fondo.


VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.

2025	FAM	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCUTURAL DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Primer Trimestre 2026
EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES		Fecha de elaboración: 31/03/2026


REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL



Vista del sitio en donde se realizaran los trabajos de: Revisión de equipos eléctricos, mecánicos, electromecánicos y accesorios que la conforman, Asi como Reparación o reposición de elementos eléctricos, mecánicos, electromecánicos, para la Facultad de Ciencias Biológicas

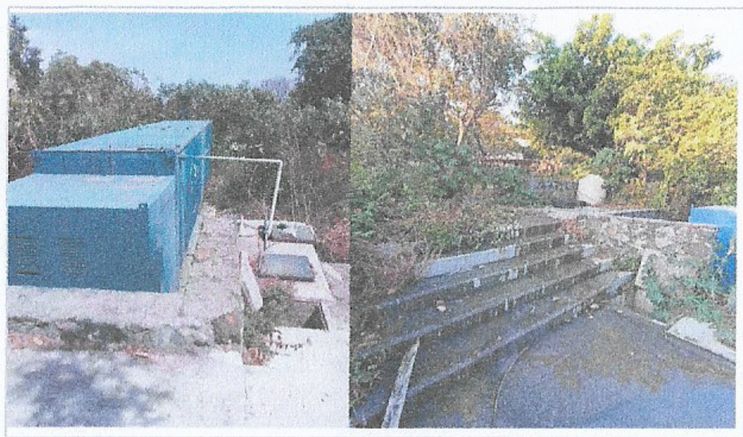

Vista del sitio en donde se realizaran los trabajos de: Implementación de limpieza y/o desazolve de tanques reactor, cárcamos, registros, criba, ductos y sedimentadores, para la Facultad de Ciencias Biológicas

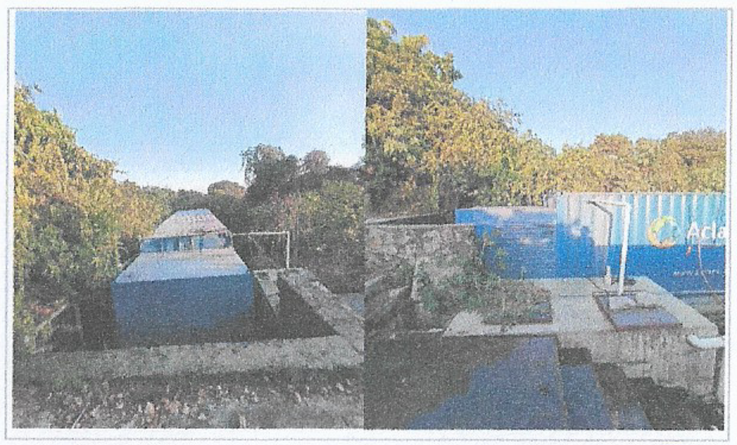

Vista del sitio en donde se realizaran trabajos de: Pruebas y Entrega de laboratorio para acreditar el cumplimiento de la norma NOM correspondiente, para la Facultad de Ciencias Biológicas

DESPUES

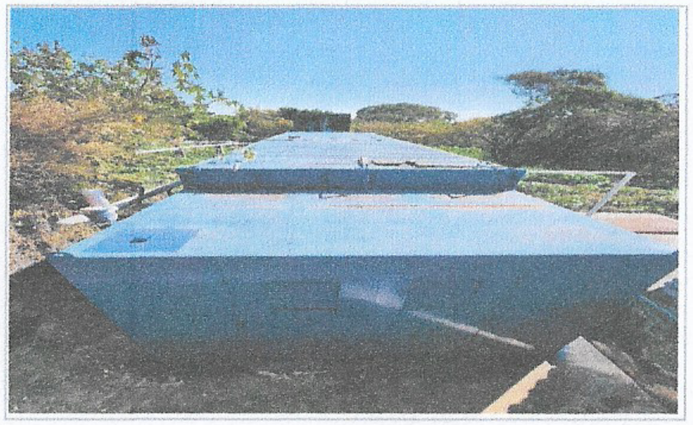


Imagen 1 del proyecto "Mantenimiento a planta de tratamiento, para la Facultad de Ciencias Biológicas ".

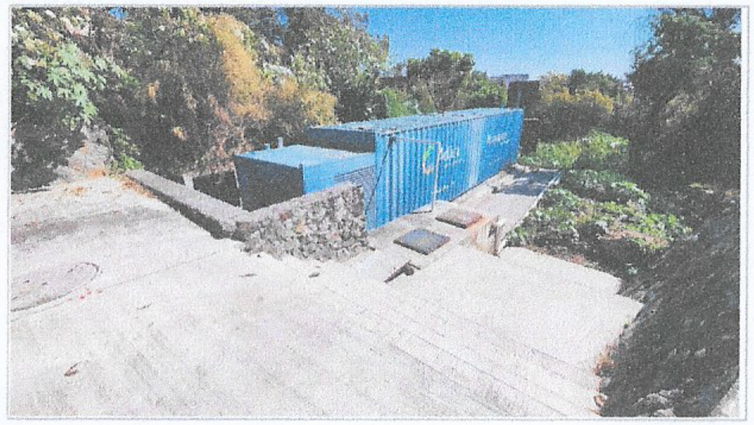


Imagen 2 del proyecto "Mantenimiento a planta de tratamiento, para la Facultad de Ciencias Biológicas ".



Imagen 3 del proyecto "Mantenimiento a planta de tratamiento, para la Facultad de Ciencias Biológicas ".

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

Dra. Viridiana Aydeé León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Dr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

2025	FAM	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCUTURAL DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Primer Trimestre 2026
EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES		Fecha de elaboración: 31/03/2026

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL


UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance


100%

PRIORIDAD **3** Nombre de la obra: Mantenimiento a cuatro plantas de tratamiento, así como a espacios académicos y de actividad física y deportiva en el Campus Norte (Gimnasio auditorio)


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

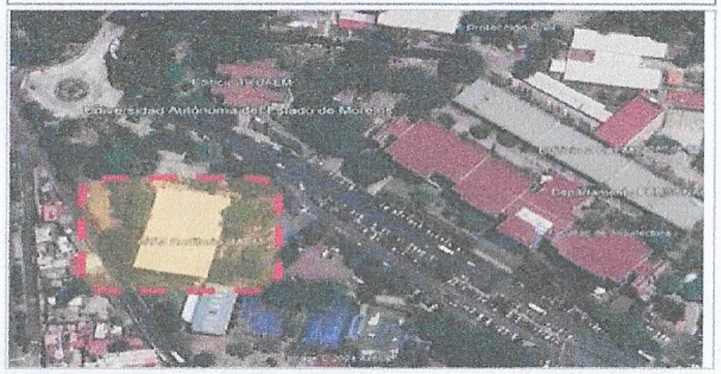

CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

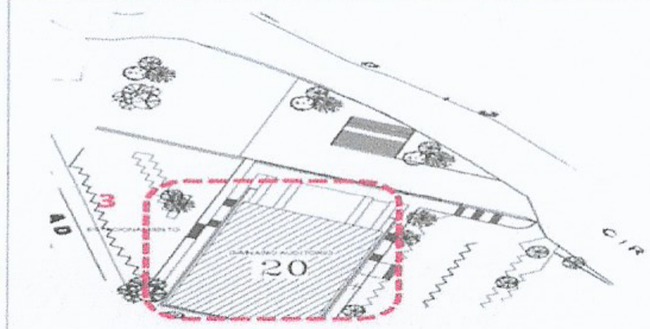

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

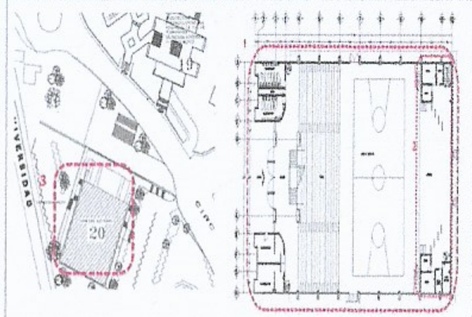

Dirección Postal: Av. Universidad #1001, Col. Chamilpa, C.P. 62209, Cuernavaca, Morelos.

ANTES



Fachada del Gimnasio Auditorio (Edif. A-20)



Vista del sitio en donde se realizaran los trabajos de: Mantenimiento al sistema de impermeabilizante en cubierta existente, para el edificio A-20 Gimnasio Auditorio.

Observaciones :

Lo presentado en el Reporte Fotográfico del tercer trimestre, corresponde a los espacios a intervenir mediante el fondo.

VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.



Vistas del sitio en donde se realizaran los trabajos de: Mantenimiento a la estructura metálica existente con pintura de esmalte, para el edificio A-20 Gimnasio Auditorio.



Vista del sitio en donde se realizaran los trabajos de: Rehabilitación del escenario existente, para el edificio A-20 Gimnasio Auditorio.



Vista del sitio en donde se realizaran los trabajos de: Reparación de elementos existentes de concreto en fachada, para el edificio A-20 Gimnasio Auditorio.

2025	FAM	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCUTURAL DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Primer Trimestre 2026
EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES		

Fecha de elaboración: 31/03/2026

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DESPUES

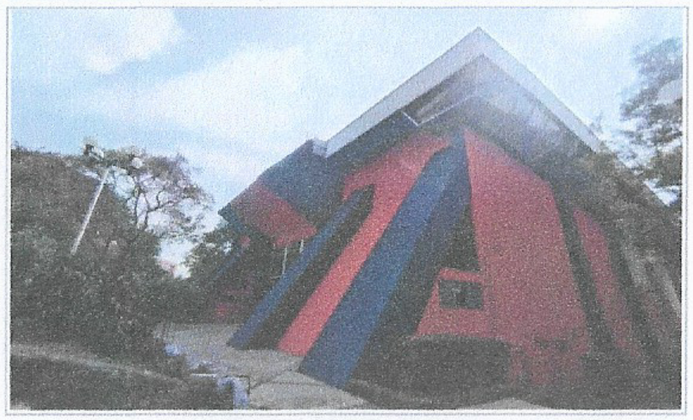


Imagen 1 del proyecto "Mantenimiento a espacios de actividad física y deportiva en el Campus Norte en el edificio A-20 Gimnasio Auditorio".

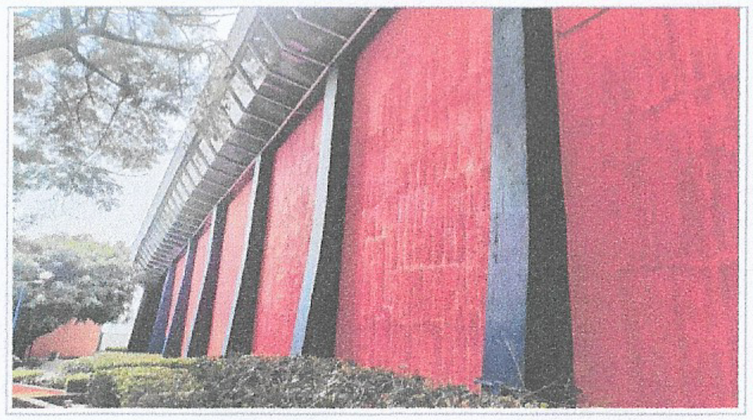


Imagen 2 del proyecto "Mantenimiento a espacios de actividad física y deportiva en el Campus Norte en el edificio A-20 Gimnasio Auditorio".

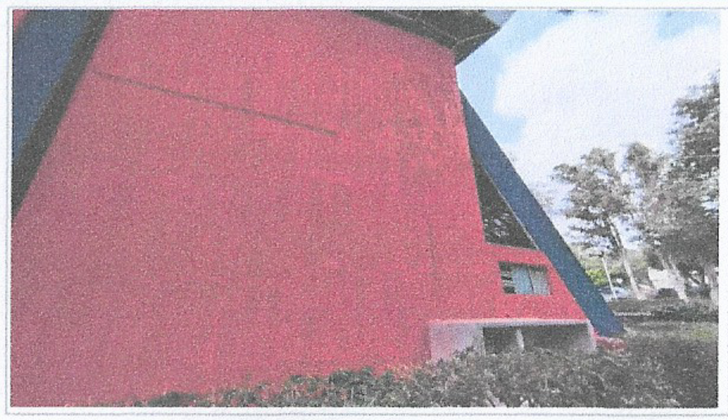


Imagen 3 del proyecto "Mantenimiento a espacios de actividad física y deportiva en el Campus Norte en el edificio A-20 Gimnasio Auditorio".

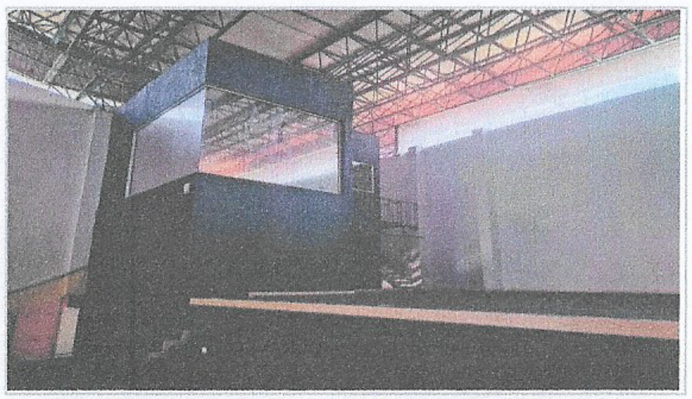


Imagen 4 del proyecto "Mantenimiento a espacios de actividad física y deportiva en el Campus Norte en el edificio A-20 Gimnasio Auditorio".



Imagen 5 del proyecto "Mantenimiento a espacios de actividad física y deportiva en el Campus Norte en el edificio A-20 Gimnasio Auditorio".

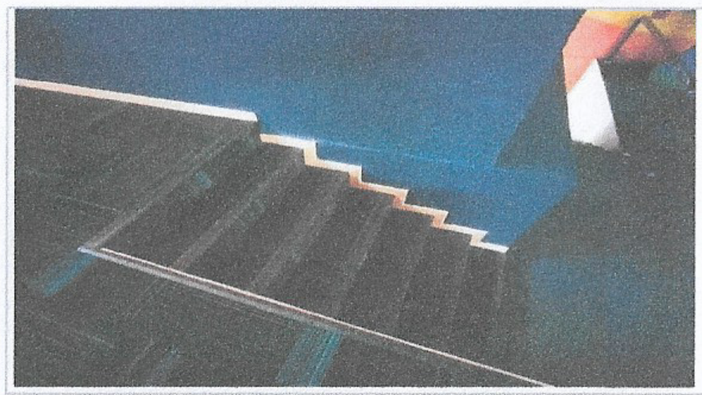


Imagen 6 del proyecto "Mantenimiento a espacios de actividad física y deportiva en el Campus Norte en el edificio A-20 Gimnasio Auditorio".

2025	FAM	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCUTURAL DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Primer Trimestre 2026
EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES		Fecha de elaboración: 31/03/2026

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL



Imagen 7 del proyecto "Mantenimiento a espacios de actividad física y deportiva en el Campus Norte en el edificio A-20 Gimnasio Auditorio".



Imagen 8 del proyecto "Mantenimiento a espacios de actividad física y deportiva en el Campus Norte en el edificio A-20 Gimnasio Auditorio".

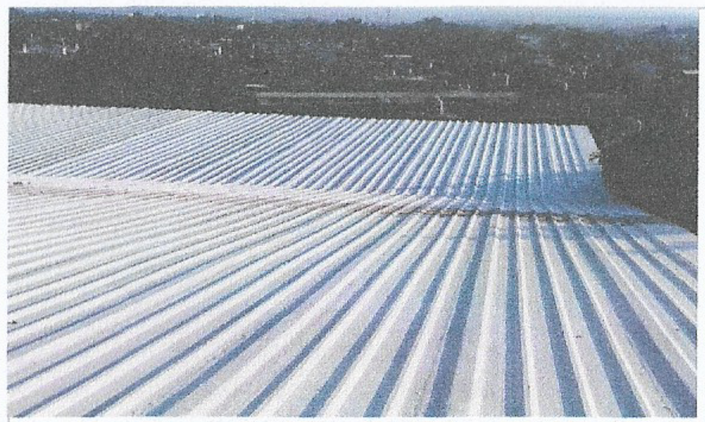


Imagen 9 del proyecto "Mantenimiento a espacios de actividad física y deportiva en el Campus Norte en el edificio A-20 Gimnasio Auditorio".

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

Dra. Viridiana Aydeé León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Dr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

2025	FAM	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCUTURAL DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Primer Trimestre 2026
EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES		Fecha de elaboración: 31/03/2026

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL


UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance


100%

PRIORIDAD **3** Nombre de la obra: Mantenimiento a cuatro plantas de tratamiento, así como a espacios académicos y de actividad física y deportiva en el Campus Norte (Polideportivo 1)


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

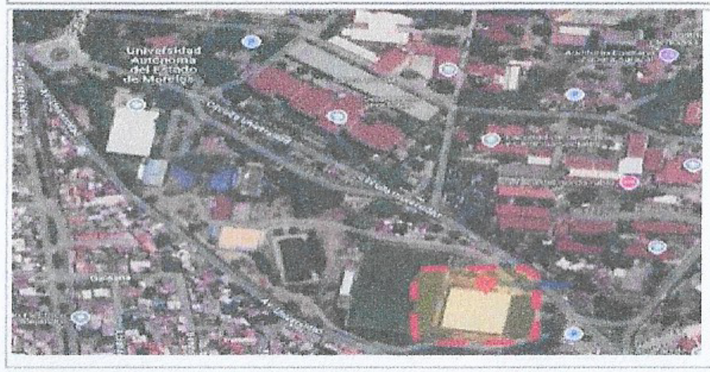

CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

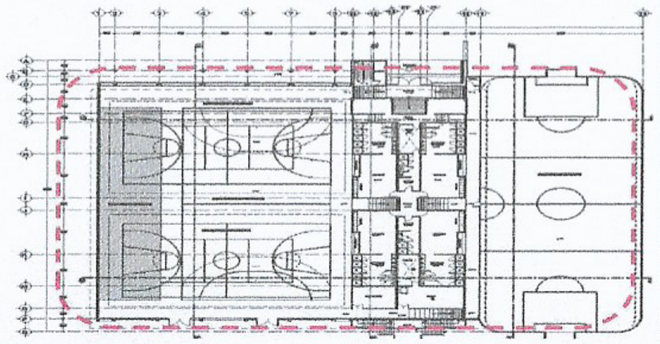

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

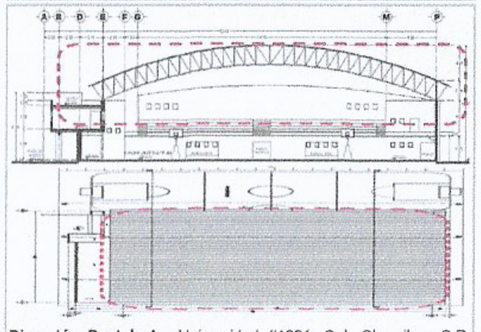

Dirección Postal: Av. Universidad #1001, Col. Chamilpa, C.P. 62209, Cuernavaca, Morelos.

ANTES



Fachada del Polideportivo 01 (edif. A-37)




Vistas del sitio en donde se realizaran los trabajos de: Mantenimiento a la Cubierta existente, para el edificio A-37 Polideportivo 01.

Observaciones :

Lo presentado en el Reporte Fotográfico del tercer trimestre, corresponde a los espacios a intervenir mediante el fondo.

VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.

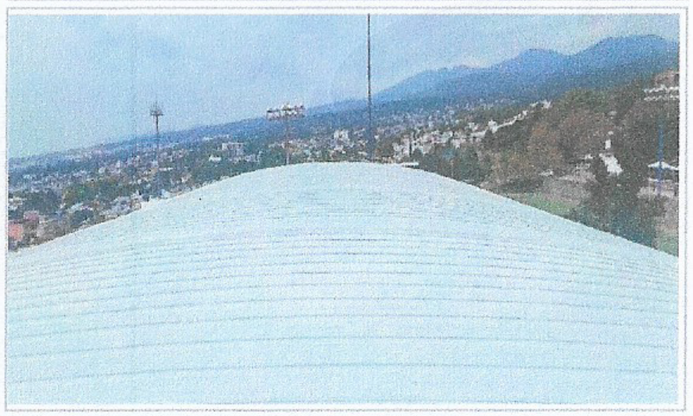

Vista del sitio en donde se realizaran los trabajos de: Mantenimiento a la Cubierta existente, para el edificio A-37 Polideportivo 01.



Vista del sitio en donde se realizaran los trabajos de: Mantenimiento a la estructura metálica existente con pintura de esmalte, para el edificio A-37 Polideportivo 01.



Vista del sitio en donde se realizaran los trabajos de: Mantenimiento a la estructura metálica existente con pintura de esmalte, para el edificio A-37 Polideportivo 01.

2025	FAM	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCUTURAL DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Primer Trimestre 2026
EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES		Fecha de elaboración: 31/03/2026

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DESPUES

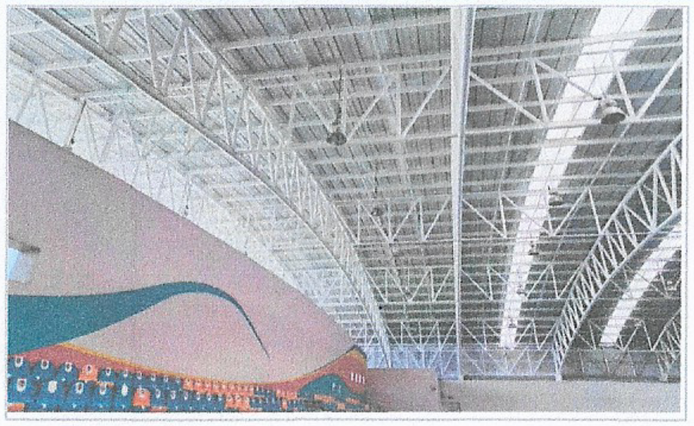


Imagen 1 del proyecto "Mantenimiento a espacios de actividad física y deportiva en el Campus Norte en el edificio A-37 Polideportivo 01. ".



Imagen 2 del proyecto "Mantenimiento a espacios de actividad física y deportiva en el Campus Norte en el edificio A-37 Polideportivo 01. ".



Imagen 3 del proyecto "Mantenimiento a espacios de actividad física y deportiva en el Campus Norte en el edificio A-37 Polideportivo 01. ".



Imagen 4 del proyecto "Mantenimiento a espacios de actividad física y deportiva en el Campus Norte en el edificio A-37 Polideportivo 01. ".



Imagen 5 del proyecto "Mantenimiento a espacios de actividad física y deportiva en el Campus Norte en el edificio A-37 Polideportivo 01. ".

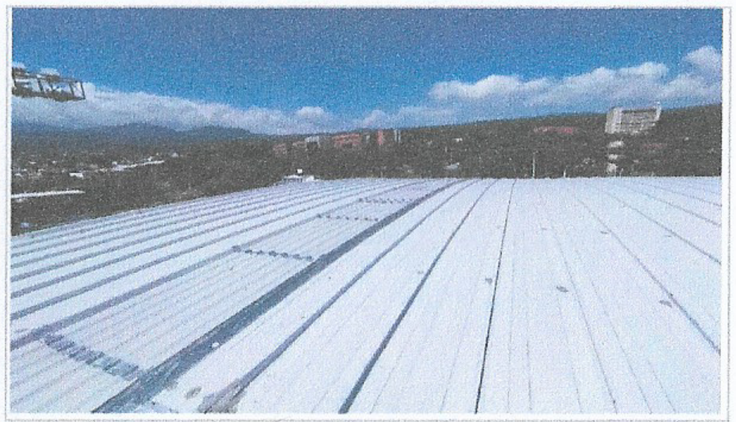


Imagen 6 del proyecto "Mantenimiento a espacios de actividad física y deportiva en el Campus Norte en el edificio A-37 Polideportivo 01. ".

2025	FAM	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCUTURAL DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Primer Trimestre 2026
EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES		

Fecha de elaboración: 31/03/2026

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

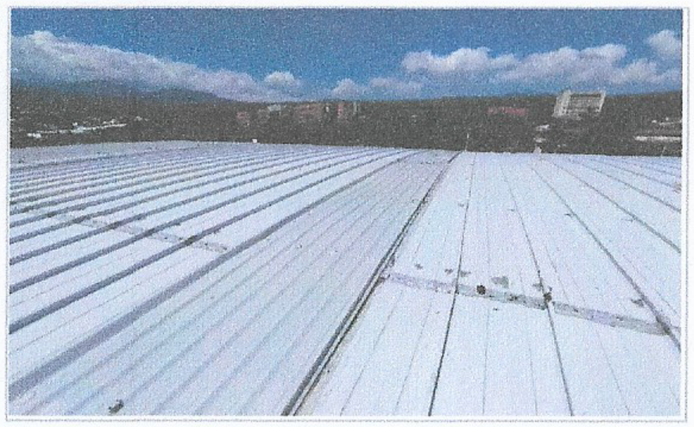


Imagen 7 del proyecto "Mantenimiento a espacios de actividad física y deportiva en el Campus Norte en el edificio A-37 Polideportivo 01. ".

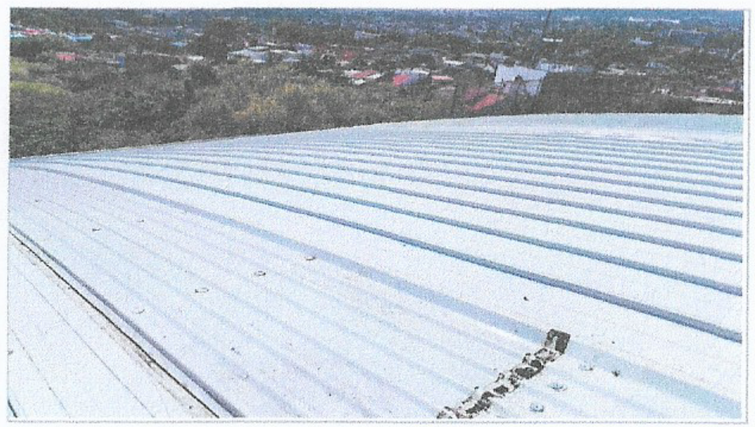


Imagen 8 del proyecto "Mantenimiento a espacios de actividad física y deportiva en el Campus Norte en el edificio A-37 Polideportivo 01. ".

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

Dra. Viridiana Aydeé León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Dr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

2025	FAM	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Primer Trimestre 2026
EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES		Fecha de elaboración: 31/03/2026

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL


UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance


100%

PRIORIDAD **3** Nombre de la obra: Mantenimiento a cuatro plantas de tratamiento, así como a espacios académicos y de actividad física y deportiva en el Campus Norte (Polideportivo 2)


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

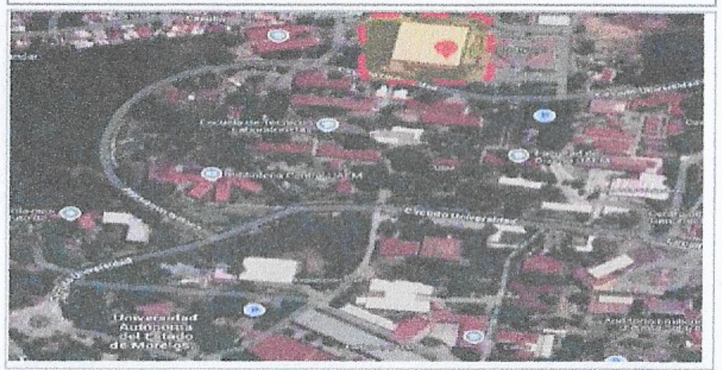

CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

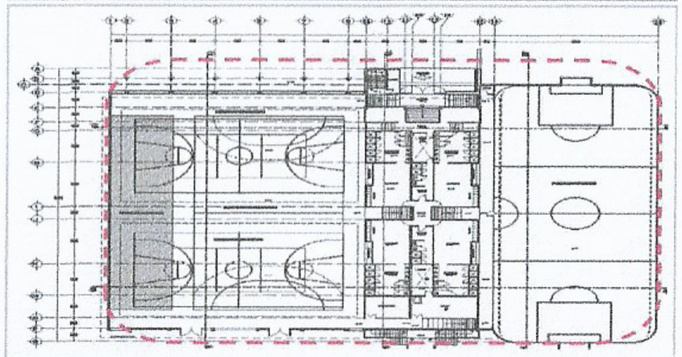


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

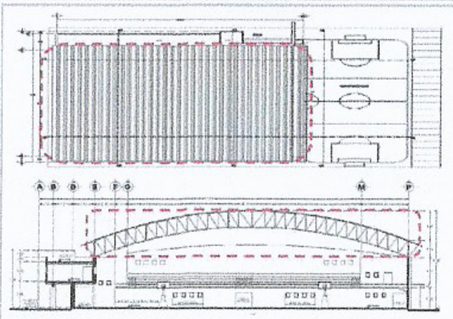

Dirección Postal: Av. Universidad #1001, Col. Chamilpa, C.P. 62209, Cuernavaca, Morelos.

ANTES

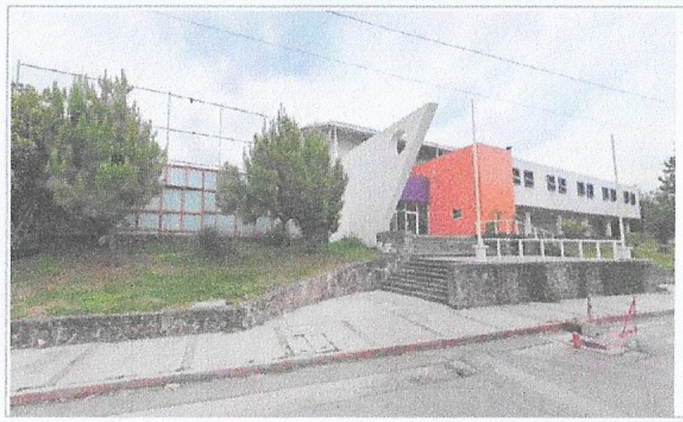

Fachada del Polideportivo 2 (edif. A-38)



Vistas del sitio en donde se realizaran los trabajos de: Mantenimiento a la Cubierta existente, en el edificio A-38 Polideportivo 02.


Observaciones :

Lo presentado en el Reporte Fotográfico del tercer trimestre, corresponde a los espacios a intervenir mediante el fondo.

VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.



Vistas del sitio en donde se realizaran los trabajos de: Mantenimiento a la Cubierta existente, en el edificio A-38 Polideportivo 02.

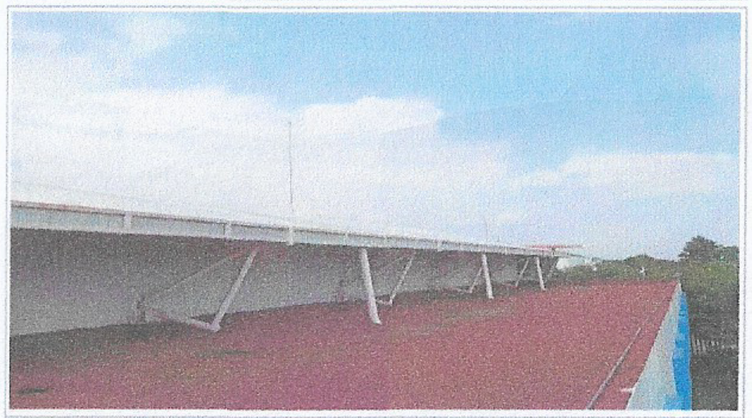

Vista del sitio en donde se realizaran los trabajos de: Mantenimiento a la estructura metálica existente con pintura de esmalte, en el edificio A-38 Polideportivo 02.



Vista del sitio en donde se realizaran los trabajos de: Mantenimiento a la estructura metálica existente con pintura de esmalte, en el edificio A-38 Polideportivo 02.

2025	FAM	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Primer Trimestre 2026
EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES		Fecha de elaboración: 31/03/2026

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DESPUES

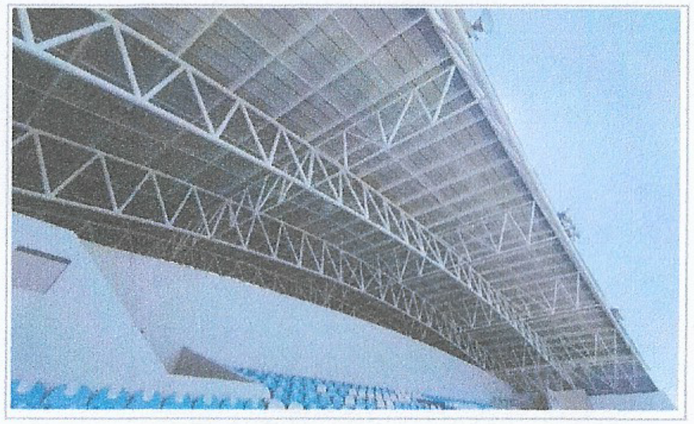


Imagen 1 del proyecto "Mantenimiento a espacios de actividad física y deportiva en el Campus Norte en el edificio A-38 Polideportivo 02 ".

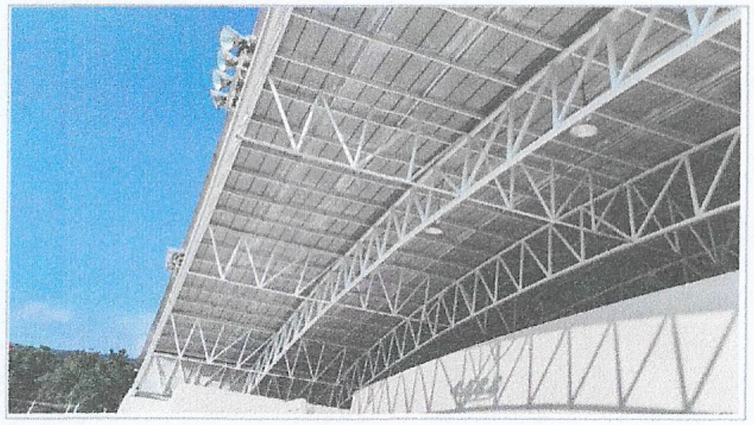


Imagen 2 del proyecto "Mantenimiento a espacios de actividad física y deportiva en el Campus Norte en el edificio A-38 Polideportivo 02 ".



Imagen 3 del proyecto "Mantenimiento a espacios de actividad física y deportiva en el Campus Norte en el edificio A-38 Polideportivo 02 ".



Imagen 4 del proyecto "Mantenimiento a espacios de actividad física y deportiva en el Campus Norte en el edificio A-38 Polideportivo 02 ".

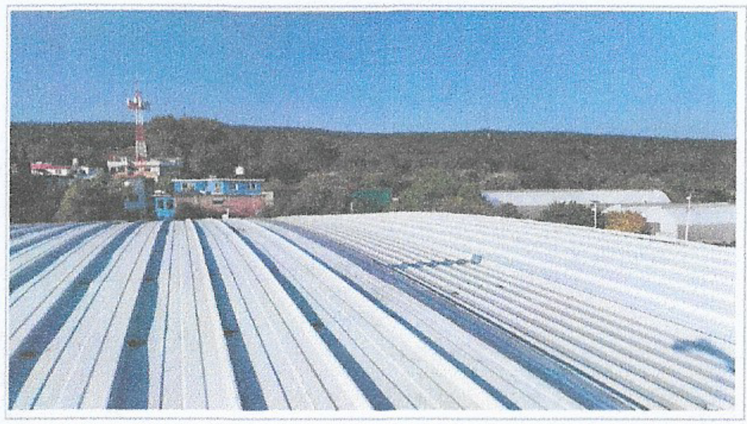


Imagen 5 del proyecto "Mantenimiento a espacios de actividad física y deportiva en el Campus Norte en el edificio A-38 Polideportivo 02 ".

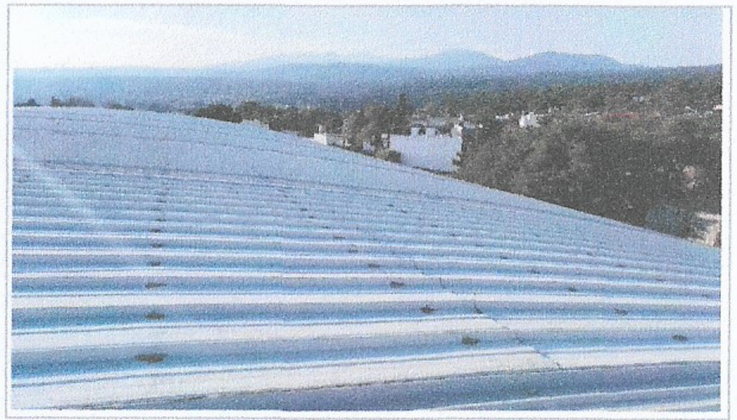


Imagen 6 del proyecto "Mantenimiento a espacios de actividad física y deportiva en el Campus Norte en el edificio A-38 Polideportivo 02 ".

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

Dra. Viridiana Aydeé León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Dr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

2025	FAM	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Primer Trimestre 2026
EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES		Fecha de elaboración: 31/03/2026

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL


UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance


100%

PRIORIDAD **3** Nombre de la obra: Mantenimiento a cuatro plantas de tratamiento, así como a espacios académicos y de actividad física y deportiva en el Campus Norte (Centro de lenguas)


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

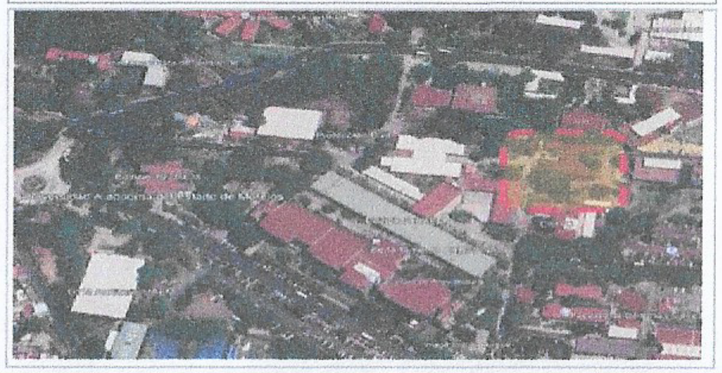

CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

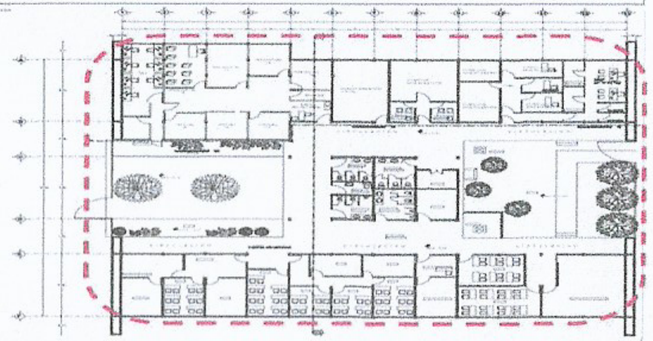


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

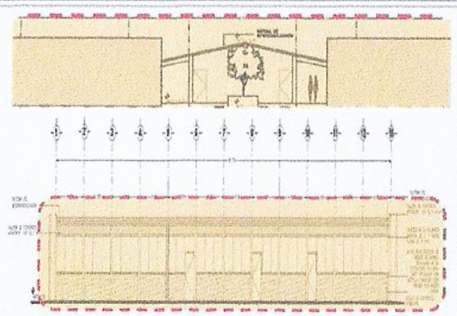


Dirección Postal: Av. Universidad #1001, Col. Chamilpa, C.P. 62209, Cuernavaca, Morelos.

ANTES

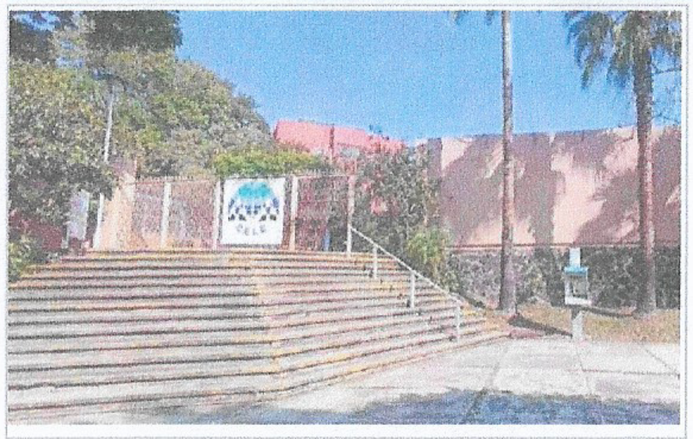

Fachada del Centro de Lenguas (CELE)

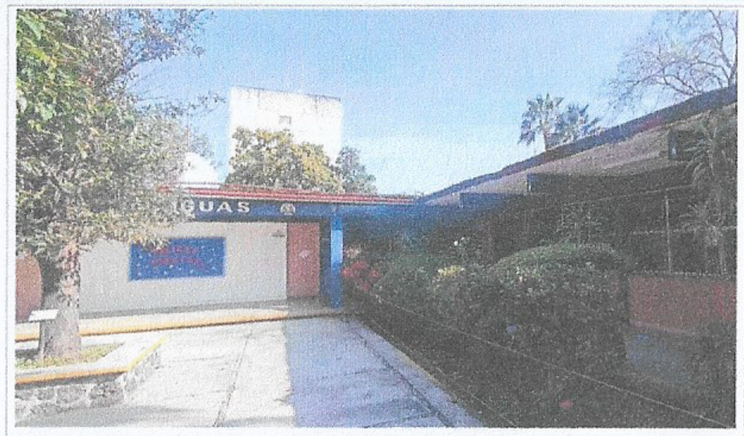

Vista del sitio en donde se relizaran los trabajos de Mantenimiento como : Preliminares y Albañilerias (Retiros Limpieza, Resanes entre otros), en el edificio A-5 Centro de Lenguas (CELE).

Observaciones :

Lo presentado en el Reporte Fotográfico del tercer trimestre, corresponde a los espacios a intervenir mediante el fondo.

VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.



Vista del sitio en donde se relizaran los trabajos de Mantenimiento como : Acabados (Aplicaion de pinturas) Asi como limpieza fina, en el edificio A-5 Centro de Lenguas (CELE)



Vista del sitio en donde se relizaran los trabajos de Mantenimiento a lLuminacion, en el edificio A-5 Centro de Lenguas (CELE)



Vista del sitio en donde se relizaran los trabajos de Mantenimiento a lLuminacion, en el edificio A-5 Centro de Lenguas (CELE)

2025	FAM	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCUTURAL DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Primer Trimestre 2026
EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES		Fecha de elaboración: 31/03/2026

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Despues

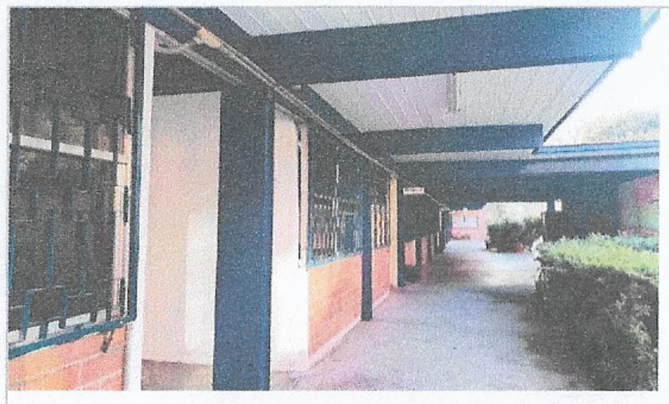


Imagen 1 del proyecto "Mantenimiento a espacios Academicos en en el edificio A-5 Centro de Lenguas (CELE).

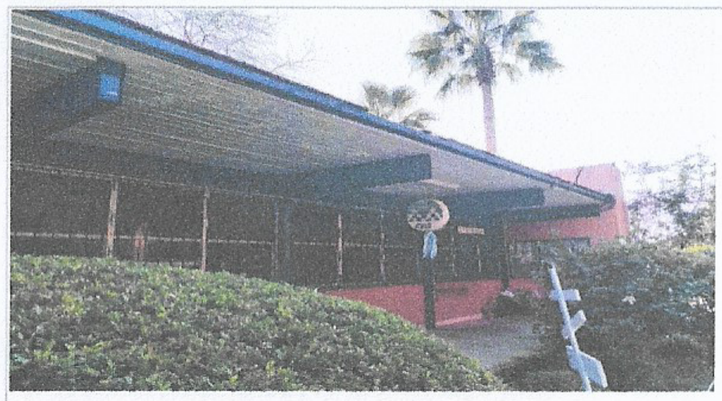


Imagen 2 del proyecto "Mantenimiento a espacios Academicos en en el edificio A-5 Centro de Lenguas (CELE).

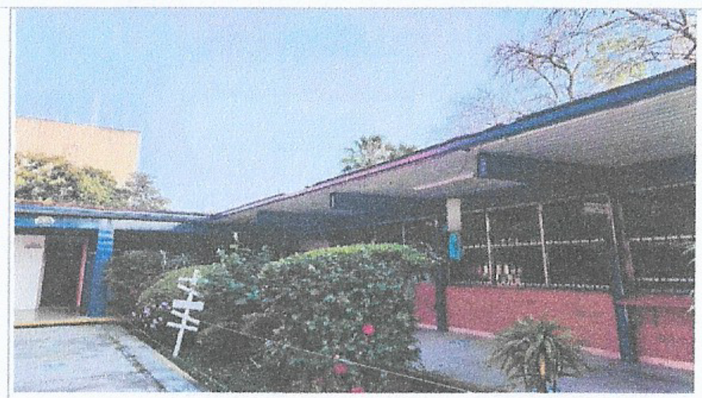


Imagen 3 del proyecto "Mantenimiento a espacios Academicos en en el edificio A-5 Centro de Lenguas (CELE).

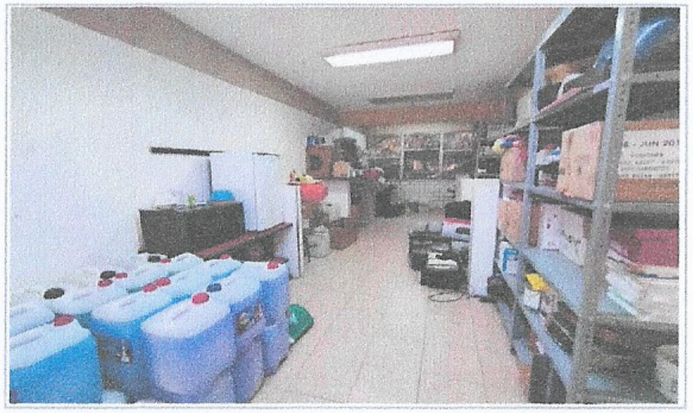


Imagen 4 del proyecto "Mantenimiento a espacios Academicos en en el edificio A-5 Centro de Lenguas (CELE).



Imagen 5 del proyecto "Mantenimiento a espacios Academicos en en el edificio A-5 Centro de Lenguas (CELE).



Imagen 6 del proyecto "Mantenimiento a espacios Academicos en en el edificio A-5 Centro de Lenguas (CELE).

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

Dra. Viridiana Aydeé León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Dr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

2025	FAM	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCUTURAL DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Primer Trimestre 2026
EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES		Fecha de elaboración: 31/03/2026

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS


Porcentaje de avance

PRIORIDAD **3** Nombre de la obra: Mantenimiento a cuatro plantas de tratamiento, así como a espacios académicos y de actividad física y deportiva en el Campus Norte (Escuela de Teatro, Danza y Música)


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

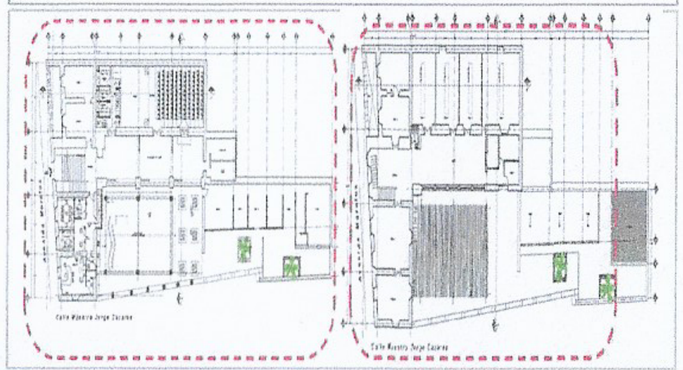

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

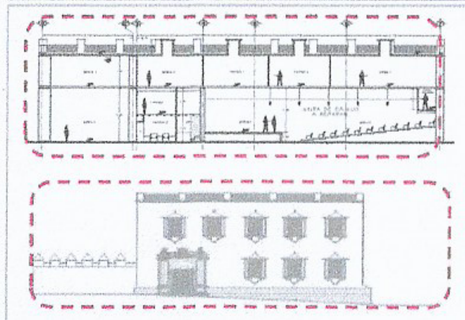


Dirección Postal: Av. Morelos Esq. Jorge Cázares # 180, Col. Centro C.P. 62000, Cuernavaca, Morelos.

ANTES



Fachada de la Escuela de Teatro, Danza y Música

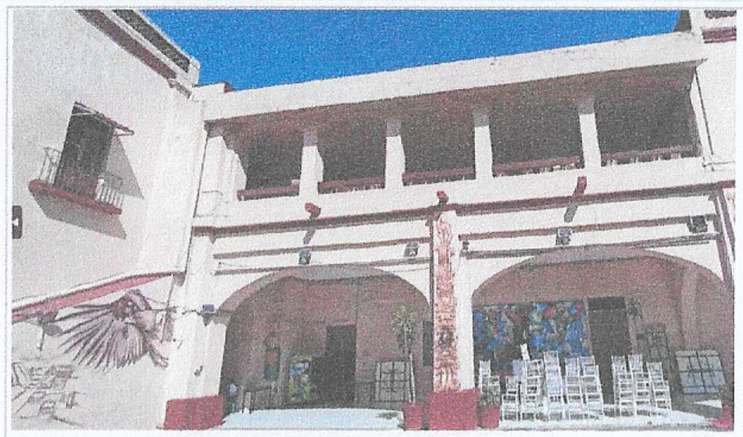


Vista del sitio en donde se relizaran los trabajos de Mantenimiento como: Preliminares y Albañilerias (Retiros, Colocacion de Protecciones, Resanes entre otros), para la Escuela de Teatro, Danza y Música.

Observaciones :

Lo presentado en el Reporte Fotográfico del Tercer trimestre, corresponde a los espacios a intervenir mediante el fondo.


VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.

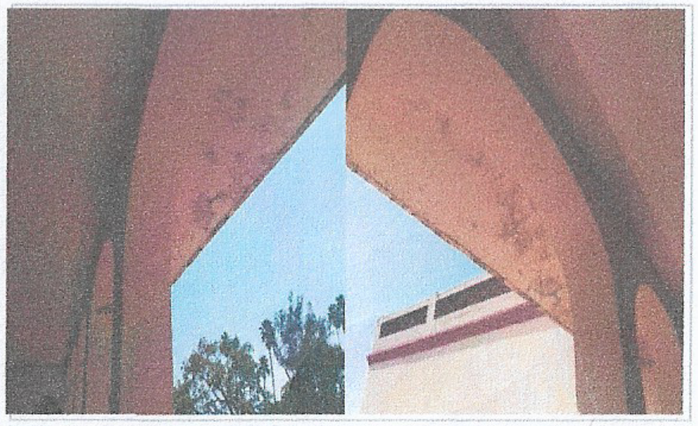

Vista del sitio en donde se relizaran los trabajos de Mantenimiento como : Preliminares y Albañilerias (Retiros, Colocacion de Protecciones, Resanes entre otros), para la Escuela de Teatro, Danza y Música.



Vista del sitio en donde se relizaran los trabajos de Mantenimiento como : Acabados (Aplicaion de pinturas) Asi como limpieza fina, para la Escuela de Teatro, Danza y Música.

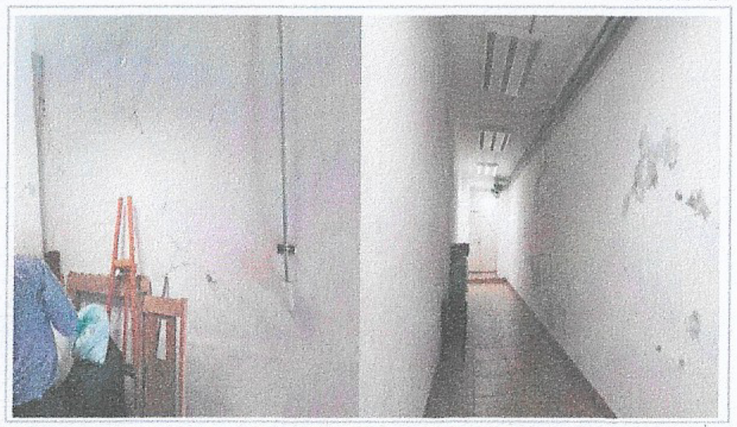

Vista del sitio en donde se relizaran los trabajos de Mantenimiento como : Acabados (Aplicaion de pinturas) Asi como limpieza fina, para la Escuela de Teatro, Danza y Música.

2025	FAM	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCUTURAL DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Primer Trimestre 2026
EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES		Fecha de elaboración: 31/03/2026

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Despues

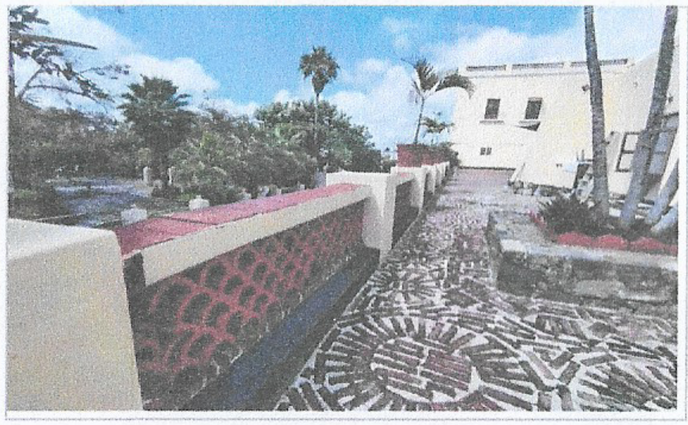


Imagen 1 del proyecto "Mantenimiento a espacios Academicos en la Escuela de Teatro, Danza y Música".



Imagen 2 del proyecto "Mantenimiento a espacios Academicos en la Escuela de Teatro, Danza y Música".



Imagen 3 del proyecto "Mantenimiento a espacios Academicos en la Escuela de Teatro, Danza y Música".



Imagen 4 del proyecto "Mantenimiento a espacios Academicos en la Escuela de Teatro, Danza y Música".

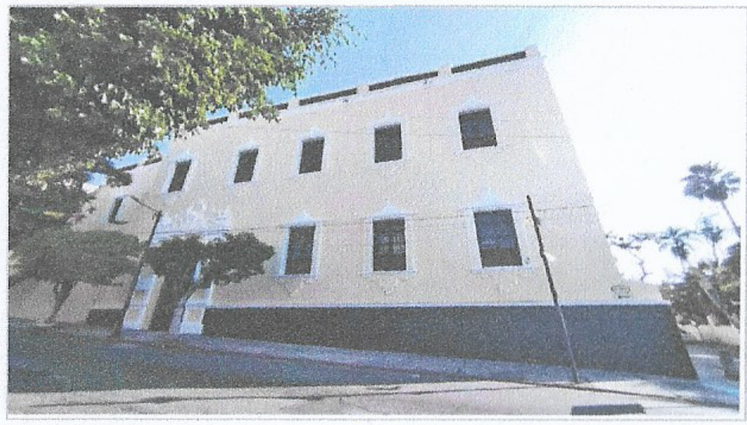


Imagen 5 del proyecto "Mantenimiento a espacios Academicos en la Escuela de Teatro, Danza y Música".

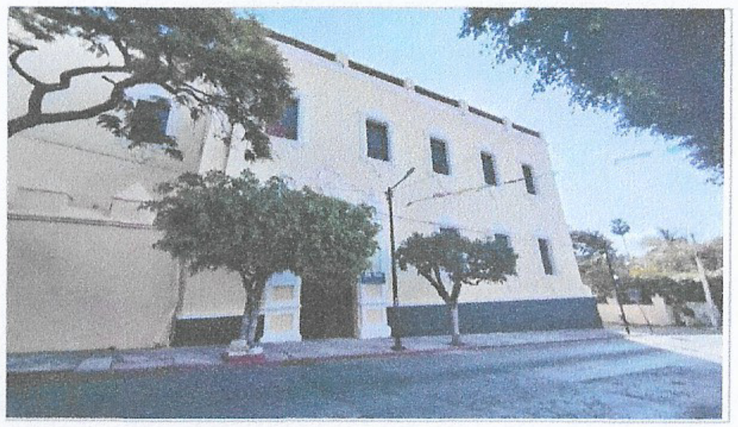


Imagen 6 del proyecto "Mantenimiento a espacios Academicos en la Escuela de Teatro, Danza y Música".

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

Dra. Viridiana Aydeé León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Dr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

2025	FAM	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Primer Trimestre 2026
EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES		Fecha de elaboración: 31/03/2026

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance


0%

PRIORIDAD **4** Nombre de la obra: Adquirir el equipamiento necesario en los espacios académicos de los Campus Norte y Campus Oriente.


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

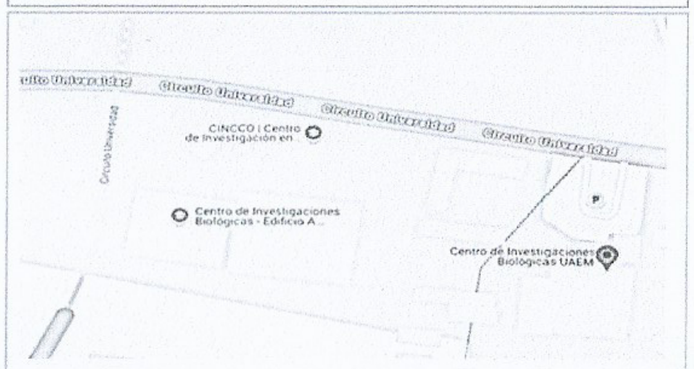


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

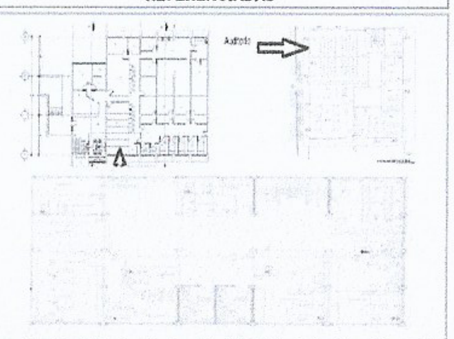


Dirección Postal: Av. Universidad #1001, Col. Chamilpa, C.P. 62209, Cuernavaca, Morelos.

ANTES

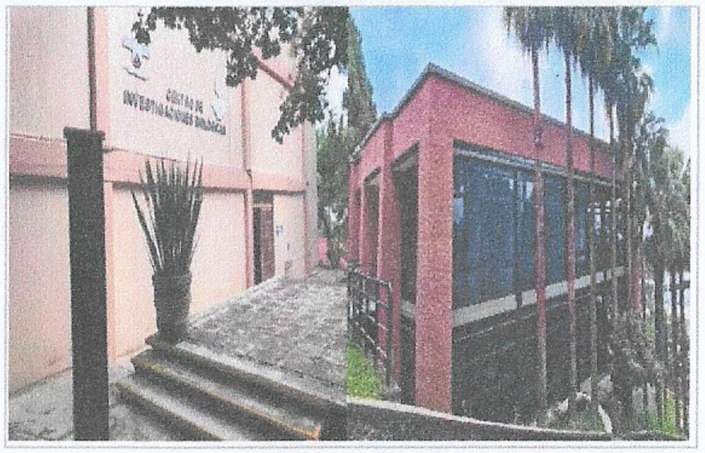

Fachada del Centro de Investigaciones Biológicas y edificio A

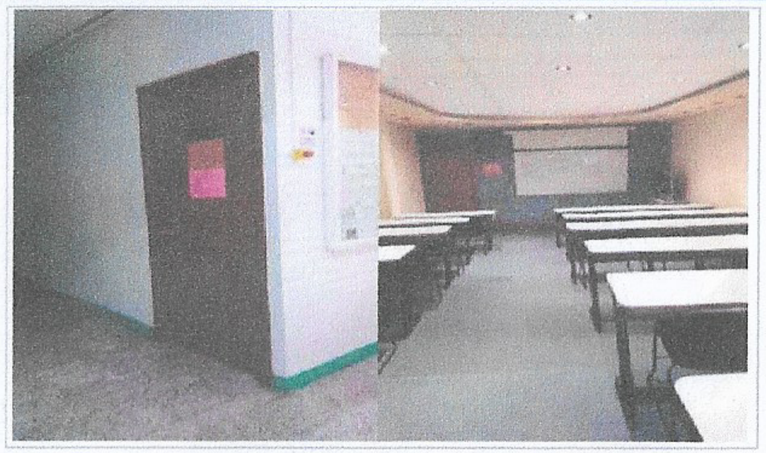


Se equipara Auditorio de usos múltiples 1 con 13 mesas rectangulares y 1 pizarrón blanco

Observaciones :

Lo presentado en el Reporte Fotográfico del segundo trimestre, corresponde a los espacios a intervenir mediante el fondo.

VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.

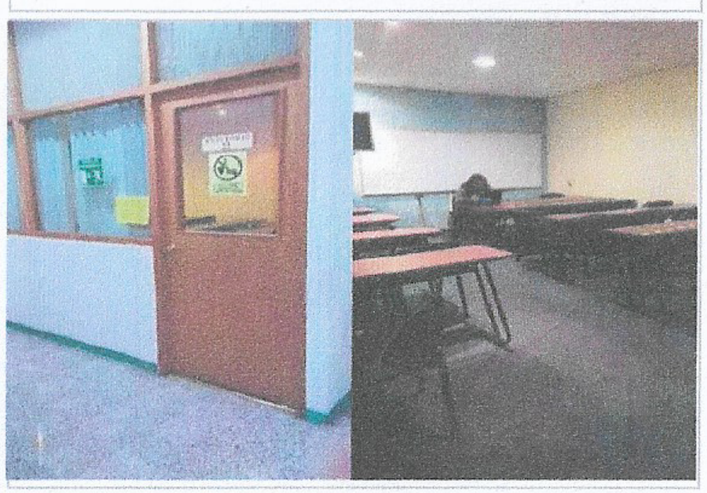

Se equipara Auditorio de usos múltiples 2 con 13 mesas rectangulares y 1 pizarrón blanco



Se equipará Auditorio con 2 aires acondicionados y 1 proyector



Se equipará Laboratorio con 1 congelador

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCUTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Primer Trimestre 2026

Fecha de elaboración: 31/03/2026

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL



Se equipará Biblioteca con 7 estantes sencillos de batería



Equipamiento de Centro de cómputo con 1 mesa y 11 sillas de visita

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

Dra. Viridiana Aydeé León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Dr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

2025	FAM	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCUTURAL DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Primer Trimestre 2026
EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES		Fecha de elaboración: 31/03/2026

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance


0%

PRIORIDAD **4** Nombre de la obra: Adquirir el equipamiento necesario en los espacios académicos de los Campus Norte y Campus Oriente.


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

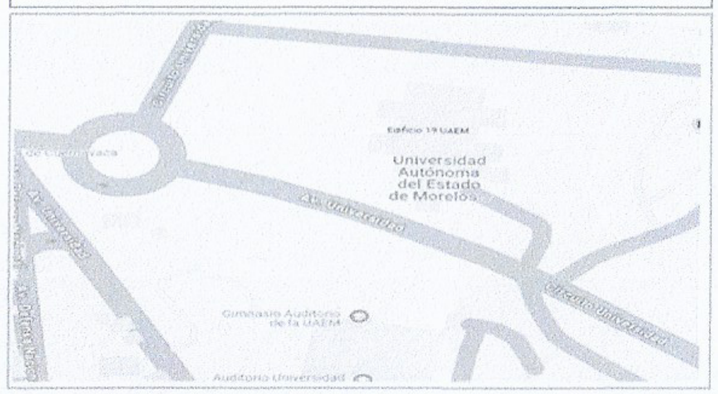

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

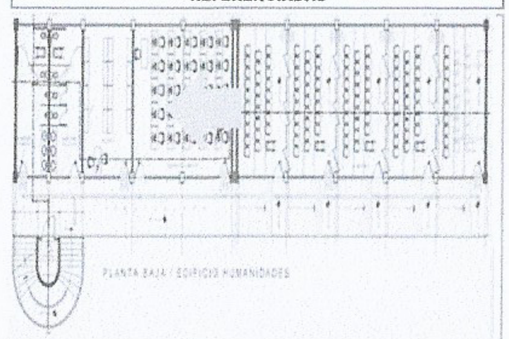

Dirección Postal: Av. Universidad #1001, Col. Chamilpa, C.P. 62209, Cuernavaca, Morelos.

ANTES



Facahada del Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Estudios Regionales



Se equipará Centro de cómputo con 9 piezas de Procesador AMD Ryzen y 14 piezas de Monitor para CPU

Observaciones :

Lo presentado en el Reporte Fotográfico del segundo trimestre, corresponde a los espacios a intervenir mediante el fondo.

VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

Dra. Viridiana Aydeé León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Dr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

2025	FAM	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Primer Trimestre 2026
EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES		Fecha de elaboración: 31/03/2026

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

0%

PRIORIDAD **4** Nombre de la obra: Adquirir el equipamiento necesario en los espacios académicos de los Campus Norte y Campus Oriente.


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO




UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal: Av. Universidad #1001, Col. Chamilpa, C.P. 62209, Cuernavaca, Morelos.

ANTES

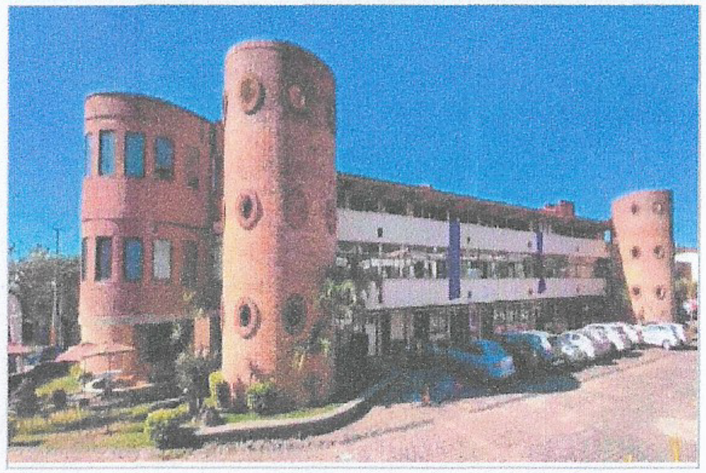

Fachada del Centro de Investigación en Dinámica Celular



Equipamiento del Laboratorio de Química con 1 incubadora con agitación y 1 termoblock (baño seco)



Equipamiento de Laboratorio de Biología con 1 incubadora y 1 lector de microplacas

Observaciones :

Lo presentado en el Reporte Fotográfico del segundo trimestre, corresponde a los espacios a intervenir mediante el fondo.

VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.


2025	FAM	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCUTURAL DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Primer Trimestre 2026
EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES		Fecha de elaboración: 31/03/2026

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DESPUES



Termoblock (baño seco) para el laborartorio de Química en el Centro de Investigación en Dinámica Celular

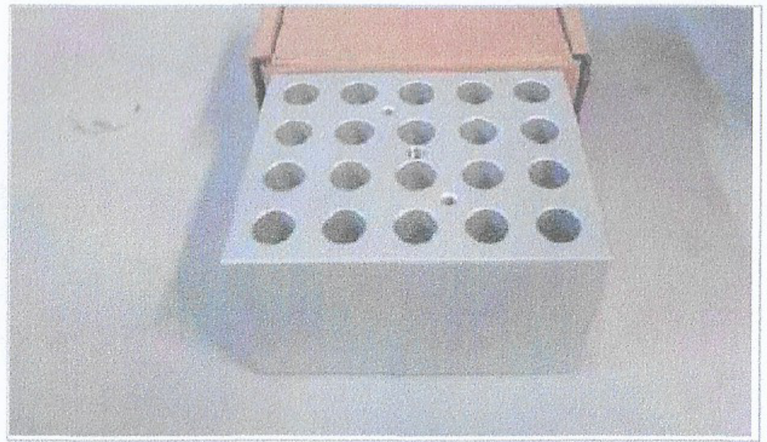

Termoblock (baño seco) para el laborartorio de Química en el Centro de Investigación en Dinámica Celular

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

Dra. Viridiana Aydeé León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Dr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

2025	FAM	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Primer Trimestre 2026
EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGO EL RECURSO	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES		Fecha de elaboración: 31/03/2026

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

0%

PRIORIDAD **4** Nombre de la obra: Adquirir el equipamiento necesario en los espacios académicos de los Campus Norte y Campus Oriente.


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

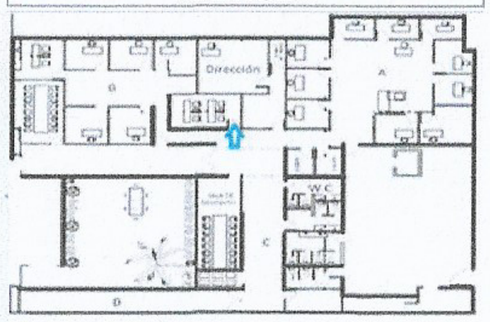

Dirección Postal: Av. Universidad #1001, Col. Chamilpa, C.P. 62209, Cuernavaca, Morelos.

ANTES



Fachada del Centro de Investigación Interdisciplinar para el Desarrollo Universitario




Se equipará el Aula de Usos Múltiples 1 con 1 aire acondicionado

Observaciones :

Lo presentado en el Reporte Fotográfico del segundo trimestre, corresponde a los espacios a intervenir mediante el fondo.


VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.

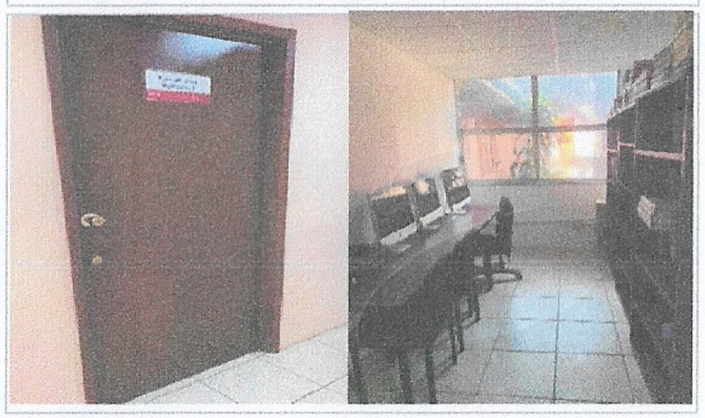

Se equipará el Aula de Usos Múltiples 2 con 2 libreros y 7 mesas de trabajo multiusos



Se equipará Aula de Posgrado 1 (salón de clase) con 1 aire acondicionado

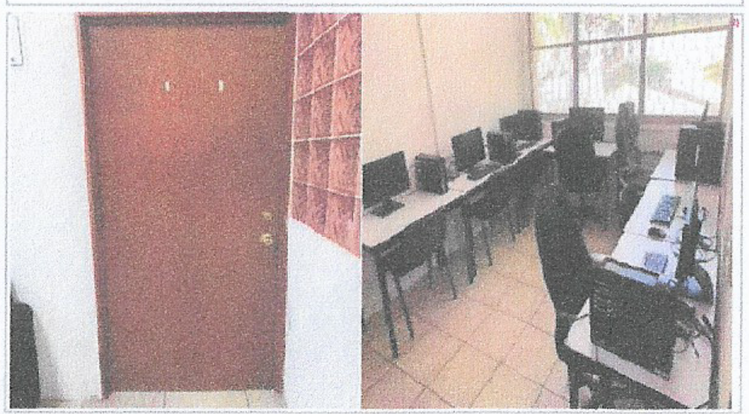

Se equipará Centro de cómputo con 1 proyector, 1 pantalla eléctrica para proyector, 15 mesas de trabajo multiusos, 3 libreros y 1 aire acondicionado

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

Dra. Viridiana Aydeé León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Dr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

2025	FAM	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Primer Trimestre 2026
EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES		Fecha de elaboración: 31/03/2026

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance


0%

PRIORIDAD **4** Nombre de la obra: Adquirir el equipamiento necesario en los espacios académicos de los Campus Norte y Campus Oriente.


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

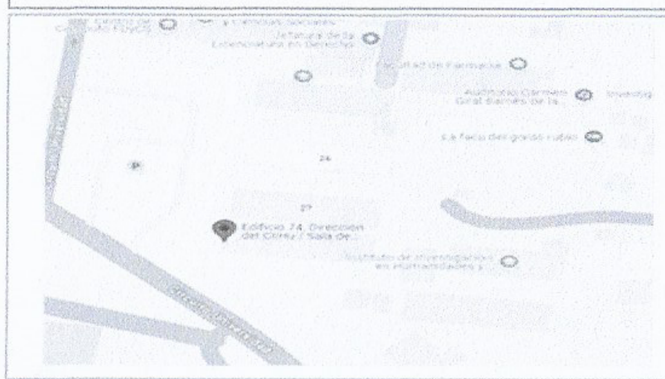

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

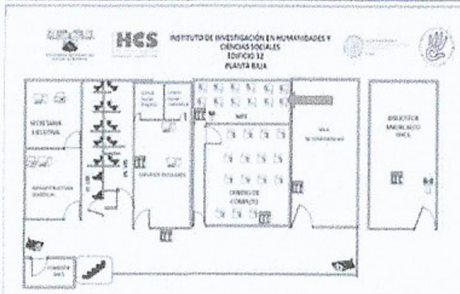

Dirección Postal: Av. Universidad #1001, Col. Chamilpa, C.P. 62209, Cuernavaca, Morelos.

ANTES



Fachada del Centro Interdisciplinario de Investigación en Humanidades



Se equipará Centro de cómputo con 1 aire acondicionado



Se equipará Centro de cómputo de la MPE con 4 Procesadores AMD Ryzen, 4 monitores y 1 mesa para pc

Observaciones :

Lo presentado en el Reporte Fotográfico del segundo trimestre, corresponde a los espacios a intervenir mediante el fondo.

VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

Dra. Viridiana Aydeé León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Dr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

2025	FAM	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Primer Trimestre 2026
EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES		Fecha de elaboración: 31/03/2026

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance


0%

PRIORIDAD **4** Nombre de la obra: Adquirir el equipamiento necesario en los espacios académicos de los Campus Norte y Campus Oriente.


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

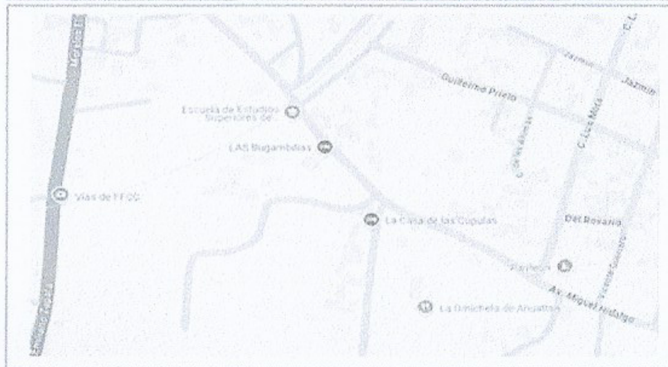


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

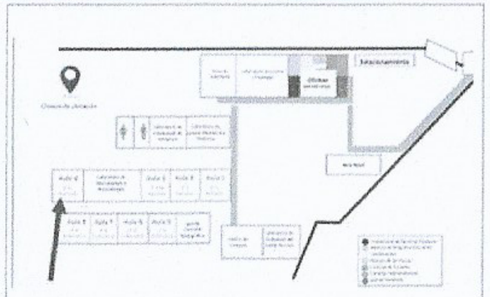


Dirección Postal: Av. Miguel Hidalgo S/N Col. Ahuatlán, Totolapan Morelos, México, 62834.

ANTES

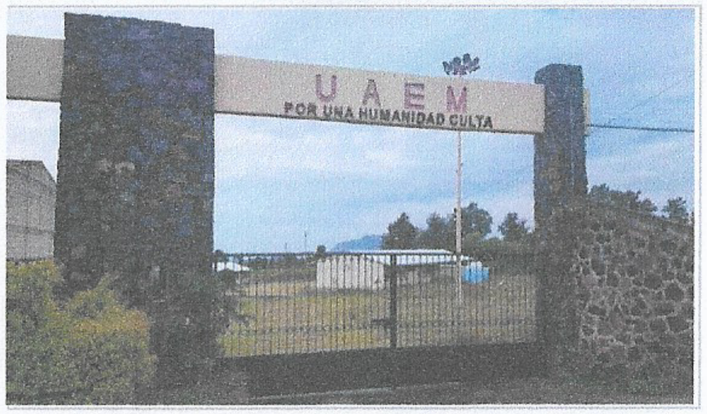

Fachada de la Escuela de Estudios Superiores de Atlatlahucan Subsede Totolapan

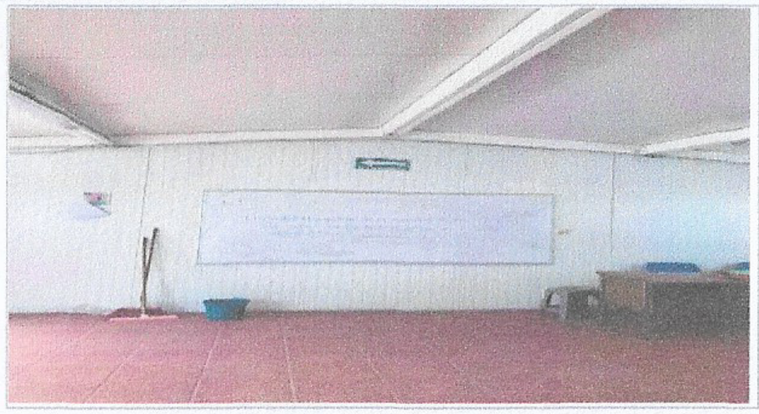


Se equipará Aula 4 con 31 butacas escolares

Observaciones :

Lo presentado en el Reporte Fotográfico del segundo trimestre, corresponde a los espacios a intervenir mediante el fondo.

VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.

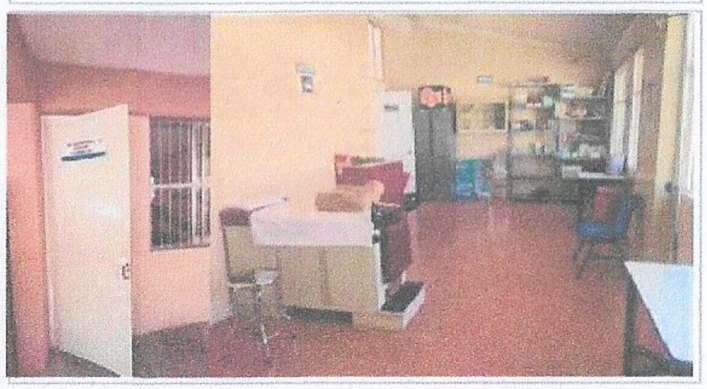

Se equipará Laboratorio de Ginecología con 2 simuladores de parto y 1 Locker de tres puertas de 9 casillas

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

Dra. Viridiana Aydeé León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Dr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

2025	FAM	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Primer Trimestre 2026
EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES		Fecha de elaboración: 31/03/2026

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

0%

PRIORIDAD **4** Nombre de la obra: Adquirir el equipamiento necesario en los espacios académicos de los Campus Norte y Campus Oriente.


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

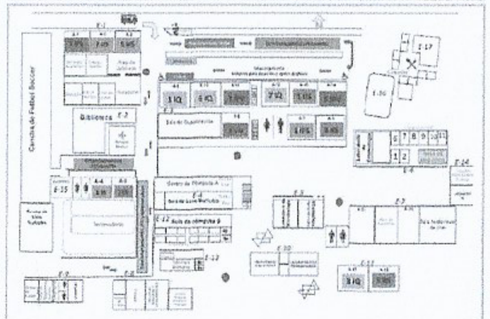

Dirección Postal: Avenida Nicolás S/N, Parque Industrial, en el municipio de Ayala, Morelos.

ANTES



Fachada de la Escuela de Estudios Superiores de Xalostoc




Se equipará Laboratorio de Operaciones unitarias con 1 columna de destilacion


Observaciones :

Lo presentado en el Reporte Fotográfico del segundo trimestre, corresponde a los espacios a intervenir mediante el fondo.

VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.

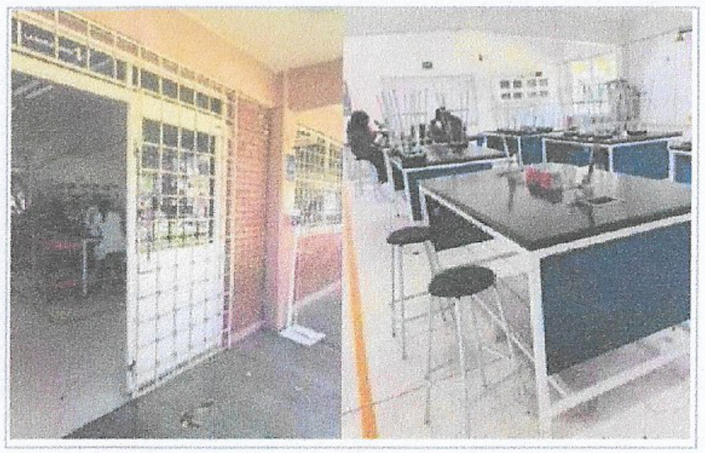

Se equipará Laboratorio de Química Básica con 1 microscopio binocular biológico y 1 microscopio estereoscópico

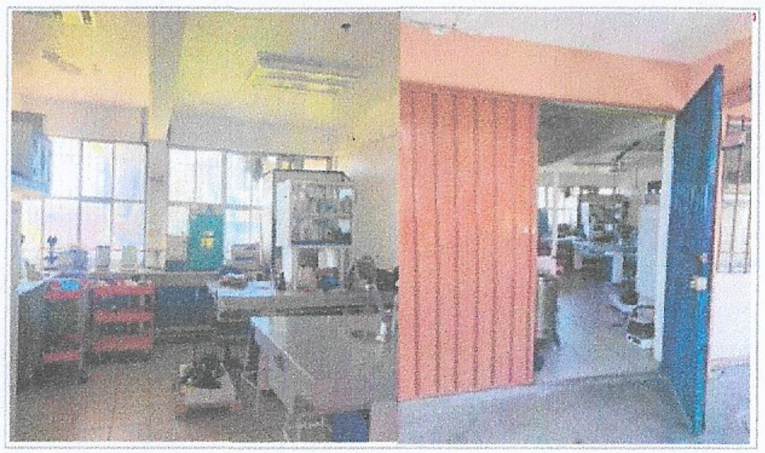

Se equipará Laboratorio de Análisis de Suelos con 2 probadores de suelo

2025
EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCUTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Primer Trimestre 2026


Fecha de elaboración: 31/03/2026

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL


DESPUES



Columna de destilacion para el laboratorio de operaciones unitarias en la Escuela de Estudios Superiores de Xaloastoc

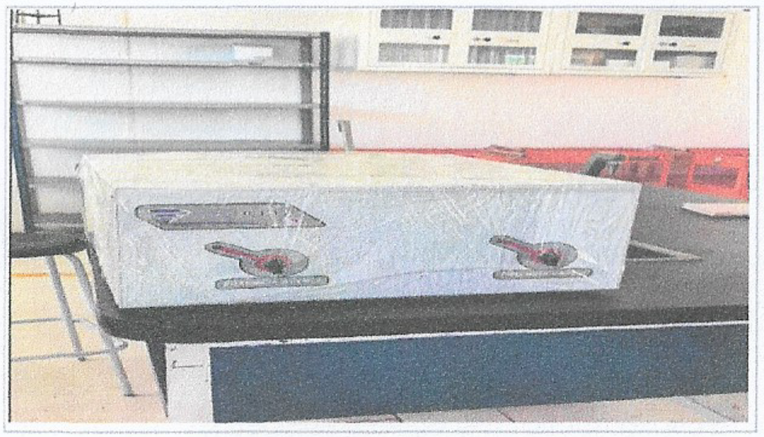

Columna de destilacion para el laboratorio de operaciones unitarias en la Escuela de Estudios Superiores de Xaloastoc

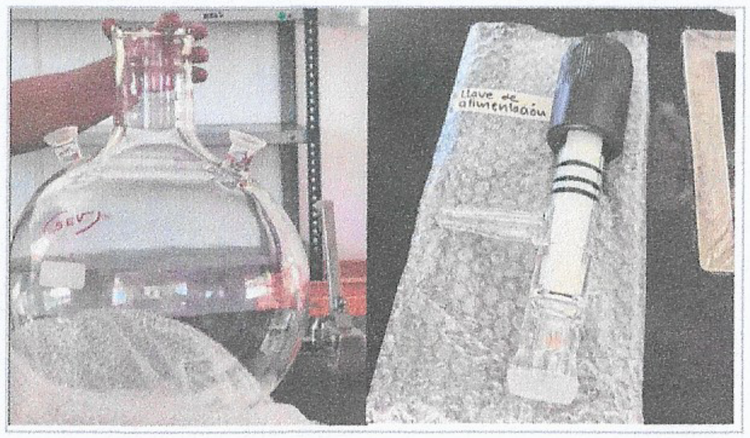

Columna de destilacion para el laboratorio de operaciones unitarias en la Escuela de Estudios Superiores de Xaloastoc

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

Dra. Viridiana Aydeé León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Dr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

2025	FAM	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Primer Trimestre 2026
EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES		Fecha de elaboración: 31/03/2026

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

0%

PRIORIDAD **4** Nombre de la obra: Adquirir el equipamiento necesario en los espacios académicos de los Campus Norte y Campus Oriente.


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

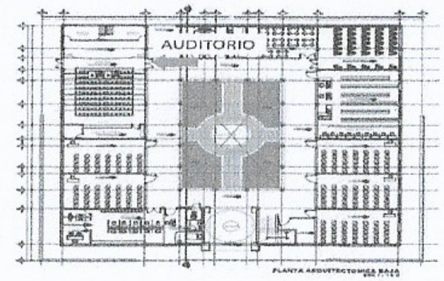

Dirección Postal: Calle Ingeniero Felipe Rivera Crespo s/n Col. Buenavista, Yautepec de Zaragoza, Morelos, C.P.62730.

ANTES



Fachada de la Escuela de Estudios Superiores de Yautepec




Se equipará Auditorio con 90 butacas para auditorio

Observaciones :

Lo presentado en el Reporte Fotográfico del segundo trimestre, corresponde a los espacios a intervenir mediante el fondo.

VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.

DESPUES

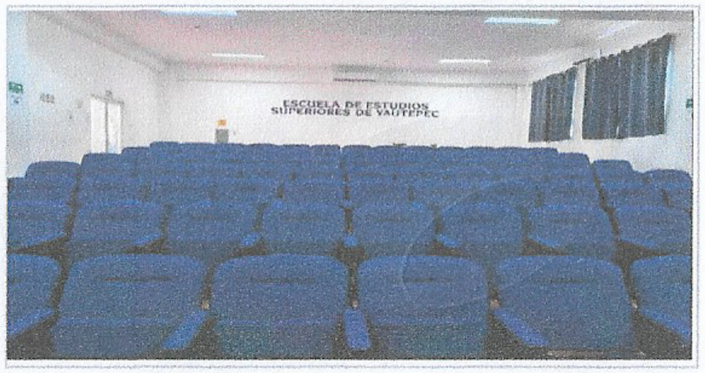

Butacas para el auditorio de la Escuela de Estudios Superiores de Yautepec

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

Dra. Viridiana Aydeé León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Dr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

2025	FAM	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCUTURAL DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Primer Trimestre 2026
EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES		Fecha de elaboración: 31/03/2026

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance


0%

PRIORIDAD **4** Nombre de la obra: Adquirir el equipamiento necesario en los espacios académicos de los Campus Norte y Campus Oriente.


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

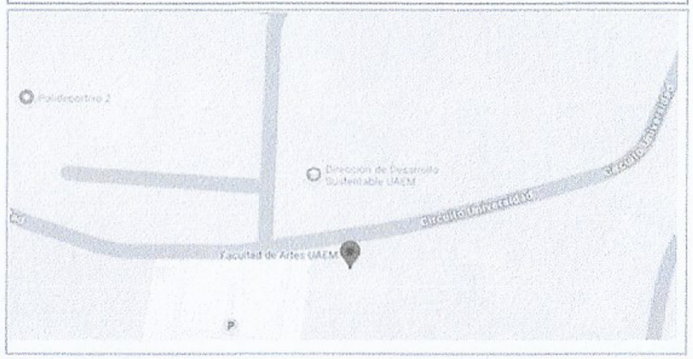


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

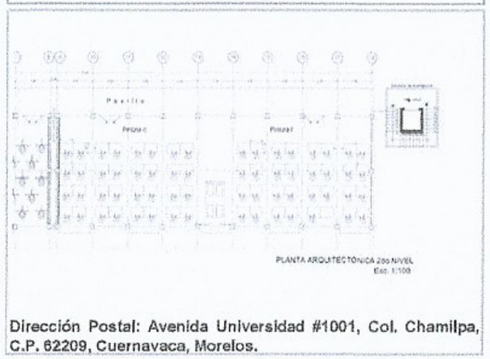

Dirección Postal: Avenida Universidad #1001, Col. Chamilpa, C.P. 62209, Cuernavaca, Morelos.

ANTES

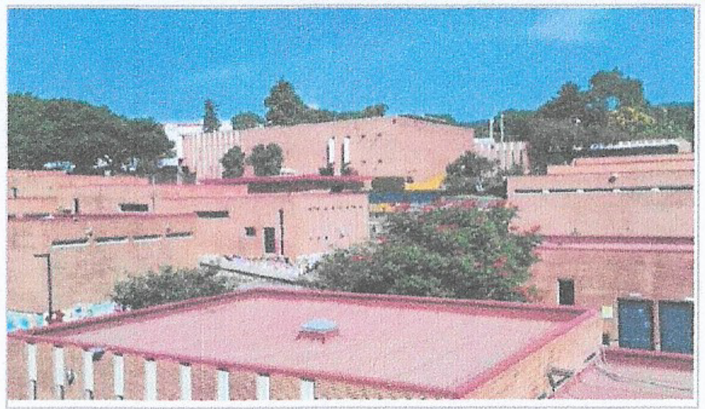

Fachada de la Facultad de Artes



Se equipará Taller de pintura 1 con 18 caballetes de madera y 20 bancos de madera

Observaciones :

Lo presentado en el Reporte Fotográfico del segundo trimestre, corresponde a los espacios a intervenir mediante el fondo.


VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.



Se equipará Taller de pintura 2 con 20 bancos de madera



Se equipará Taller de escultura (modelado) con 4 mesas de trabajo de uso rudo, 21 bancos metálicos con asiento de madera y 1 gabinete de acero inoxidable

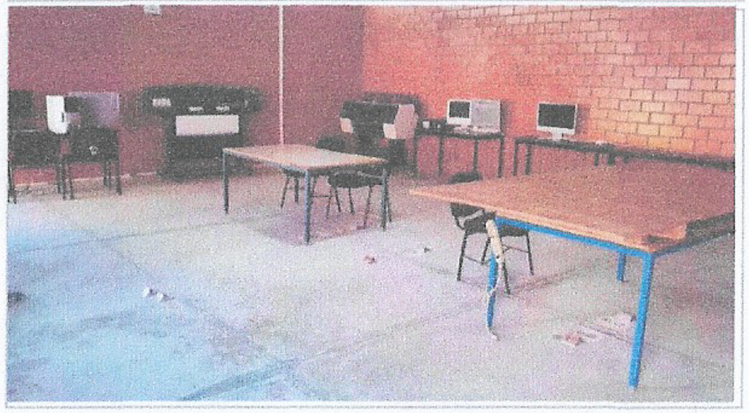

Se equipará Laboratorio de impresión digital con 2 Computadoras IMAC Apple Chip M4 512 gb

2025	FAM	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCUTURAL DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Primer Trimestre 2026
EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES		Fecha de elaboración: 31/03/2026

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DESPUES



Caballetes para el taller de pintura de la Facultad de Artes



Mesas de uso rudo para talleres de la Facultad de Artes

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

Dra. Viridiana Aydeé León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Dr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

2025	FAM	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Primer Trimestre 2026
EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES		Fecha de elaboración: 31/03/2026

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL


UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance


0%

PRIORIDAD **4** Nombre de la obra: Adquirir el equipamiento necesario en los espacios académicos de los Campus Norte y Campus Oriente.


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

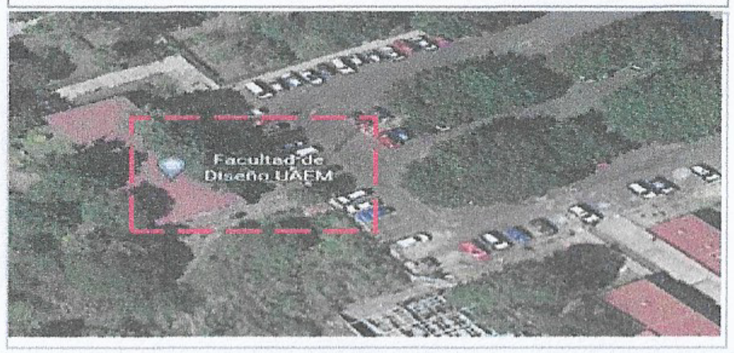

CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

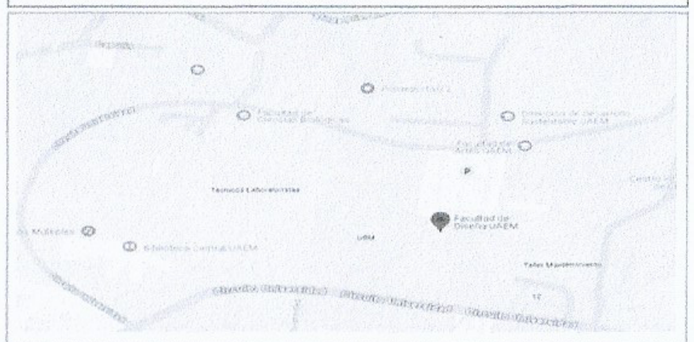


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS




Dirección Postal: Avenida Universidad #1001, Col. Chamilpa, C.P. 62209, Cuernavaca, Morelos.

ANTES

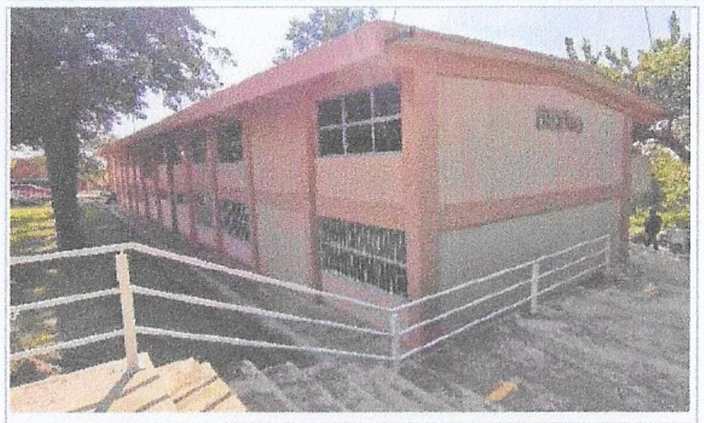

Fachada de la Facultad de Diseño

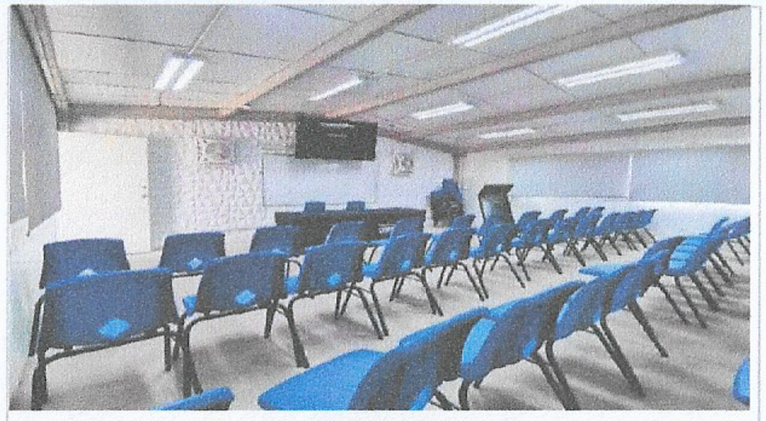

Se equipará Aula de usos múltiples con 1 sistema de sonido empotrable



Se equipará Laboratorio de Fotografía y Video con 1 Sistema de iluminación semifija



Se quipará Laboratorio Industrial con 1 Equipo de termoformado, 1 Router CNC y 3 Equipos de manufactura tridimensional

Observaciones :

Lo presentado en el Reporte Fotográfico del segundo trimestre, corresponde a los espacios a intervenir mediante el fondo.

VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

Dra. Viridiana Aydeé León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Dr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

2025	FAM	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Primer Trimestre 2026
EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES		Fecha de elaboración: 31/03/2026

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance


0%

PRIORIDAD **4** Nombre de la obra: Adquirir el equipamiento necesario en los espacios académicos de los Campus Norte y Campus Oriente.


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

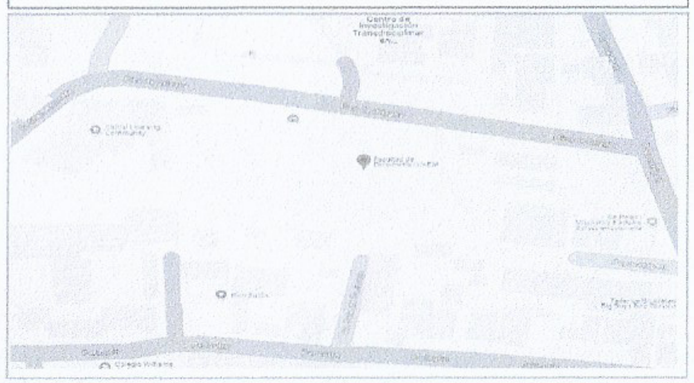


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

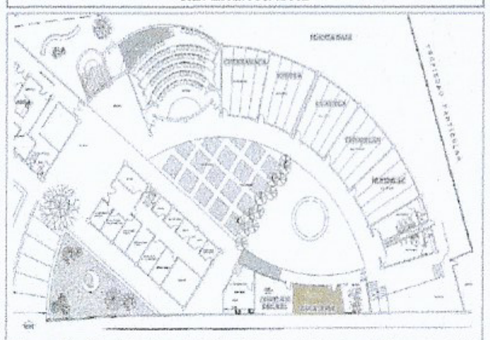


Dirección Postal: Pico de Orizaba #2, Col. Los Volcanes, C.P. 62350, Cuernavaca, Morelos.

ANTES

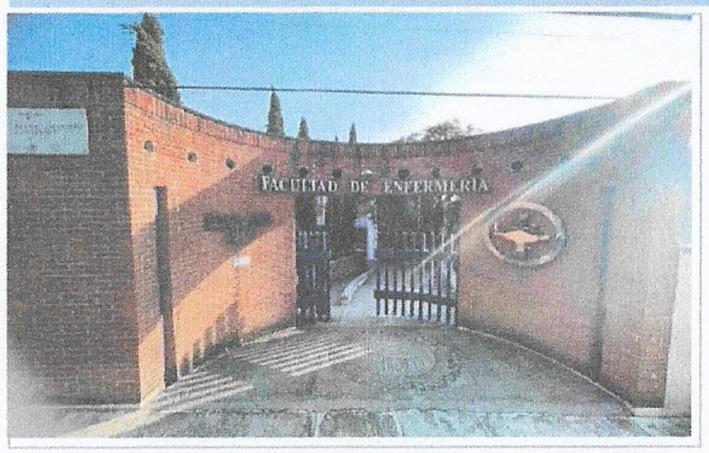

Fachada de la Facultad de Enfermería

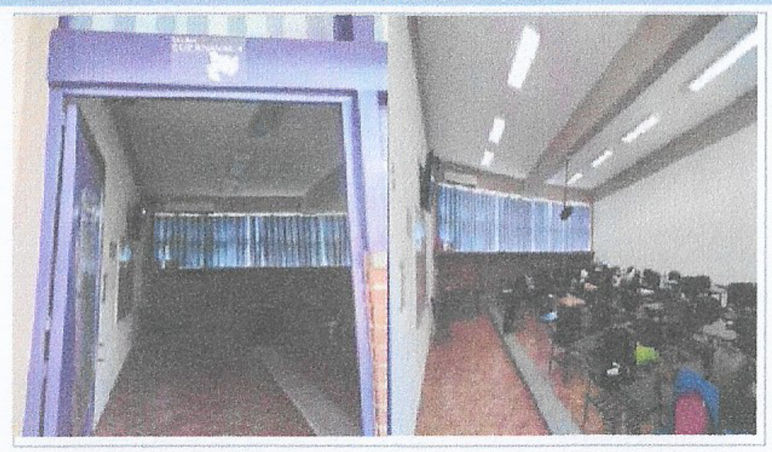


Se equipará Aula Cuernavaca con 1Silla para docente, 1 pantalla para proyector, 1 proyector y 1 escritorio

Observaciones :

Lo presentado en el Reporte Fotográfico del segundo trimestre, corresponde a los espacios a intervenir mediante el fondo.

VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.

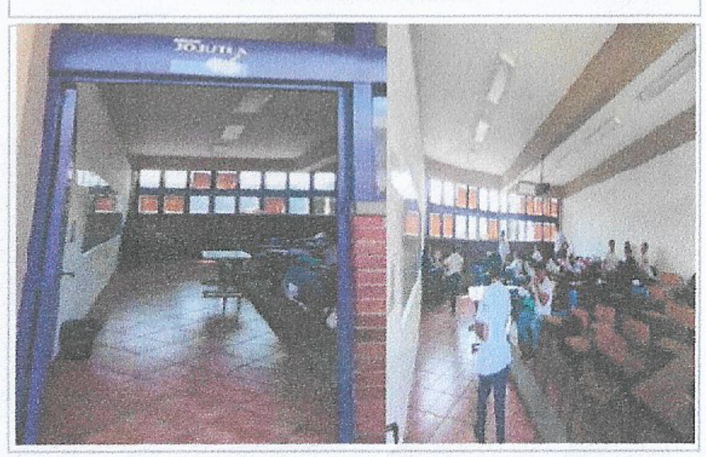

Se equipará Aula Jojutla con 1 silla para docente, 1 pantalla para proyector, 1 proyector y 1 escritorio




Se equipará Aula Cuautla con 1 silla para docente, 1 pantalla para proyector, 1 proyector y 1 escritorio




Se equipará Aula Tepoztlán con 1 silla para docente, 1 pantalla para proyector y 1 escritorio

2025	FAM	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCUTURAL DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Primer Trimestre 2026
EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES		Fecha de elaboración: 31/03/2026

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

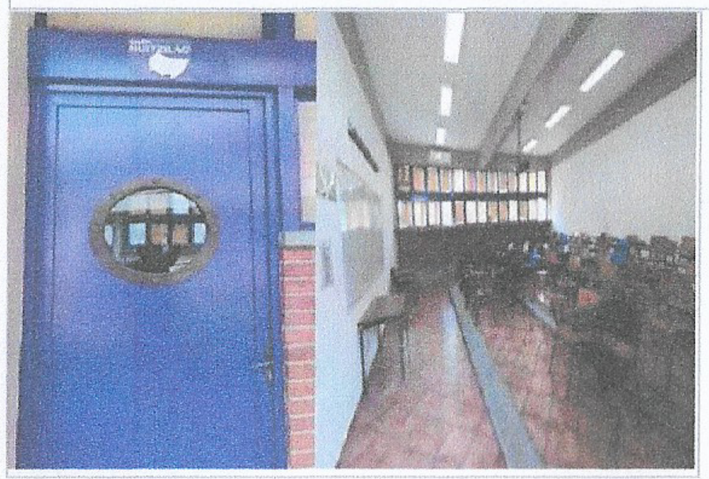


Se equipará Aula Huitzilac con 1 silla para docente, 1 pantalla para proyector y 1 escritorio

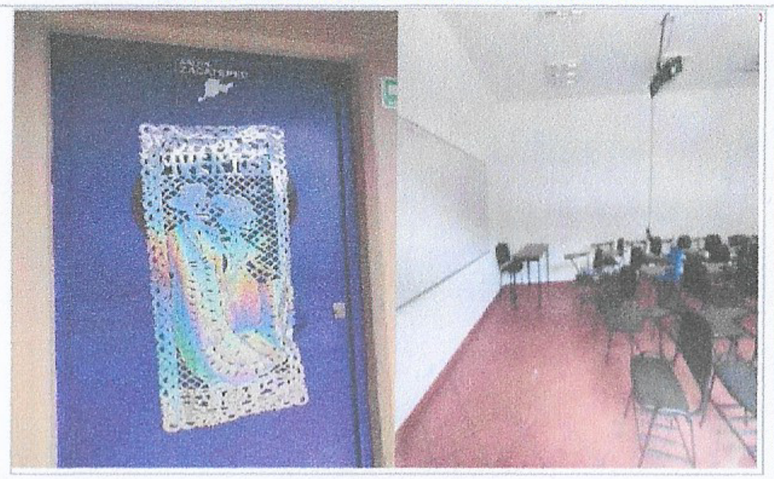


Se equipará Aula Zacatepec con 1 silla para docente, 1 pantalla para proyector y 1 escritorio




Se equipará Aula Coatlán del Río con 1 silla para docente, 1 pantalla para proyector y 1 escritorio

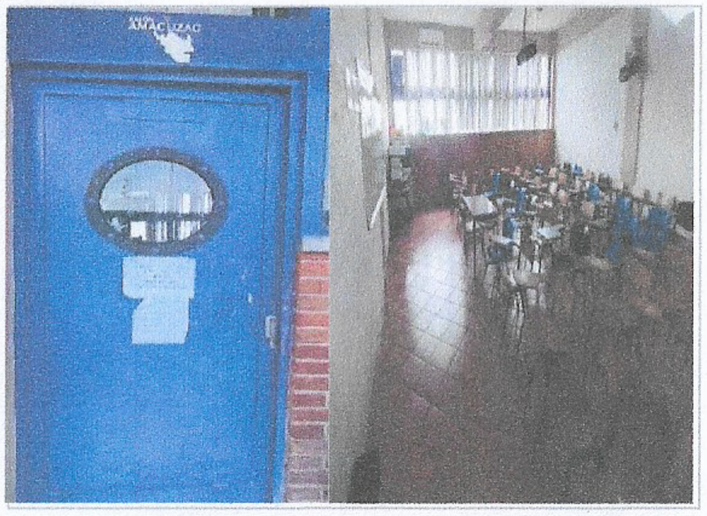

Se equipará Aula Amacuzac con1 silla para docente, 1 pantalla para proyector y 1 escritorio

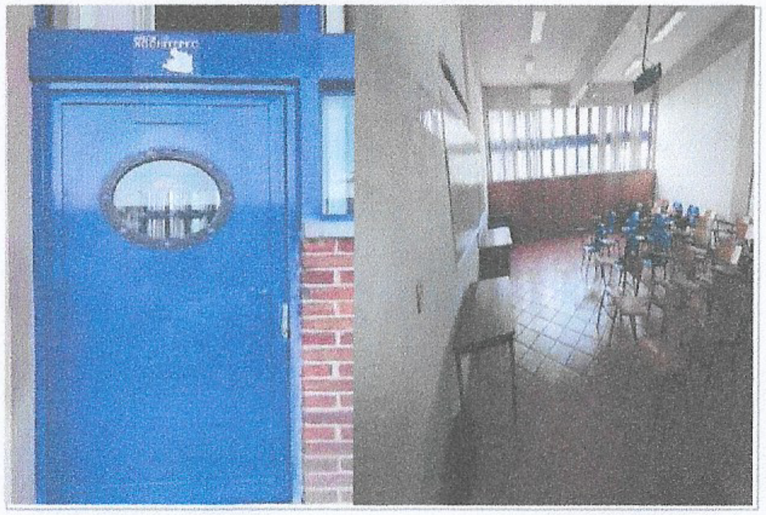

Se equipará Aula Xochitepec con 1 silla para docente, 1 pantalla para proyector y 1 escritorio

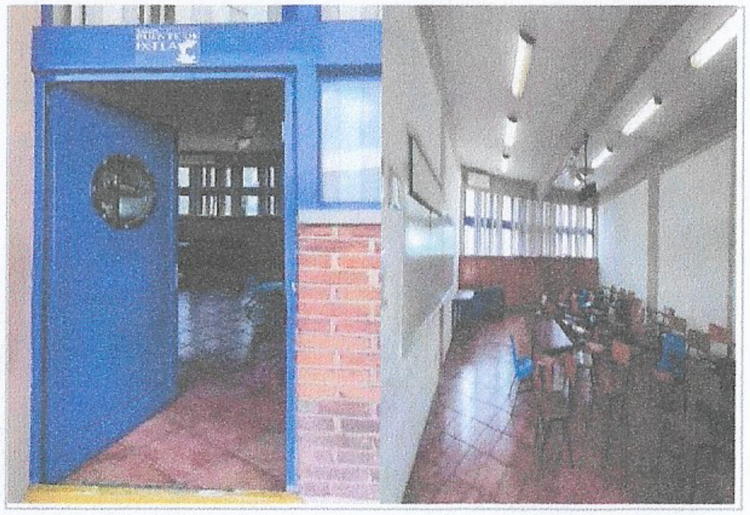


Se equipará Aula Puente de Ixtla con 1 silla para docente,1 pantalla para proyector y 1 escritorio



Se equipará Aula de Miacatlán con 1 silla para docente y 1 escritorio



Se equipará Aula Yecapixtla con 1 escritorio y 1 silla para docente

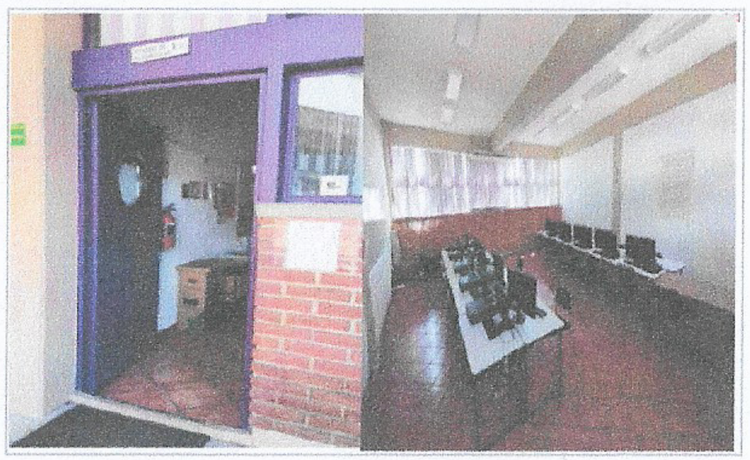

Se equipará Centro de autoacceso 1 con 1 proyector

2025
EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCUTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA


Primer Trimestre 2026

Fecha de elaboración: 31/03/2026

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL



Se equipará Centro de auto acceso 2 con 1 proyector

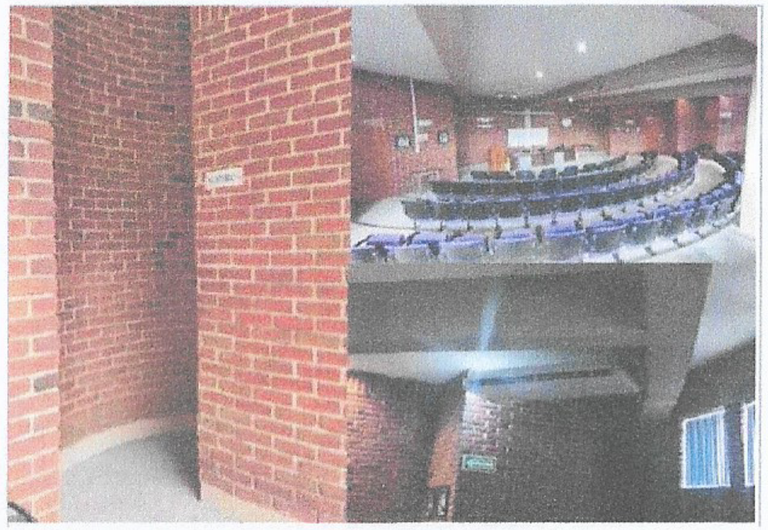


Se equipará Auditorio con 1 aire acondicionado

DESPUES



Proyectores para el aula Jojutla, Cuautla y Huitzilac de la Facultad de Enfermeria

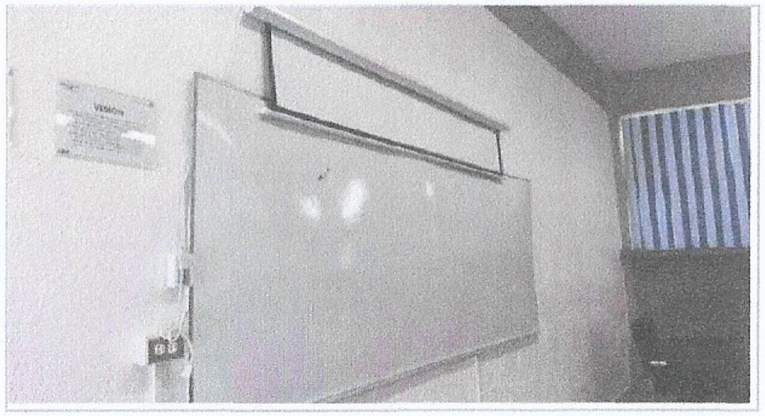

Pantallas electricas para la Facultad de Enfermeria

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

Dra. Viridiana Aydeé León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Dr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

2025	FAM	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Primer Trimestre 2026
EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES		Fecha de elaboración: 31/03/2026

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance


0%

PRIORIDAD **4** Nombre de la obra: Adquirir el equipamiento necesario en los espacios académicos de los Campus Norte y Campus Oriente.

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal: Av. Universidad #1001, Colonia Chamilpa, Cuernavaca, Morelos, CP, 62209.

ANTES



Fachada de la Facultad de Farmacia



Se equipará Laboratorio Farmacia Comunitaria con 2 escritorios recepción y 1 góndola a pared de 60 x 40 x 220 cm, 1 mueble cajonera para medicamentos, 2 anaqueles Farmacia, 3 anaqueles con medidas generales, 3 escritorios ejecutivos, 1 mueble cajonero para medicamentos, 1 estructura en aluminio anodizado, 2 lockers metálico en tándem, 1 mesa con doble repisa, 2 balanzas de precisión, 1 archivero Tam-Mex y 1 minisplit

Observaciones :

Lo presentado en el Reporte Fotográfico del segundo trimestre, corresponde a los espacios a intervenir mediante el fondo.

VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.



Se equipará Laboratorio de Docencia con 3 centrifugas clinicas para 6 tubos y 2 medidor de pH y mV de mesa



Se equipará Laboratorio de Simulación con 1 Espectrofotómetro UV Vis

2025
EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES


DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCUTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Primer Trimestre 2026

Fecha de elaboración: 31/03/2026

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DESPUES

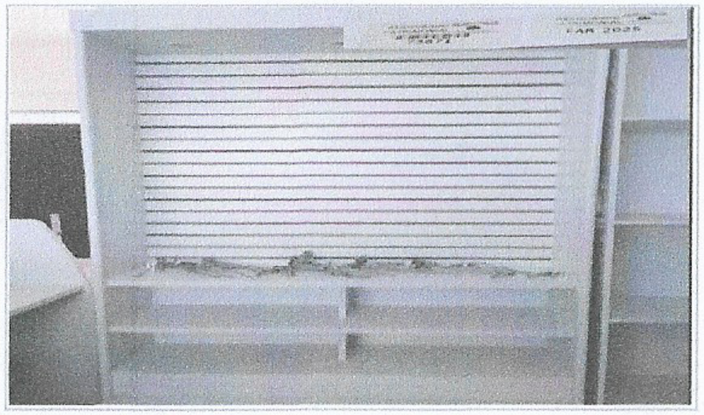

Mueble Exhibidor de 2 entrepaños para el laboratorio de farmacia comunitaria en la Facultad de Farmacia



Mueble cajonera para medicamentos, con 3 cajones para el laboratorio de farmacia comunitaria en la Facultad de Farmacia



Anaquel en metal 5 entrepaños para el laboratorio de farmacia comunitaria en la Facultad de Farmacia

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

Dra. Viridiana Aydee León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Dr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

2025	FAM	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Primer Trimestre 2026
EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES		Fecha de elaboración: 31/03/2026

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS


Porcentaje de avance

0%


PRIORIDAD **4**

Nombre de la obra: Adquirir el equipamiento necesario en los espacios académicos de los Campus Norte y Campus Oriente.


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

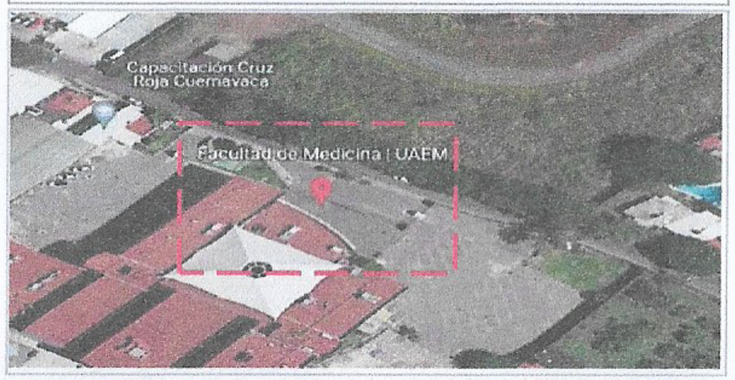

CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

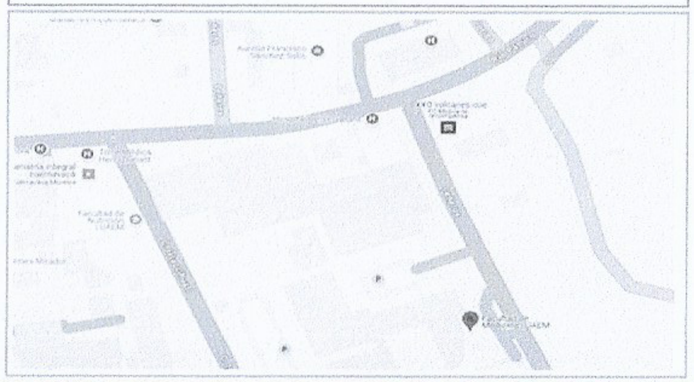

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

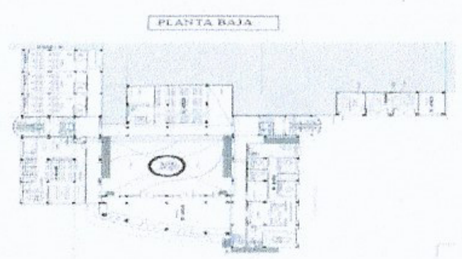

Dirección Postal: Calle Iztaccíhuatl #100, Col. Volcanes, C.P. 62350, Cuernavaca, Morelos.


ANTES



Fachada de la Facultad de Medicina



Se equipará Laboratorio de Fisiología y Farmacología con 1 Espectrofotómetro y 1 mesa de exploración con pierneras

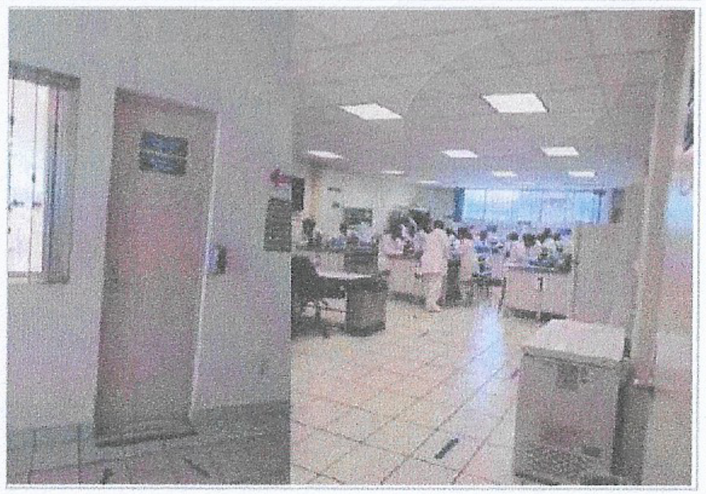

Se equipará Laboratorio de Histología y Embriología con 5 microscopios binoculares



Se equipará Laboratorio de habilidades con 3 Maniquíes paquete CPR y 2 maniquíes paquete CPR Little junior.

Observaciones :


Lo presentado en el Reporte Fotográfico del segundo trimestre, corresponde a los espacios a intervenir mediante el fondo.

VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.


2025	FAM	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCUTURAL DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Primer Trimestre 2026
EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES		Fecha de elaboración: 31/03/2026

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ANTES

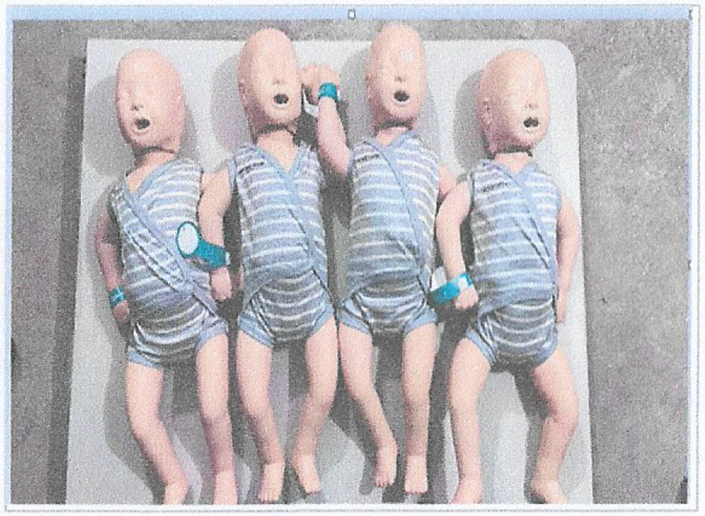

Maniquíes CPR para el laboratorio de habilidades en la Facultad de Medicina

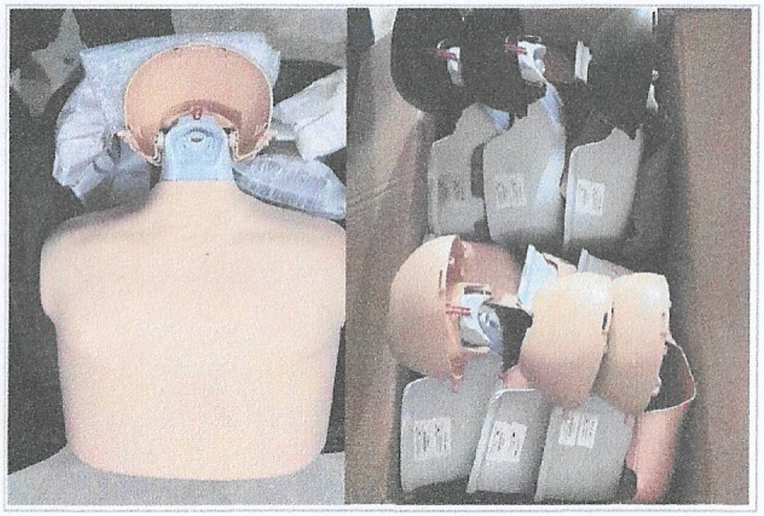

Maniquíes paquete CPR Little Junior laboratorio de habilidades en la Facultad de Medicina

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

Dra. Viridiana Aydeé León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Dr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

2025	FAM	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCUTURAL DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Primer Trimestre 2026
EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES		Fecha de elaboración: 31/03/2026

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance


0%

PRIORIDAD **4** Nombre de la obra: Adquirir el equipamiento necesario en los espacios académicos de los Campus Norte y Campus Oriente.


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS




Dirección Postal: Av. Universidad #1001, Col. Chamilpa, C.P. 62209, Cuernavaca, Morelos.

ANTES



Fachada de la Facultad de Ciencias Agropecuarias

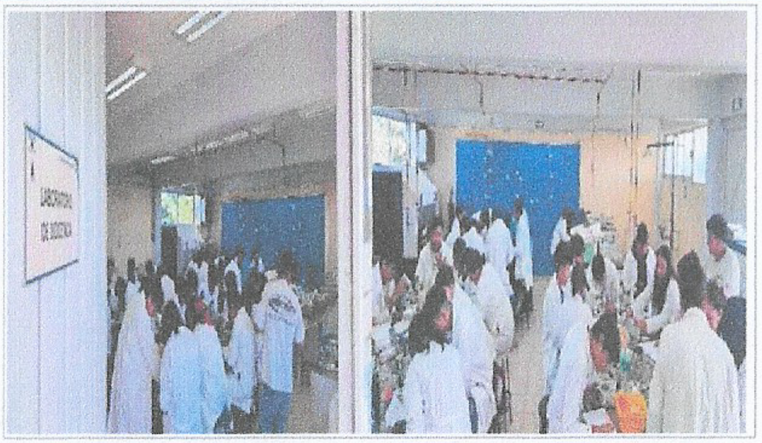

Se equipará Laboratorio de Docencia Edificio 71 planta primer nivel con 5 Microscopios y 2 Anaqueles Metálicos


Observaciones :

Lo presentado en el Reporte Fotográfico del segundo trimestre, corresponde a los espacios a intervenir mediante el fondo.


VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.



Se equipará Laboratorio de alimentos - Edificio 71 planta primer nivel con 1 Licuadora industrial, 1 empacadora al alto vacio, 1 horno para pan 4 charolas tipo gaveta, 1 congelador horizontal, 2 mesas de trabajo

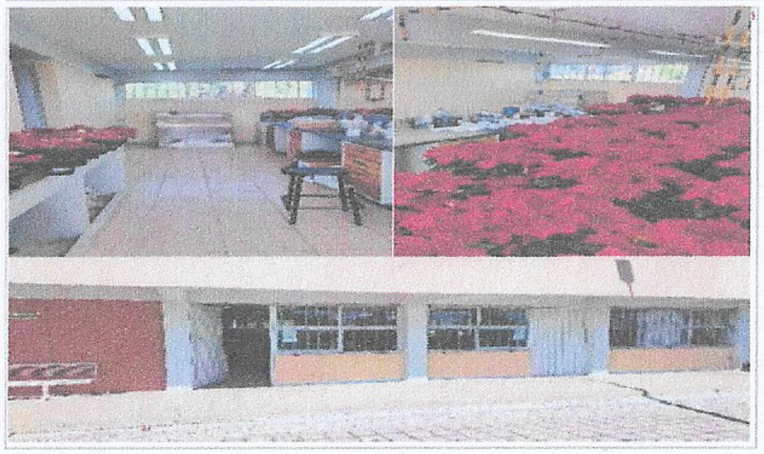

Se equipará Laboratorio 2 Producción Agrícola - Edificio 71 planta baja con 20 Bancos para laboratorio y 2 Anaqueles metálicos

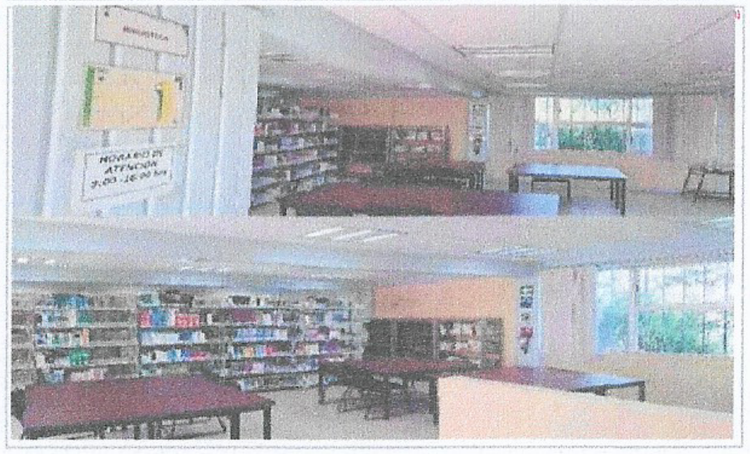

Se equipará Biblioteca - Edificio 72 planta baja con 1 Aire acondicionado

2025	FAM	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCUTURAL DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Primer Trimestre 2026
EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES		Fecha de elaboración: 31/03/2026

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DESPUES



Aire acondicionado para la biblioteca de la Facultad de Ciencias Agropecuarias

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

Dra. Viridiana Aydeé León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Dr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

2025	FAM	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Primer Trimestre 2026
EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES		Fecha de elaboración: 31/03/2026

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance


0%

PRIORIDAD **4** Nombre de la obra: Adquirir el equipamiento necesario en los espacios académicos de los Campus Norte y Campus Oriente.


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

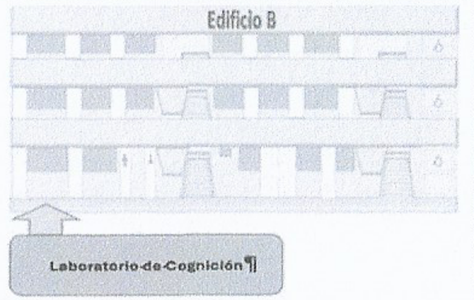

Dirección Postal: Av. Universidad #1001, Col. Chamilpa, C.P. 62209, Cuernavaca, Morelos.

ANTES



Fachada de la Facultad de Ciencias del Deporte



Se equipará Laboratorio de Evaluación del Rendimiento con 1 tsensor, 3 plataformas de contacto DIN-A2, 2 sensores de fuerza y 1 Wimu



Se equipará Laboratorio de Cognición y Psicología Deportiva con 2 Meta Quest 3 512gb 4k Lente de Realidad Virtual



Se equipará Centro de Cómputo con 11 monitores, 11 CPU y 1 proyector

Observaciones :

Lo presentado en el Reporte Fotográfico del segundo trimestre, corresponde a los espacios a intervenir mediante el fondo.

VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.


2025	FAM	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCUTURAL DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Primer Trimestre 2026
EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES		Fecha de elaboración: 31/03/2026

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL


DESPUES




Kit de sensor de fuerza para el laboratorio de evaluación del rendimiento para la Facultad de Ciencias del Deporte

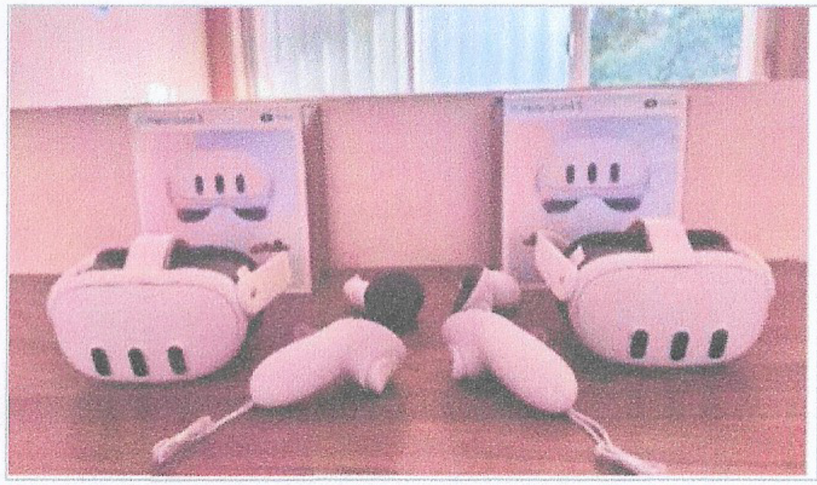

Lentes de realidad virtual para el laboratorio de cognición y psicología deportiva para la Facultad de Ciencias del Deporte

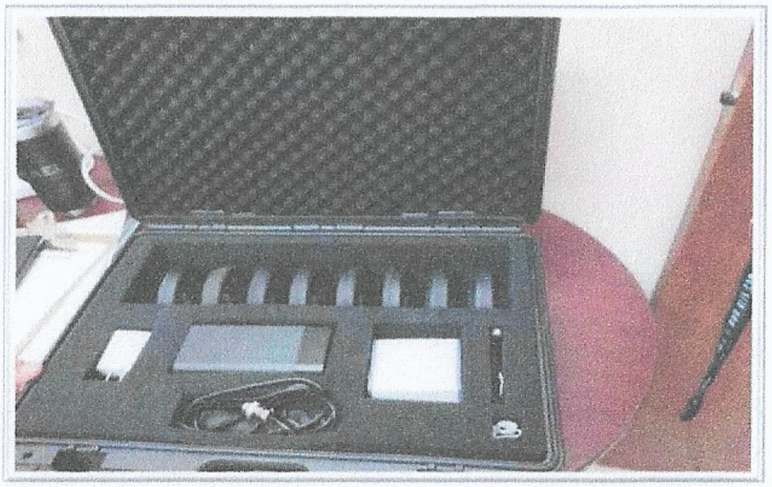

Tsensor sistema integral para el registro y la medición de variables del desempeño humano.para el laboratorio de evaluación del rendimiento para la Facultad de Ciencias del Deporte

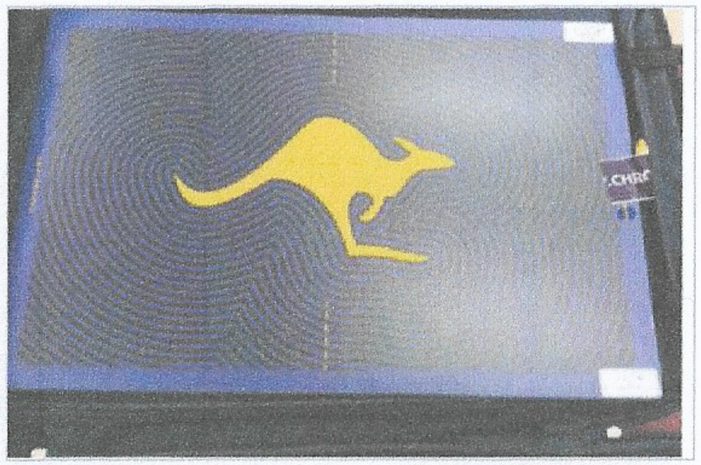

Plataforma de contacto DIN-A2 para el laboratorio de evaluación del rendimiento para la Facultad de Ciencias del Deporte

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

Dra. Viridiana Aydeé León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Dr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

2025	FAM	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCUTURAL DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Primer Trimestre 2026
EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES		Fecha de elaboración: 31/03/2026

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance


100%

PRIORIDAD **5** Nombre de la obra: Construcción de la planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Escuela de Estudios Superiores del Jicarero


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

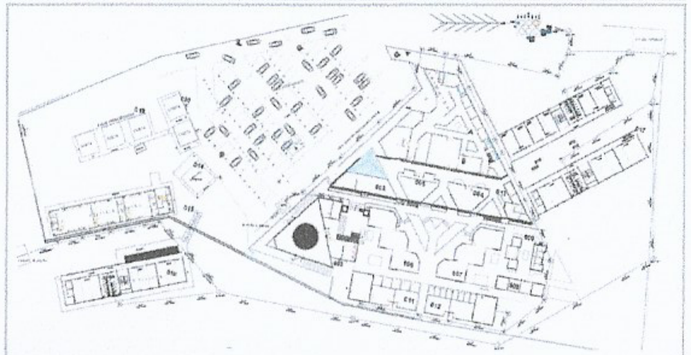

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

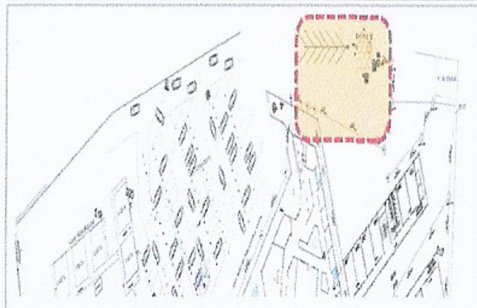

Dirección Postal: Carretera Galeana-Tequesquitengo S/N Com. El Jicarero C.P. 62909 en el Municipio de Jojutla, en el Estado de Morelos.

ANTES



Fachada de la Escuela de Estudios Superiores del Jicarero




Vista del sitio en donde se relizaran los trabajos de: Preliminares (Delimitar, Nivelacion, despalmes de terreno, excavaciones, compataciones entre otras), en la Escuela de Estudios Superiores del Jicarero.


Observaciones :

Lo presentado en el Reporte Fotográfico del tercer trimestre, corresponde a los espacios a intervenir mediante el fondo.

VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.

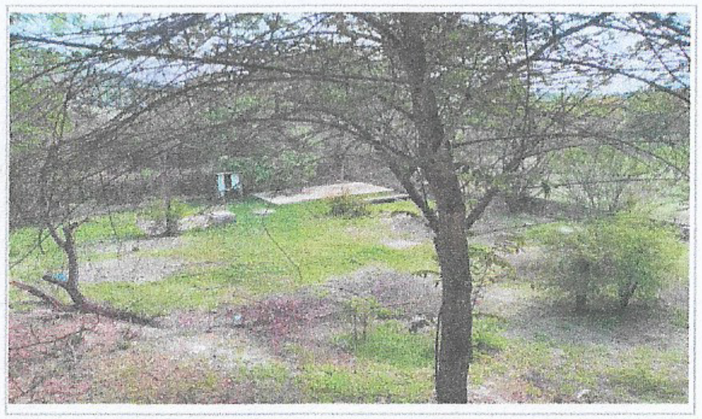

Vista del sitio en donde se relizaran los trabajos de: Suministro y colocacion de Planta de tratamiento y Colocacion de rellenos,

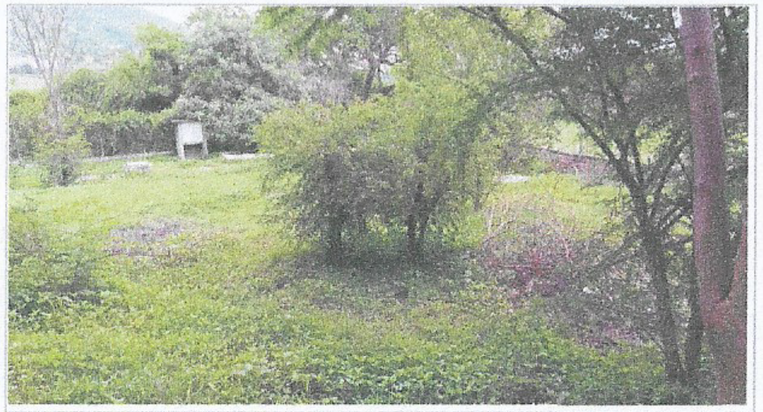

Vista del sitio en donde se relizaran los trabajos de: Construccion de cuarto de maquina, Asi, como la Construccion de Campo de Oxidacion, en la Escuela de Estudios Superiores del Jicarero.



Vista del sitio en donde se relizaran los trabajos de: Limpiezas en areas de trabajo, en la Escuela de Estudios Superiores del Jicarero.

2025	FAM	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCUTURAL DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Primer Trimestre 2026
EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES		Fecha de elaboración: 31/03/2026

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DESPUES



Imagen 1 del proyecto: "Construcción de la planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Escuela de Estudios Superiores del Jicarero".



Imagen 2 del proyecto: "Construcción de la planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Escuela de Estudios Superiores del Jicarero".

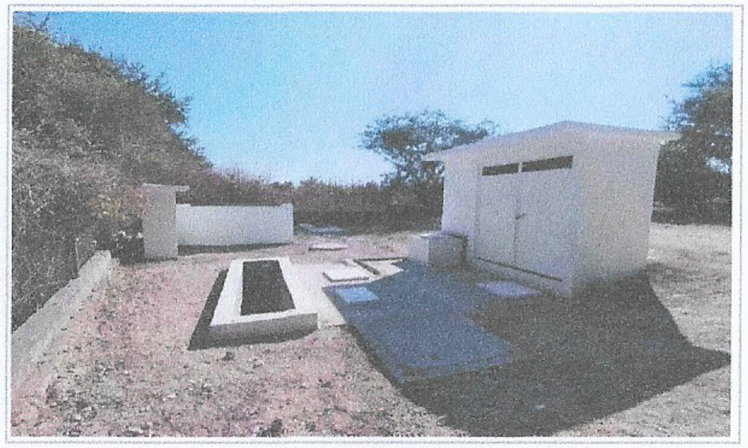


Imagen 3 del proyecto: "Construcción de la planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Escuela de Estudios Superiores del Jicarero".

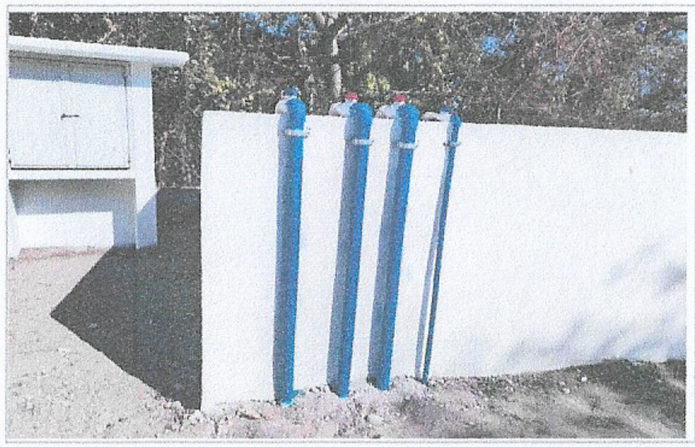


Imagen 4 del proyecto: "Construcción de la planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Escuela de Estudios Superiores del Jicarero".



Imagen 5 del proyecto: "Construcción de la planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Escuela de Estudios Superiores del Jicarero".



Imagen 6 del proyecto: "Construcción de la planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Escuela de Estudios Superiores del Jicarero".

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

Dra. Viridiana Aydeé León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Dr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable
